



INFORME DE MONITOREO FÍSICO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


Enero – Abril 2022





Proyecto	Mejoramiento Construcción de Palacios de Justicia		
OEE	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		
Código SNIP N°	155		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	86.019.435	GS. 828.134.031.756
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
102.604.163.393	725.529.868.363	12,39 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
11/03/1996	11/03/2016	30/11/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional			
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
10 %	100 %		
PGN Vigente en Gs	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022	Porcentaje Ejecutado	
79.749.173.409	447.916.665	1,62 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

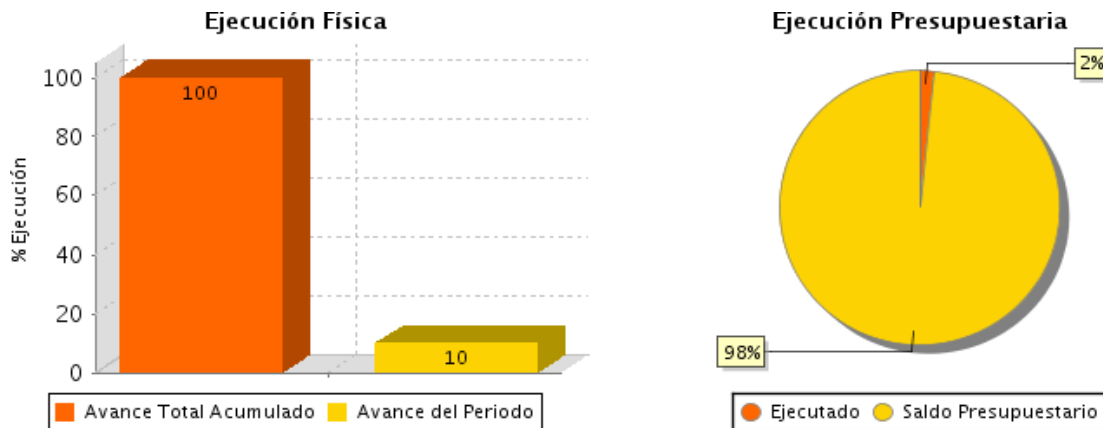

SITUACIÓN ACTUAL

En cuanto a la construcción del Palacio de Justicia de Saltos del Guairá se cuenta con los siguientes Certificados de Avance de Obra: el N°13(enero/2022) con 1,90% de avance; el N°14(febrero/2022) con 3,89% de avance, el N°15 (marzo/2022) con 3,41 % de avance; la empresa contratista de estas obras es Jiménez Gaona y Lima, los documentos se encuentra pendiente de pago por falta de disponibilidad de recursos financieros.
