



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Enero - Abril 2023


 Sistema Nacional
de Inversión
Pública





Proyecto		Mejoramiento Construcción de Palacios de Justicia			
OEE		CORTE SUPREMA DE JUSTICIA			
Código SNIP N°		155			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	122.000.000	GS.	828.134.031.756
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
650.248.439.121		177.885.592.635		78,52 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
11/03/1996		11/03/2016		30/11/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
10 %			58 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
60.403.173.409		3.300.000		0,01 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

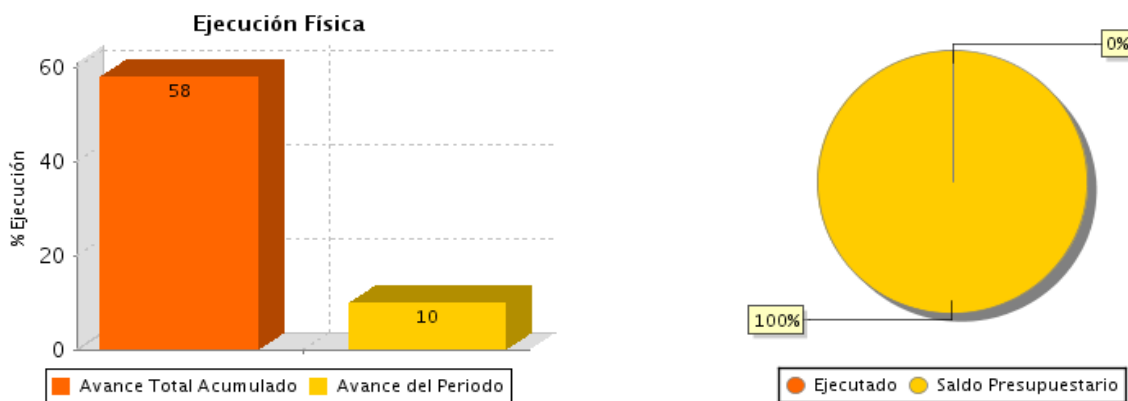

SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó durante el primer cuatrimestre que las obras en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este se encuentran finalizadas y actualmente está en etapa de mantenimiento.

El Palacio de Justicia de Salto del Guairá tiene un avance de obras según la certificación del 87,89% en todos los rubros de las obras e instalaciones y se prevee su culminación en el mes de junio del 2023.

En los Juzgados de Primera Instancia de Capiatá se realizan trabajos preliminares, como limpieza de terrenos, movimientos de suelos, tendido de media tensión eléctrica, fundaciones profundas e inicio de las estructuras
