



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


Mayo - Agosto 2023

 Sistema Nacional
de Inversión
Pública



Proyecto	Mejoramiento Construcción de Palacios de Justicia			
OEE	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA			
Código SNIP N°	155			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	122.000.000	GS.	828.134.031.756
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
672.906.656.577	155.227.375.179		81,26 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
11/03/1996	11/03/2016		30/11/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
20 %			68 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
60.403.173.409	22.661.517.456		37,52 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

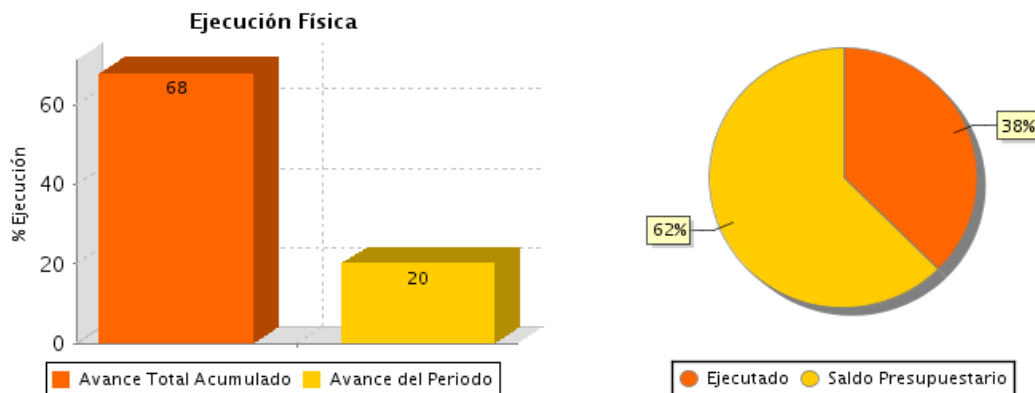

SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó respecto al Palacio de Justicia de Ciudad del Este que el mantenimiento sigue con la extensión del periodo hasta diciembre del presente año; en el Palacio de Justicia de Saltos del Guairá las obras civiles e instalaciones se encuentran concluidas y certificadas en un 100%. En el juzgado de 1º instancia de Capiatá la fiscalización de obras se encuentra en periodo de garantía y en ejecución las obras civiles. En líneas generales los pagos siguen con retrasos.
