



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Setiembre - Diciembre 2022


 Sistema Nacional
de Inversión
Pública





Proyecto	Mejoramiento Construcción de Palacios de Justicia			
OEE	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA			
Código SNIP N°	155			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	122.000.000	GS.	828.134.031.756
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
650.245.139.121	177.888.892.635		78,52 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
11/03/1996	11/03/2016		30/11/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
10 %			100 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
80.403.173.409	59.350.837.792		73,82 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

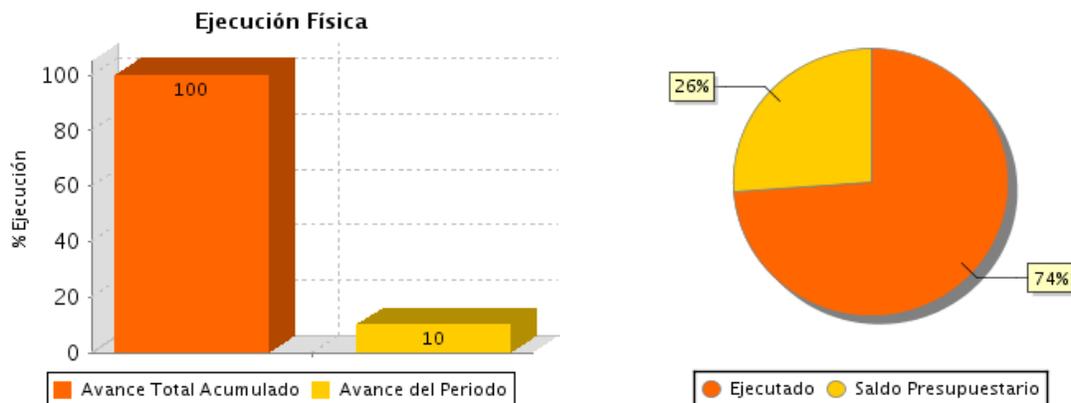

SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que durante el tercer cuatrimestre se encuentran en plena ejecución la obra edilicia del Palacio de Justicia de Salto del Guairá, así como la supervisión y seguimiento de los trabajos.

En lo que respecta al conjunto Edificio Palacio de Justicia de Ciudad del Este, se encuentra en etapa de Cancelación de Intereses y Reajustes de Certificados de Obra, que se encontraban pendientes de pago. Se realizan algunos trabajos de mantenimiento y reparación.
