



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Enero - Abril 2023


 Sistema Nacional
de Inversión
Pública





Proyecto	SP Instalación de Medidores de Energía Eléctrica en Paraguay			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	143			
Financiamiento	LAIF			
Costo del Proyecto	USD	28.436.981	GS.	116.291.298.922
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
99.293.849.284	16.997.449.638		85,38 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/07/2014	11/12/2020		31/12/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
1.122.000.000	0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

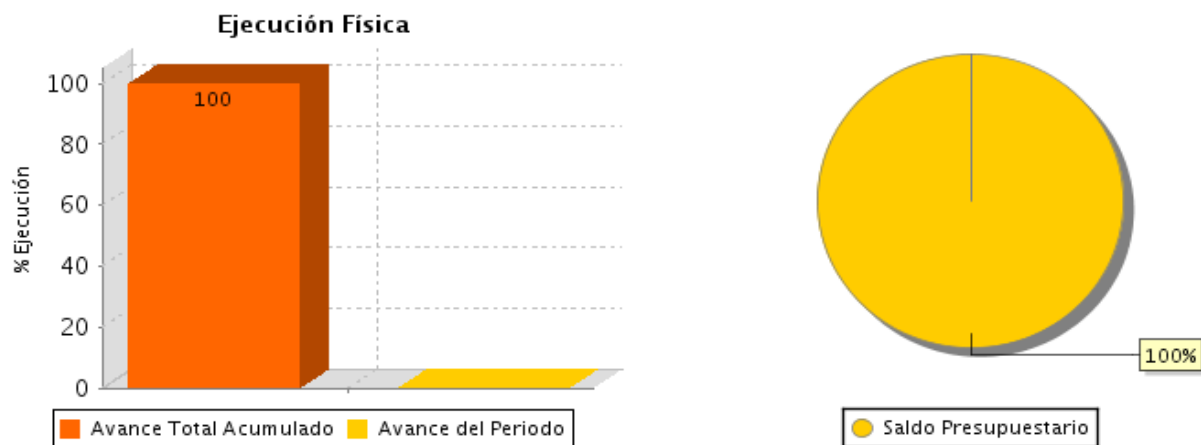



SITUACIÓN ACTUAL

Conforme al cronograma previsto por las unidades administradoras de los contratos, las obras físicas han sido concluidas en su totalidad, no obstante, se encuentra pendiente la cancelación de estados de cuentas finales y el cierre del proyecto.



Proyecto	Construcción de la Línea de Transmisión de 500 kV Yacyreta - Villa Hayes		
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD		
Código SNIP N°	159		
Financiamiento	BEI, BID, CAF		
Costo del Proyecto	USD	227.285.710	GS. 1.218.093.811.723
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
1.192.672.677.348	25.421.134.375		97,91 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/07/2014	31/07/2021		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Asunción, Central, Presidente Hayes		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %		100,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado
34.099.373.645	4.446.380.498		13,04 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

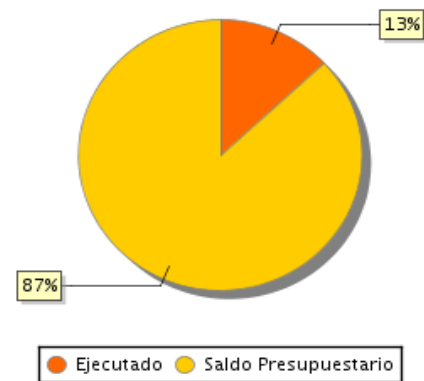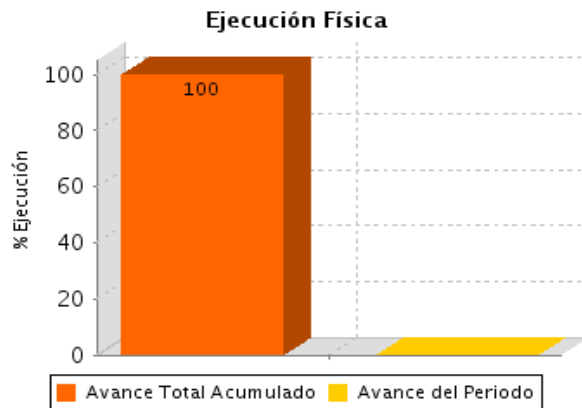

SITUACIÓN ACTUAL

Las obras físicas han sido concluidas . Se encuentran en proceso los trámites de pagos de los contratos según se detalla a continuación:


- LPI 1563/2020 Reajuste de precios Adquisición de transformadores de potencia G. 2.145.780.000.; - LPI 1503/2019 reajuste de precios de los CO del 1 al 18 G. 588.596.925.;
- LPI 1503/2019 reajuste de precios de Suministros G. 2.717.884.950. Los pagos señalados se encuentran actualmente en trámites para la emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, para luego proseguir con las gestiones ante la DNCP para la emisión del SIPE y posterior pago a los contratistas.

Los pagos mencionados serán realizados con los fondos remanentes del préstamo BID 2891. Se ha asumido el compromiso de finalización de los procesos del proyecto para el 30/06/2023.



Proyecto	Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléctrico de la ANDE			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	160			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	5.286.000	GS.	53.708.085.988
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
14.902.664.006	38.805.421.982		27,75 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/07/2014	30/06/2022		31/12/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
9.232.478.885	642.912.759		6,96 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

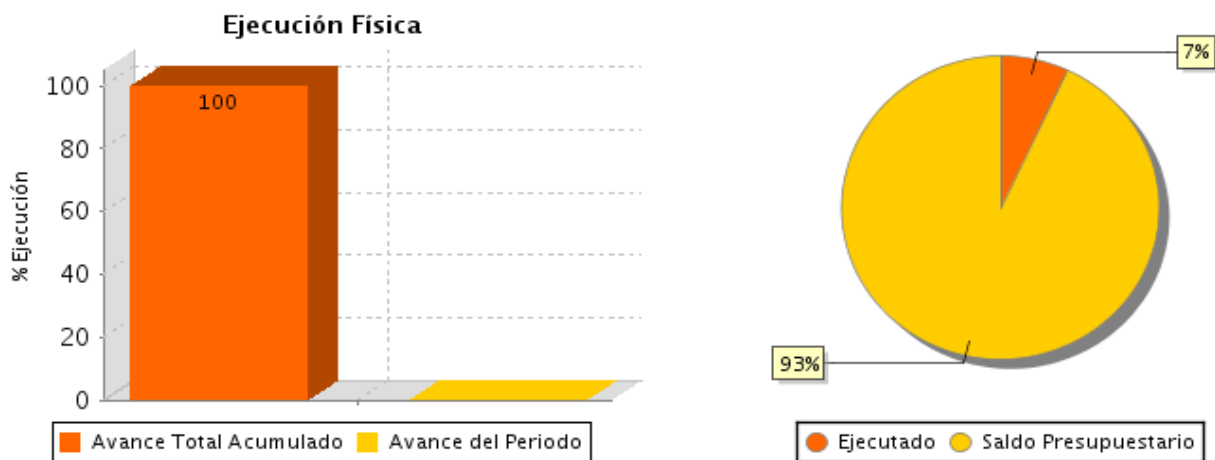


SITUACIÓN ACTUAL

Conforme al cronograma previsto por las unidades administradoras de los contratos, las obras físicas han sido concluidas en su totalidad, no obstante, se encuentra pendiente la cancelación de estados de cuentas finales y el cierre del proyecto.



Proyecto	Mejoramiento del Sistema Eléctrico en la Ciudad de Asunción		
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD		
Código SNIP N°	276		
Financiamiento	BEI, CAF		
Costo del Proyecto	USD	51.279.624	GS. 347.753.380.585
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
274.430.230.490	73.323.150.095		78,92 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
12/12/2018	12/11/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Asunción		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
11,40 %		85,72 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado
59.170.070.192	2.485.282.314		4,20 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

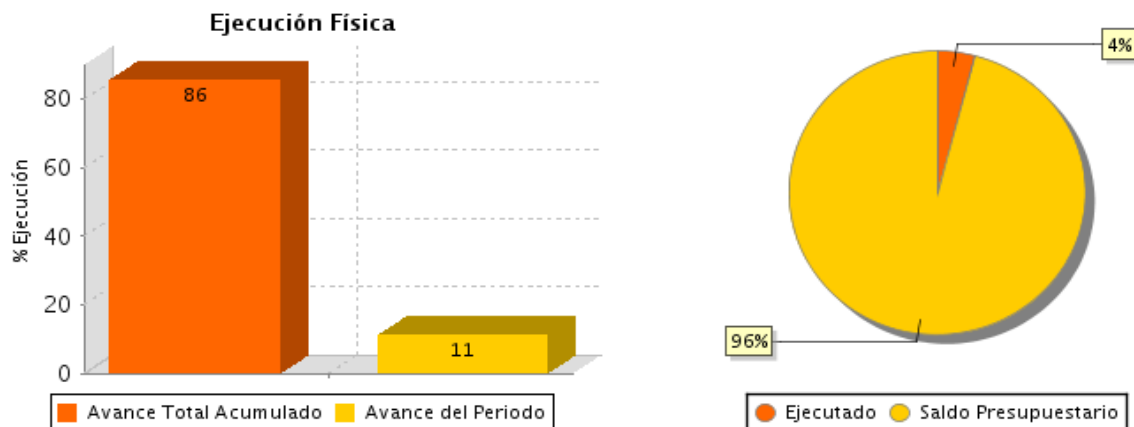


SITUACIÓN ACTUAL

Se reportan los siguientes avances en el cuatrimestre: I) Componente 1. “Repotenciación Línea 66 kV Puerto Botánico-San Miguel y Construcción de Línea de 66 kV Parque Caballero-San Miguel”, en encuentra en proceso la gestión para el llamado a Licitación. II) Componente 2 “Repotenciación de Líneas de Transmisión Subterráneas de 66 kV General Díaz-Central y Gral. Díaz-Republicano”, se encuentran en desarrollo las gestiones pertinentes para el inicio de obras. III) Componente 3 “Ampliación de la Subestación del Parque Caballero”, actualmente, se está desarrollando estudio de ubicación para la torre de alimentación de la Subestación del Parque. IV) Componente 4 “Construcción de la Línea de 220 kV Villa Hayes-Puerto Botánico-Parque Caballero”, se han concluido los trabajos de tramo aéreo, y los trabajos en el área subterránea están en etapa de conclusión.



Proyecto	Mejoramiento del Sistema Eléctrico de los Departamentos de Caaguazú y Alto Paraná			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	277			
Financiamiento	BEI, CAF			
Costo del Proyecto	USD	66.239.968	GS.	506.402.393.959
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
378.013.257.620	128.389.136.339		74,65 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
12/12/2018	12/11/2020		31/12/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Caaguazú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
8,10 %			70,05 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
128.973.320.733	13.252.625.991		10,28 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

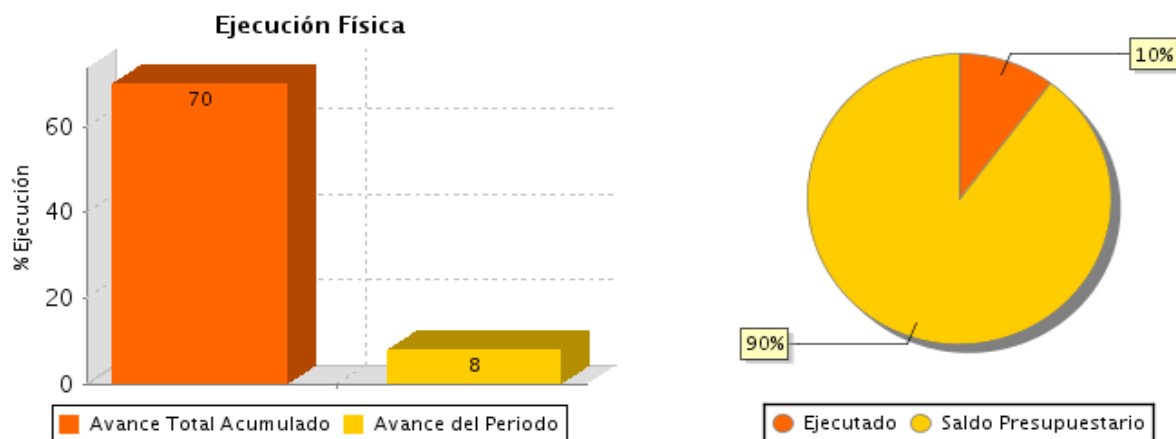


SITUACIÓN ACTUAL

Respecto a los avances logrados, cabe señalar que las obras correspondientes a la Subestación Santa Rita y Ampliación de la Línea de Transmisión de Paranambu y Naranjal, se encuentran concluidas. En cuanto a la ampliación de la Subestación de Alto Paraná (ubicada en Ciudad del Este), se han concluido las excavaciones y se están colocando los registros. El Convenio Modificatorio N° 1 se encuentra en proceso en el área de la administración institucional. La obra está en pausa por un rezago en cuanto al desembolso del BEI y al requerimiento de una modificación presupuestaria.



Proyecto		Mejoramiento del Sistema Eléctrico en el Departamento Central			
OEE		ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°		278			
Financiamiento		CAF, OFID			
Costo del Proyecto		USD	96.228.663	GS.	583.818.471.767
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
529.683.107.161		54.135.364.606		90,73 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
05/01/2018		31/12/2020		31/12/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Central				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			99,40 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
87.320.488.917		2.142.103.506		2,45 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

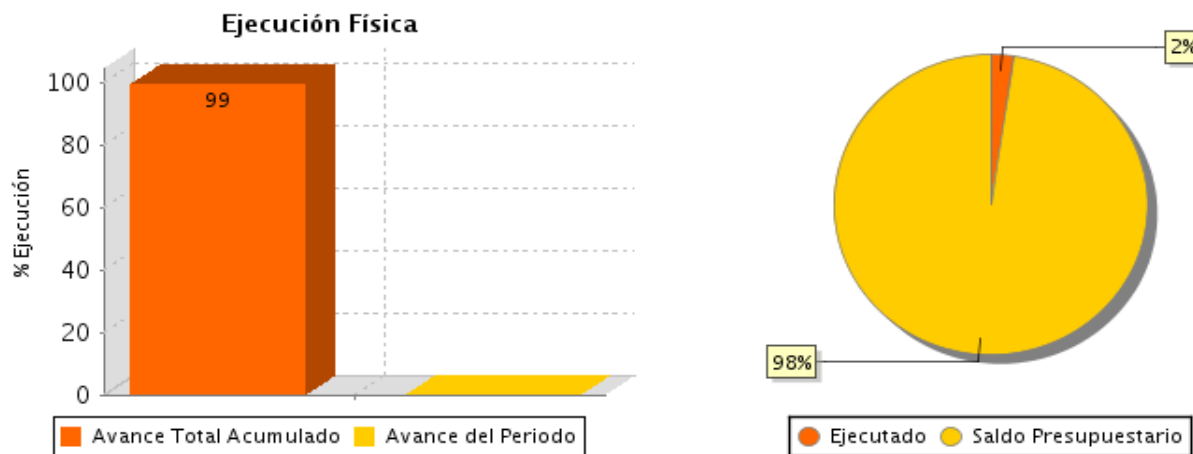


SITUACIÓN ACTUAL

Cabe señalar la continuidad del proyecto en el presente ejercicio fiscal, ya que a fin de utilizar el saldo remanente de los recursos del préstamo, fue planificada e incorporada a la ejecución una nueva obra. La misma corresponde a la Licitación Pública Internacional "Recapacitación de las Subestaciones Luque y Capiatá" la cual se encuentra en etapa de inicio y se prevé su finalización en diciembre del 2024.



Proyecto		Mejoramiento Sistema de Distribución Energía Eléctrica FASE II			
OEE		ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°		621			
Financiamiento		BEI, CAF			
Costo del Proyecto		USD	152.075.474	GS.	897.171.989.896
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
262.835.725.672		634.336.264.224		29,30 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
12/12/2018		12/12/2021		31/12/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Asunción, Central, Cordillera, Presidente Hayes				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
6,70 %			73,60 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
388.603.285.838		4.338.329.085		1,12 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

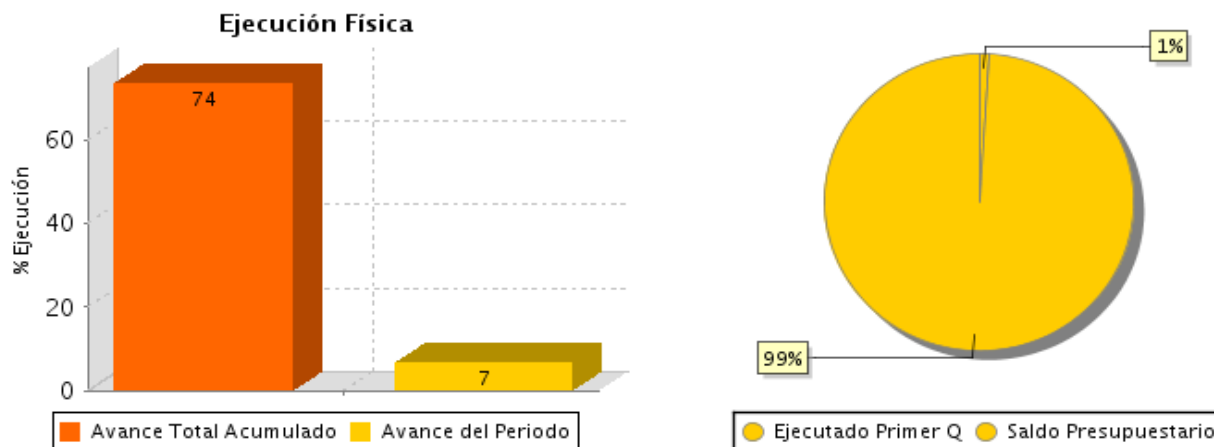


SITUACIÓN ACTUAL

En lo que respecta al Componente "Ampliación y Cambio de conductores desnudos a protegidos en media tensión", se realizó el anticipo financiero para las aperturas de carta de crédito en concepto de los suministros que serán importados. En cuanto al Componente "Mejora de la iluminación pública", varios documentos básicos para los llamados se encuentran sujetos a la aprobación por parte del Organismo Financiador.



Proyecto	Reposición Compensador Estatico de Reactivos Sub Estación San Lorenzo		
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD		
Código SNIP N°	706		
Financiamiento	CAF		
Costo del Proyecto	USD	18.000.000	GS. 147.493.037.151
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
118.201.970.408	29.291.066.743	80,14 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
12/12/2018	13/02/2021	31/12/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Asunción, Central, Cordillera, Paraguari, Presidente Hayes		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %		93,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
786.098.115	5.082.527	0,65 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

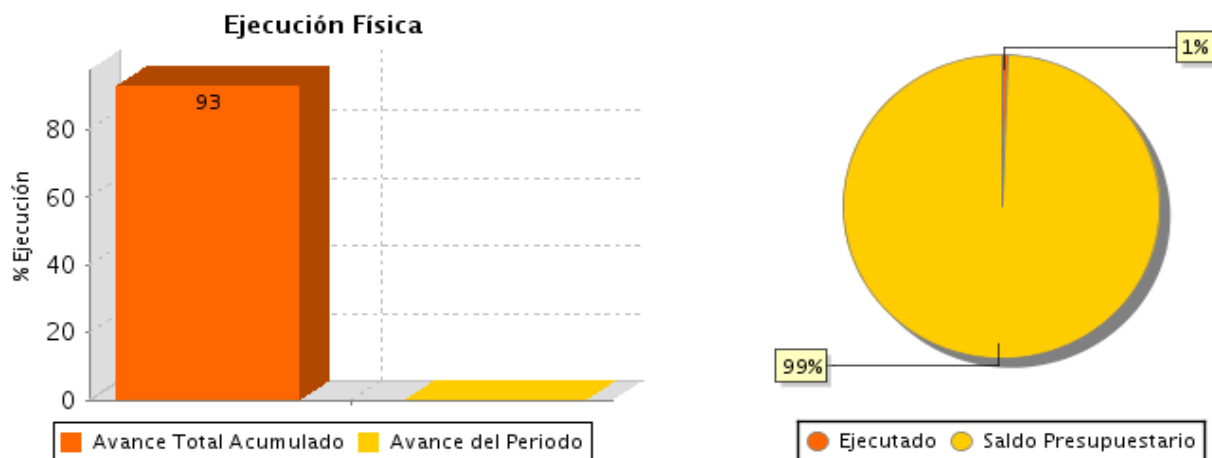


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no reportó los avances correspondientes al primer cuatrimestre del año en curso.



Proyecto	Construcción de la Subestación Valenzuela 500 kV en Valenzuela			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	712			
Financiamiento	FONPLATA			
Costo del Proyecto	USD	89.567.653	GS.	621.991.214.416
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
347.619.476.332	274.371.738.084		55,89 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
02/01/2020	02/01/2023		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Caaguazú, Central, Cordillera, Paraguarí, Presidente Hayes			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,14 %			40,32 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
197.286.368.006	862.568.034		0,44 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

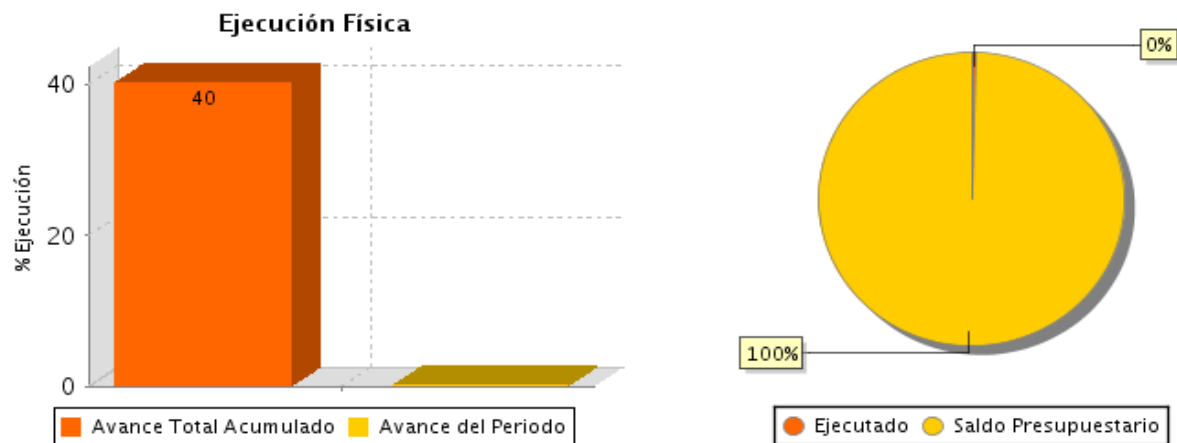


SITUACIÓN ACTUAL

Se obtuvieron los siguientes avances en el periodo de referencia: -Componente de Obras y Montaje de instalaciones: En cuanto a la construcción del Patio de 66 kV, incluyendo 1 (una) posición de transformador y 1 posición de LT 66 kV, se avanzó con los trabajos civiles, nivelación del terreno y fundaciones. -Componente de Gestión Ambiental: se encuentra en estudio el Plan de Manejo de Residuos, y el Programa de Salud y Seguridad Ocupacional, los cuales fueron observados con sugerencias y modificaciones por la Sección de Supervisión Ambiental, los cuales deberán ser tenidos en cuenta para la aprobación final de los documentos.



Proyecto	Construcción Subestación Yguazú en 500 kV			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	717			
Financiamiento	CAF			
Costo del Proyecto	USD	153.200.000	GS.	777.557.460.600
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
809.349.473.686	-31.792.013.086		104,09 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
19/07/2019	24/07/2023		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Guairá, San Pedro			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			92,16 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
79.154.508.927	4.299.644.039		5,43 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

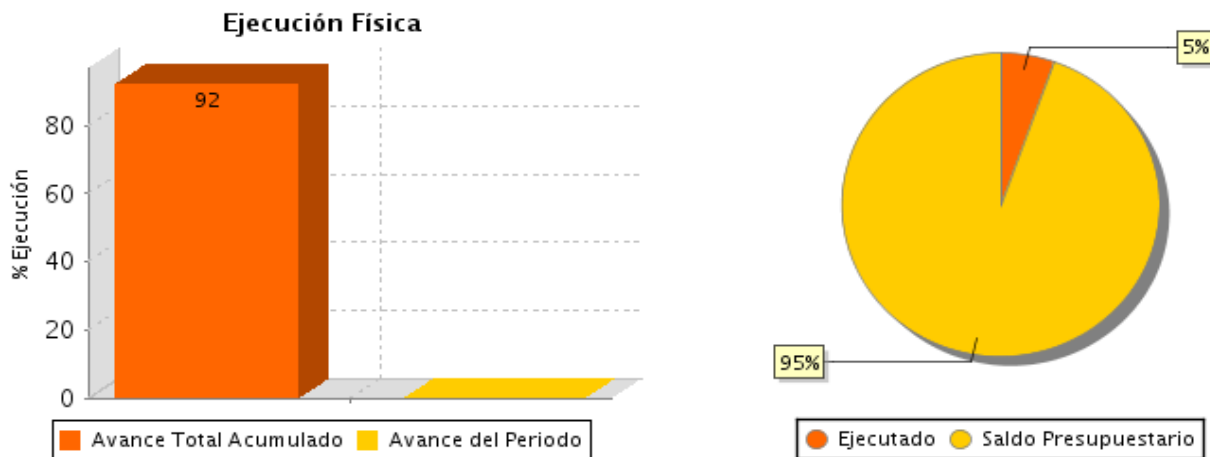


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no reportó los avances correspondientes al primer cuatrimestre del año en curso.



Proyecto	Construcción de la Subestación de Maria Auxiliadora y Línea de Transmisión 220kV Santa Rita - Maria Auxiliadora		
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD		
Código SNIP N°	776		
Financiamiento	CAF		
Costo del Proyecto	USD	34.680.000	GS. 185.007.165.732
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
136.794.092.054	48.213.073.678	73,94 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
19/07/2019	24/07/2023	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraná, Itapúa		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %	42,58 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
46.777.619.225	1.251.584.729	2,68 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

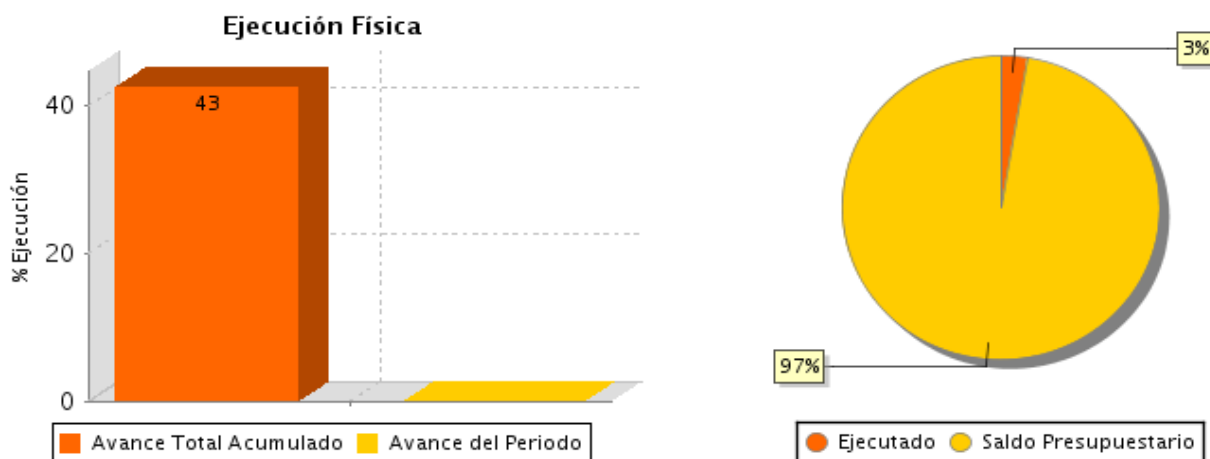


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no reportó los avances correspondientes al primer cuatrimestre del año en curso.



Proyecto	Mejoramiento 5000 km. de Líneas Baja Tensión y Media Tensión de Autoayuda		
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD		
Código SNIP N°	777		
Financiamiento	CAF		
Costo del Proyecto	USD	30.049.687	GS. 219.064.177.460
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
33.552.290.937	185.511.886.523	15,32 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
19/07/2019	24/07/2023	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro, Ñeembucú		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %		30,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
94.207.411.430	1.541.202.626	1,64 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

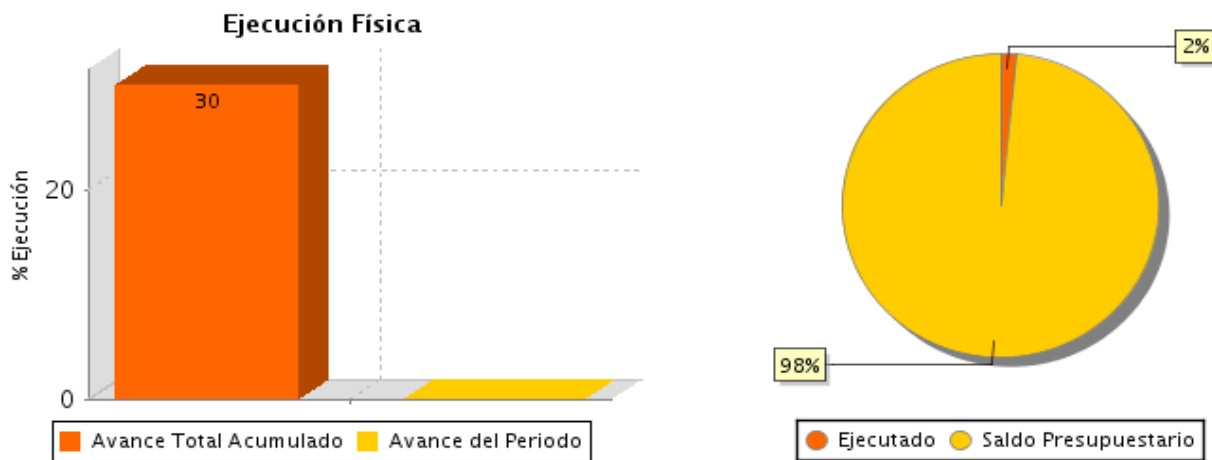


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no reportó los avances correspondientes al primer cuatrimestre del año en curso.

Proyecto	Mejoramiento Rehabilitación y Modernización Central Hidroeléctrica Acaray en AP		
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD		
Código SNIP N°	794		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	145.200.000	GS. 842.161.855.706
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
16.777.599.897	825.384.255.809		1,99 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
02/01/2020	07/01/2026		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional			
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
1,81 %		2,21 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado
41.854.712.505	626.000.000		1,50 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

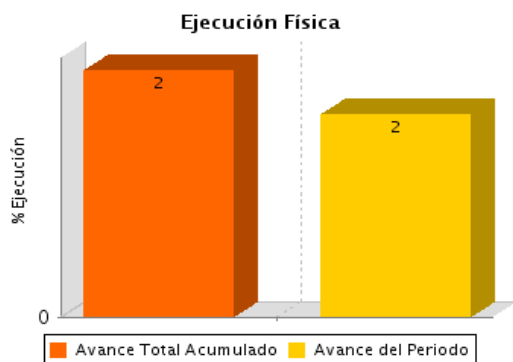

SITUACIÓN ACTUAL


El proyecto se encuentra iniciando su ejecución. Se registran avances que corresponden gestiones y contrataciones realizadas (asistencia técnica y asesorías) para la implementación del proyecto, conforme al siguiente detalle:

- "Contratación de Servicios de Consultoría para el Diseño de Ingeniería, Coordinación General, Supervisión e Inspección de las intervenciones del Programa". Situación actual: Contrato N° 9090/2023, suscrito con el Consorcio AFRY y Asociados en fecha 4 de abril de 2023. Actualmente en etapa de relevamientos de datos del Programa.
- "Contratación de Firma Constructora para Plan Piloto de sistema aislado híbrido en Puerto Esperanza". Situación actual: Contrato suscrito con el Consorcio Esperanza 3, actualmente con apertura del 100% de la Carta de Crédito.
- "Estrategia de género diseñada e implementada en la ANDE": Contratación de Firma Consultora para diseño y capacitación en temas de género, equidad e inclusión. Situación actual: en proceso de elaboración de Pliego de Bases y Condiciones.
- "Consultoría Comunicacional para políticas de Género". Situación actual: en proceso de elaboración de Términos de Referencia.
- "Obra para la Guardería de la sede central y acceso inclusivos". Situación actual: en proceso de elaboración de Pliego de Bases y Condiciones.
- "Adquisición de Herramientas y Equipos Especiales. Situación actual: Contrato suscrito con Hidráulica Brasil, actualmente con una Carta de Crédito Abierta.
- "Auditoría Externa del Programa". Situación Actual: Contrato suscrito con BDO Auditores y Consultores. Actualmente entregaron informe a los EFAS 2022.
- Unidad Administradora del Programa. Situación actual: se encuentran ejecutando sus servicios profesionales 12 consultores para el proyecto.



Proyecto	Mejoramiento del Sistema de Distribución - FASE III RO y PH			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	844			
Financiamiento	CAF			
Costo del Proyecto	USD	126.052.910	GS.	787.830.690.159
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
7.786.606.256	780.044.083.903		0,99 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/05/2022	01/05/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,99 %			1,99 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
482.220.796.549	0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

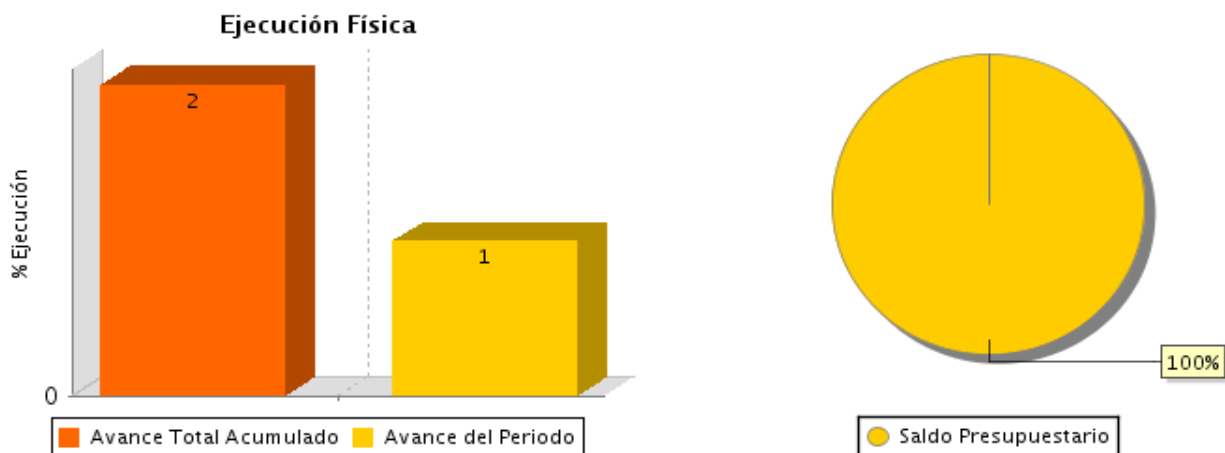


SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto se encuentra en la fase inicial de su ejecución. En cuanto a avances, se pueden mencionar las gestiones para procesos licitatorios para la Actividad denominada "Ampliación y cambio de conductores desnudos a protegidos en media tensión con una extensión de 808 km.", (sujeto a una modificación presupuestaria). A la fecha, no cuenta aún con adjudicaciones otorgadas.



Proyecto		Equipamiento Adquisición Sub Estaciones Móviles 220/23 y 66/23 kV			
OEE		ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°		848			
Financiamiento		CAF			
Costo del Proyecto		USD	20.086.365	GS.	125.539.779.094
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
101.579.542.113		23.960.236.981		80,91 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/05/2022		01/05/2024		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional					
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			1,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
154.716.194.024		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

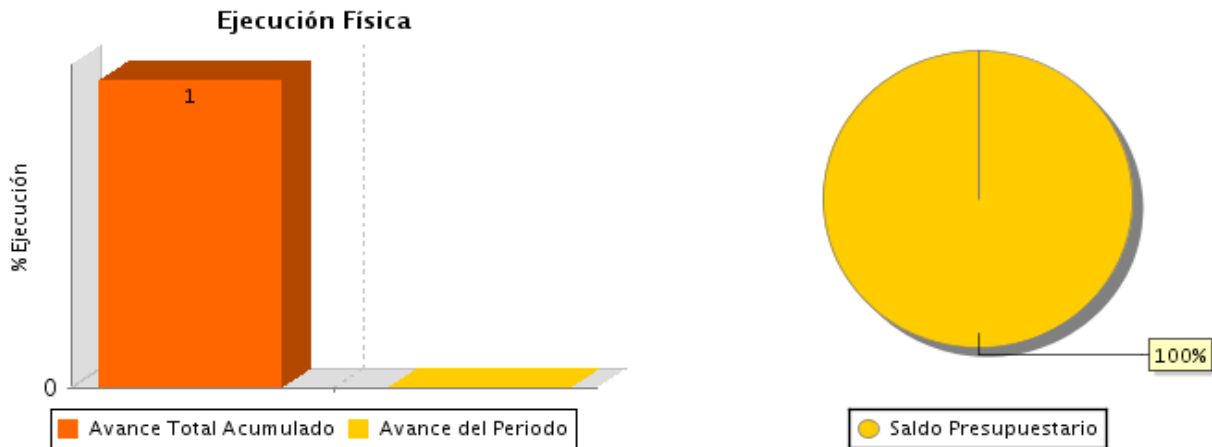


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no reportó los avances correspondientes al primer cuatrimestre del año en curso. Respecto a la inconsistencia observada entre el Avance Financiero y el Avance Físico observado, ya detectado al cierre del ejercicio 2022, la ANDE ha respondido que, los pagos por la Apertura de las Cartas de Créditos Internacionales han sido realizados, sin embargo los suministros aún no han sido recepcionados, y que de acuerdo al criterio institucional, no debería informarse respecto a avances físicos hasta tanto sean recepcionados los suministros.



Proyecto	Mejoramiento Gestión Sistema Eléctrico de Distribución-SGIDE		
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD		
Código SNIP N°	886		
Financiamiento	CAF		
Costo del Proyecto	USD	100.227.735	GS. 627.611.914.437
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
7.097.160.380	620.514.754.057		1,13 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/05/2022	01/05/2027		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional			
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,12 %		0,12 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
234.587.387.387	856.468.731	0,37 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

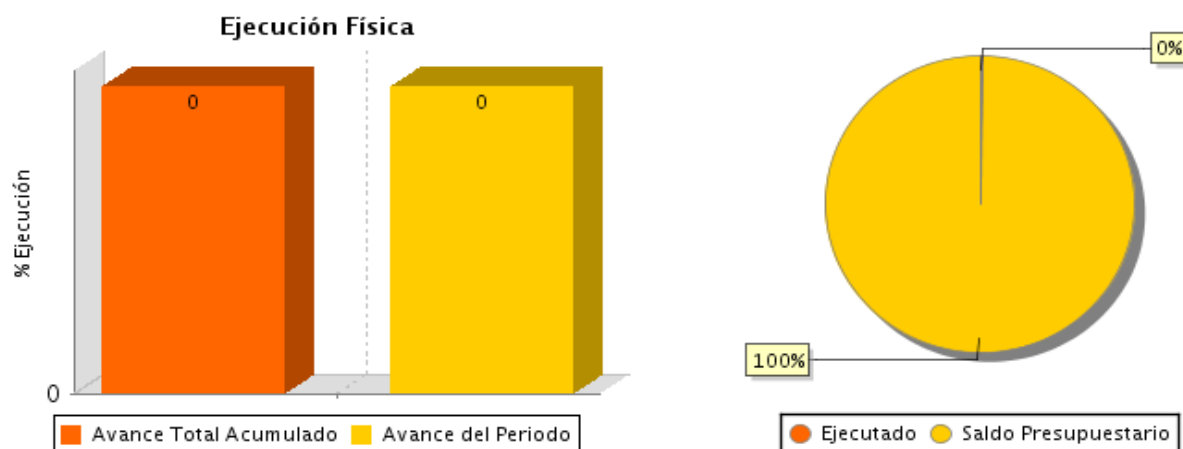

SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto se encuentra en su fase inicial de ejecución. Se reportan avances en las gestiones para el llamado a Licitación para la Construcción de un edificio para Centro de Operación Nacional de Distribución y Data Center y la adecuación edilicia de los centros de operación regional de distribución. A la fecha no cuenta con adjudicaciones en las actividades del proyecto, sin embargo, se ha avanzado en el desarrollo de tareas administrativas financieras del mismo.
