



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y  
BIENESTAR SOCIAL

Enero - Abril 2023


 Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública





<b>Proyecto</b>	SP ABAST.DE AGUA. POT.Y SAN.BAS PEQ.COM.RURAL E INDI(FOCEM)			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL			
<b>Código SNIP N°</b>	50			
<b>Financiamiento</b>	FOCEM, LOCAL			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	20.339.133	<b>GS.</b>	104.732.692.220
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
74.571.544.058	30.161.148.162		71,20 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
16/05/2008	16/05/2013		31/12/2024	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional	N/A			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
0 %			95 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
13.699.663.450	113.748.711		0,83 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

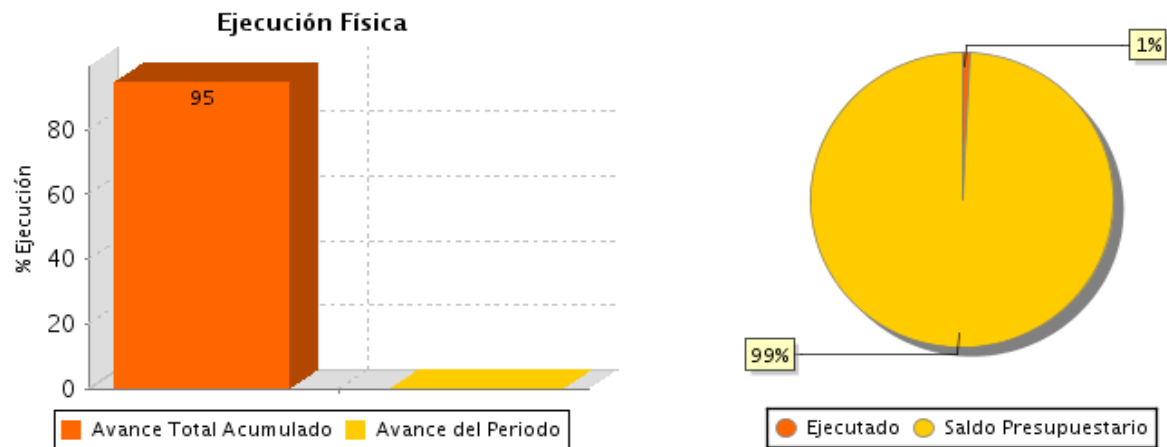


### SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.



<b>Proyecto</b>	Investigación ,Educ. y Biotecnología Aplicadas a la Salud		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		
<b>Código SNIP N°</b>	153		
<b>Financiamiento</b>	FOCEM, LOCAL		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	3.011.806	<b>GS.</b> 23.794.443.236
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
14.737.627.654	9.056.815.582		61,94 %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
20/12/2011	20/12/2014		31/12/2023
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Internacional	Argentina, Brasil, Paraguay		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
4 %		79 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>
7.099.565.514	72.716.880		1,02 %

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

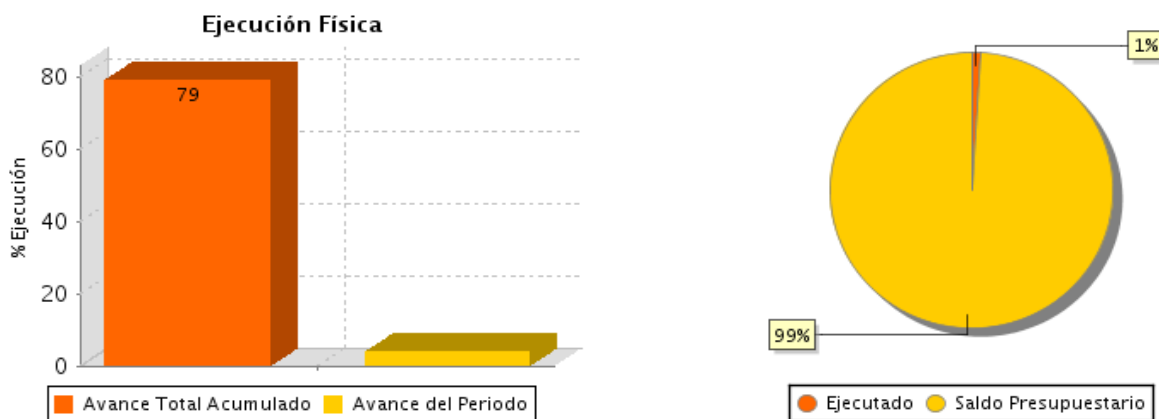


### SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informó que en el presente cuatrimestre se encuentra firmada la adenda de ampliación al contrato de construcción del laboratorio de biotecnología lo que permitirá la conclusión de la obra. Se comunica además que la Licitación Pública Nacional N° 92/2022 de reactivos e insumos está adjudicada y presentada para su posterior obligación, como así también, se encuentra en proceso el pedido de amoblamiento del laboratorio por compra directa.



<b>Proyecto</b>	Construcción Sist.AguaPot.y.San.Peq.Ciud.Com.Rural.e.Indig.			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL			
<b>Código SNIP N°</b>	555			
<b>Financiamiento</b>	BID , GOBIERNO ESPAÑOL			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	60.000.000	<b>GS.</b>	336.000.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
239.765.562.872	96.234.437.128		71,36 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
28/08/2018	28/08/2024		N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional	N/A			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
0 %			59 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
94.701.386.141	17.030.650.240		17,98 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

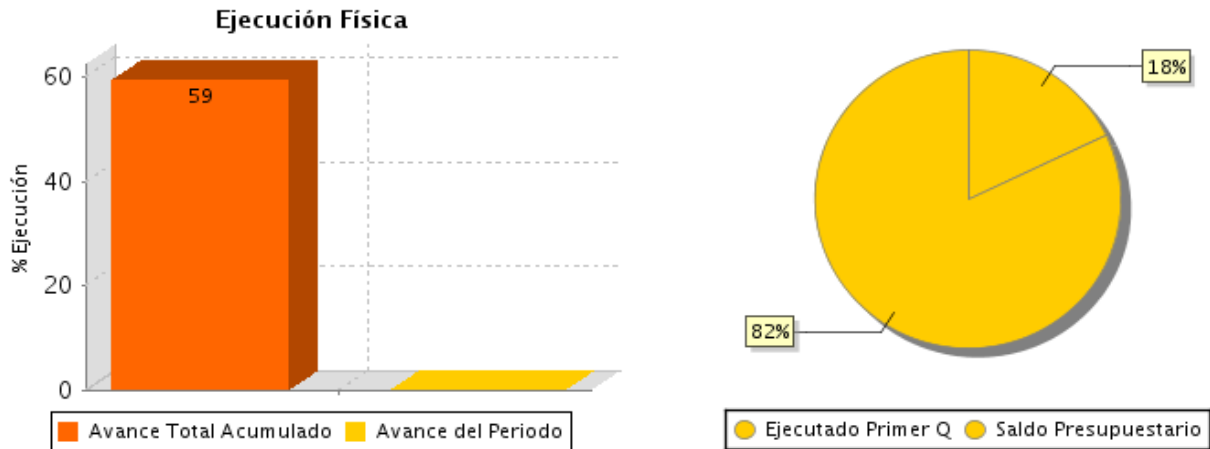


### SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.



<b>Proyecto</b>	Mejoramiento Fort. y Apoyo Integral a los Serv de Salud Pub			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL			
<b>Código SNIP N°</b>	773			
<b>Financiamiento</b>	CAF, COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, FONACIDE, FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY 4758/12			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	N/A	<b>GS.</b>	2.350.000.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
1.176.209.335.139	1.173.790.664.861		50,05 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
31/07/2017	31/12/2023		N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional	N/A			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
0 %			28 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
241.807.401.203	200.549.320.857		82,94 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

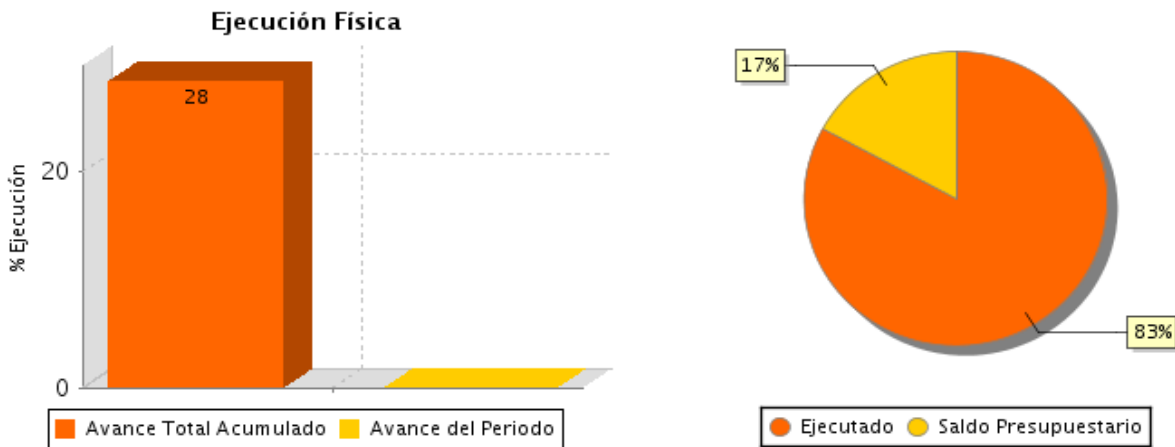


### SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.



<b>Proyecto</b>	Construcción Fortalecimiento de Atención Primaria en Salud		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		
<b>Código SNIP N°</b>	805		
<b>Financiamiento</b>	BIRF		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	115.000.000	<b>GS.</b> 828.235.039.928
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>	<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
266.490.619.924	561.744.420.004	32,18 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>	<b>Fecha de Prórroga</b>	
26/03/2020	26/03/2026	N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
<b>Departamental</b>	Amambay, Central, Cordillera, Paraguari		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>	<b>Avance Físico Acumulado Total</b>		
16 %	64 %		
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
323.339.923.789	40.328.514.496	12,47 %	

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

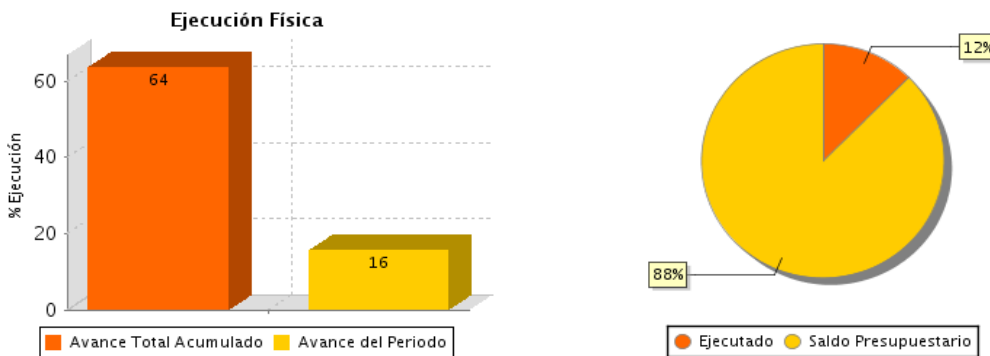

#### SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre se avanzaron en los siguientes productos: Componente 1: Obras de Construcción: 1er grupo que consta de 31 Unidades de Salud Familiaron (USF) con 40 % de avance con certificados de obras. Los grupos 2: 28 USF, 3: 27 USF y 4: 26 USF, con avances en su adjudicación, Equipamiento: los procesos se encuentran en etapa de evaluación de ofertas, Capacitación: los procesos se encuentran en etapa de evaluación de ofertas y elaboración de pliegos, Fortalecimiento institucional: procesos adjudicados y otros en etapa de convocatoria.

Componente 2: Se ha transferido recursos a los consejos locales de salud, correspondiente al 2° y 3° cuatrimestre 2022.

Componente 3: Se acordó impulsar el fortalecimiento del equipo de trabajo en áreas claves, como finanzas y adquisiciones para atender los volúmenes crecientes de procesos y transacciones asociados.


Con relación a las consultas a pueblos indígenas, se llevó a cabo la primera consulta estratégica con pueblos indígenas, una materia pendiente del proyecto, con apoyo financiero del MSPBS. Se está trabajando en el proceso de contratación de una firma que lleve el seguimiento de este proceso de consulta.

Componente 4: Hay 2 (dos) procesos que se encuentran en curso: (i) Equipos de Terapia Intensiva: en proceso de respuestas de las 380 consultas recibidas; y (ii) Plantas generadoras de oxígeno. Los demás procesos se encuentran en un 98% con cancelación de contratos.



<b>Proyecto</b>		Mejoramiento de la calidad de atención de los establecimientos del MSPBS			
<b>OEE</b>		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL			
<b>Código SNIP N°</b>		887			
<b>Financiamiento</b>		REPÚBLICA DE CHINA			
<b>Costo del Proyecto</b>		<b>USD</b>	14.992.733	<b>GS.</b>	190.699.623.258
<b>Avance Financiero en Gs.</b>		<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
135.917.049.516		54.782.573.742		71,27 %	
<b>Fecha de Inicio</b>		<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
11/08/2020		11/08/2022		11/12/2023	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>					
Nacional	N/A				
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>		
20 %			71 %		
<b>PGN Vigente en Gs.</b>		<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
62.551.315.038		19.557.520.962		31,27 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

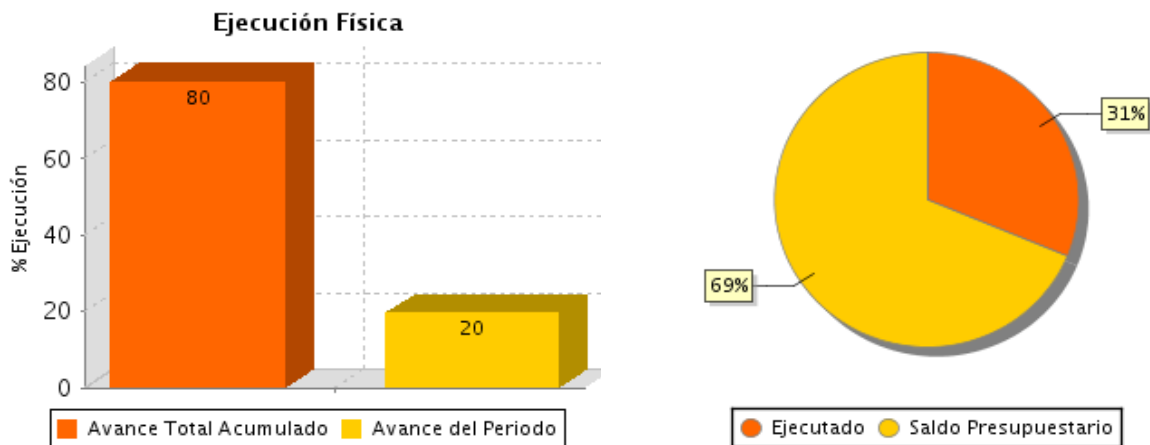


### SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración del presente informe, la UEP no ha respondido a las observaciones emitidas por esta dependencia sobre los avances del Proyecto.



<b>Proyecto</b>	Equipamiento Equip. Contenc y Apoyo a los Serv. de Salud		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		
<b>Código SNIP N°</b>	915		
<b>Financiamiento</b>	BIRF, CAF		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	20.000.000	<b>GS.</b> 829.999.998.500
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
791.462.320.261	38.537.678.239		95,36 %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
26/03/2020	26/03/2022		31/12/2023
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
0 %		89 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al</b>	<b>30/04/ 2023</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>
4.450.000.000	0		0,00 %

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

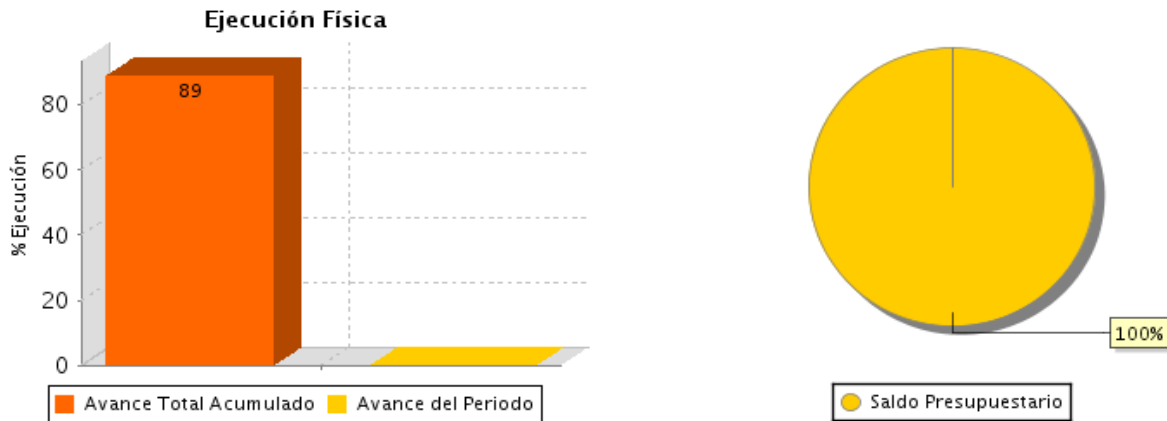

### SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre se informa que hubo una última compra de equipamientos para Unidades de Terapia en el mes de febrero, el cual ya fue pagado a la empresa proveedora. Cabe mencionar que el proyecto concluyó en el mes de febrero 2023, quedando pendiente la entrega del informe de la consultoría externa contratada para ello y el pago correspondiente (contra entrega). Se informa además que se tiene previsto para mediados de agosto 2023 la devolución de los fondos no utilizados en el marco del Proyecto.
