



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO

## PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**Enero - Abril 2023**


 Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública





Proyecto	Innovación en Empresas del Paraguay		
OEE	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
Código SNIP N°	568		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	10.000.000	GS. 68.663.064.061
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
33.068.680.763	35.594.383.298		48,16 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
21/09/2017	21/09/2022		01/06/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
2 %		83 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado
24.355.797.548	2.576.075.968		10,58 %

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

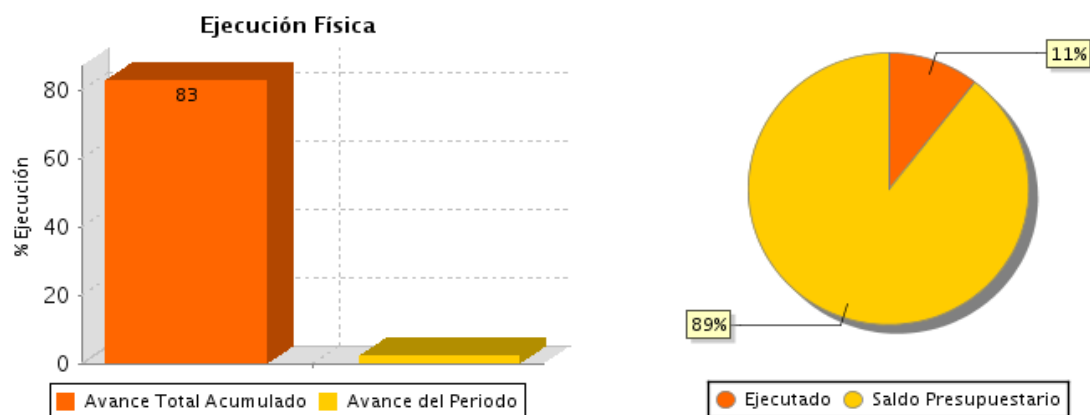


#### SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que durante el primer cuatrimestre se realizaron algunas convocatorias de llamados para la presentación de propuestas de proyectos de innovación. En el componente 1, se contó con 3 convocatorias para proyectos individuales de innovación y desarrollo tecnológico, Proyectos Asociativos de Innovación y Desarrollo Tecnológico y Proyectos de Fortalecimiento de Servicios Tecnológicos. En cuanto al Fortalecimiento del Capital Humano para la innovación: se habilitaron 6 cursos de posgrados ofrecidos por las instituciones adjudicadas.



<b>Proyecto</b>		Construcción y Equipamiento del Laboratorio de la SENAD			
<b>OEE</b>		PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
<b>Código SNIP N°</b>		890			
<b>Financiamiento</b>		REPÚBLICA DE CHINA			
<b>Costo del Proyecto</b>		<b>USD</b>	2.500.000	<b>GS.</b>	17.289.289.780
<b>Avance Financiero en Gs.</b>		<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
16.271.217.285		1.018.072.495		94,11 %	
<b>Fecha de Inicio</b>		<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
26/12/2018		26/12/2020		31/12/2023	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>					
Nacional	N/A				
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>		
7 %			91 %		
<b>PGN Vigente en Gs.</b>		<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
2.091.516.065		1.073.443.570		51,32 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

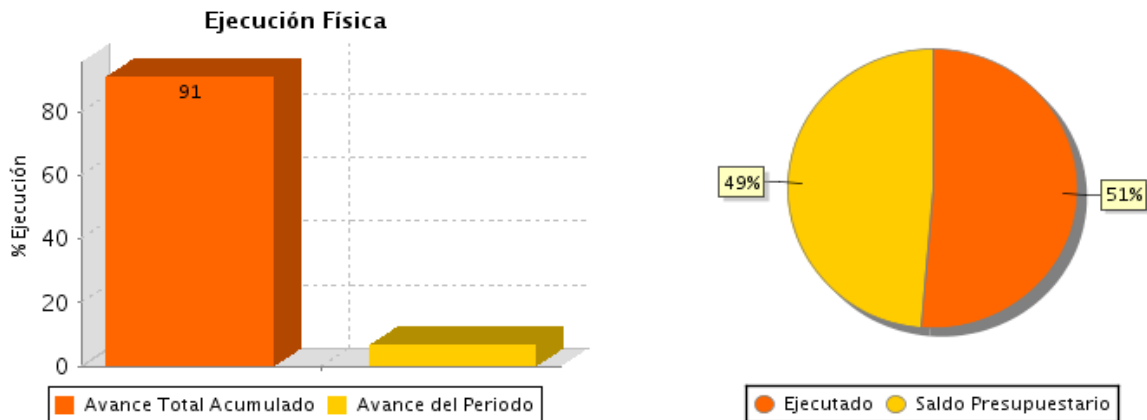


### SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informó los siguientes trabajos llevados a cabo en el presente cuatrimestre correspondientes al segundo nivel del laboratorio: trabajos preliminares, estructura de hormigón armado, trabajos de albañilería, techo, instalaciones eléctricas, instalación para baños y kitchenette, pisos, trabajos varios, servicio de carpintería, servicios de pintura y adecuación de planta baja.



<b>Proyecto</b>	Construcción, Mejoram. Escen. Deport. y Desarr.de XII J.S		
<b>OEE</b>	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
<b>Código SNIP N°</b>	932		
<b>Financiamiento</b>	LOCAL		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	N/A	<b>GS.</b> 476.266.981.402
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
443.503.851.084	32.763.130.318		93.120,85 %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
01/07/2021	31/012/2022		1/7/2023
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
0 %		85 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>
34.204.071.889	1.440.941.571		4,21 %

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

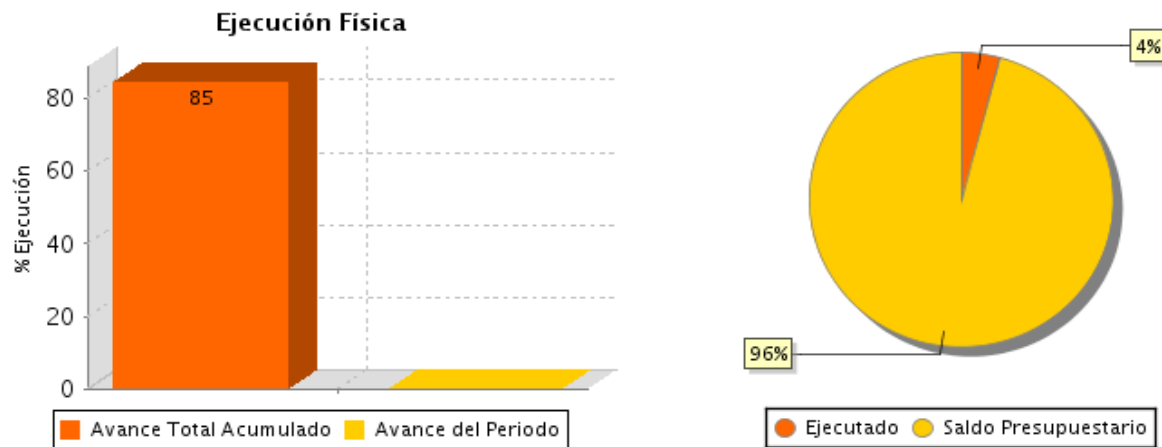


### SITUACIÓN ACTUAL

La Entidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto



<b>Proyecto</b>		Transferencia PROCENCIA II				
<b>OEE</b>		PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA				
<b>Código SNIP N°</b>		958				
<b>Financiamiento</b>		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.				
<b>Costo del Proyecto</b>		<b>USD</b>	N/A		<b>GS.</b>	599.274.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>		<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>		
44.408.830.309		554.865.169.691		7,41 %		
<b>Fecha de Inicio</b>		<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>		
23/06/2021		22/06/2027		N/A		
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>						
Nacional						
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>			
3 %			15 %			
<b>PGN Vigente en Gs.</b>		<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>		
198.085.095.634		13.305.387.961		6,72 %		

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

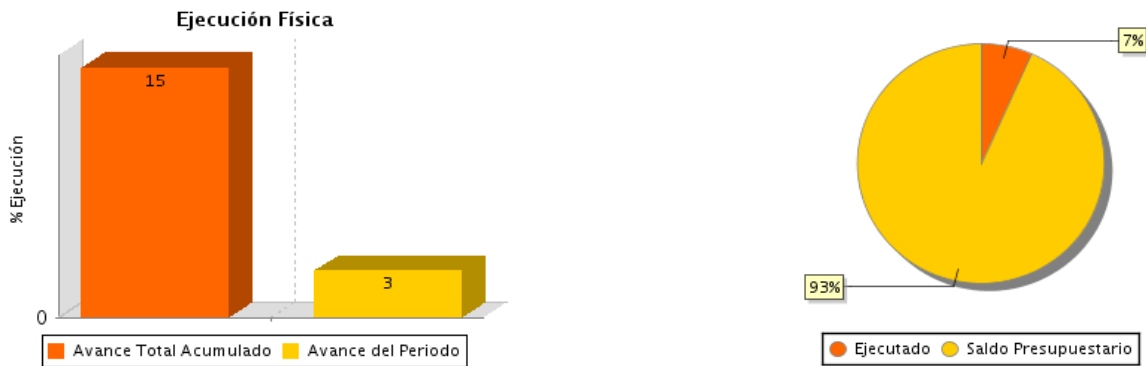

#### SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que durante el primer cuatrimestre finalizó la tercera etapa de la convocatoria de proyectos de investigación y desarrollo con 1.013 postulaciones, de las cuales se admitieron 756. El instrumento de eventos científicos cuenta con 4 actas de cierre firmadas y la segunda convocatoria cuenta con 94 postulaciones abiertas, 2 propuestas en evaluación finalizada y 1 postulación admitida. Se están construyendo las guías de bases y condiciones para los instrumentos de Proyectos estratégicos y Proyectos asociativos/multicéntricos de I+D. El acceso a información científica y tecnológica ha mejorado con la adjudicación de la licitación pública al Consorcio Optima Rosflo Infolink. Se aprobó la Guía de bases y condiciones para la convocatoria del instrumento del programa de inserción de capital humano avanzado. Se registraron 21 postulaciones, de las cuales hasta el período reportado fueron adjudicadas 3. La primera convocatoria de apoyo a publicaciones científicas fue finalizada con 7 adjudicaciones, mientras que la segunda convocatoria cuenta con la guía de bases y condiciones aprobada. En el instrumento de Formación Docente para la Investigación como Estrategia de Aprendizaje se realizaron llamados a concurso de méritos para contratación de un Administrador y un Tutor para la plataforma de cursos MOOC.
