



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Mayo - Agosto 2022


 Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública





<b>Proyecto</b>	SP ABAST.DE AGUA. POT.Y SAN.BAS PEQ.COM.RURAL E INDI(FOCEM)		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		
<b>Código SNIP N°</b>	50		
<b>Financiamiento</b>	FOCEM, LOCAL		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	39.470.702	<b>GS.</b> 104.732.692.220
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>	<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
74.233.283.604	30.499.408.616	70,88 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>	<b>Fecha de Prórroga</b>	
16/05/2008	16/05/2013	N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
1 %		90 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
8.108.411.227	552.688.403	6,82 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

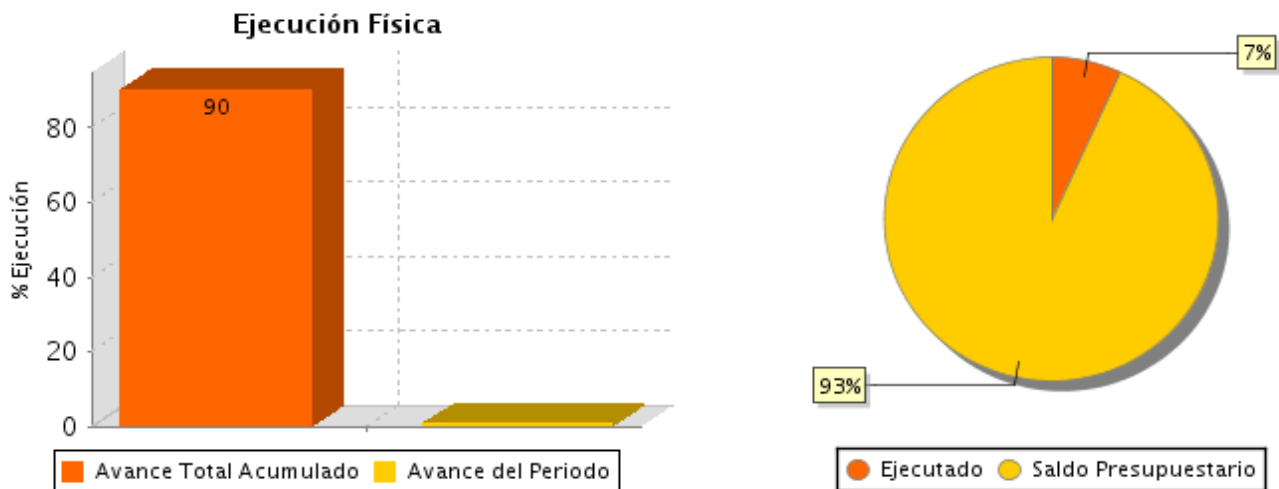

### SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración del presente informe, la UEP no ha respondido a las observaciones emitidas por esta dependencia sobre los avances del Proyecto.




TETÁ VIRU  
MOHENDAPY  
Motenondcha  
Ministerio de  
HACIENDA

TETÁ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL

SNIP  
Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública

Proyecto	SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)		
OEE	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		
Código SNIP N°	151		
Financiamiento	BID , LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	30.000.000	GS. 153.822.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
182.179.117.282	-28.357.117.282	118,44 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
20/02/2013	31/12/2017	26/02/2022	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
1 %		100 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022	Porcentaje Ejecutado	
21.115.849.506	10.666.859.253	50,52 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

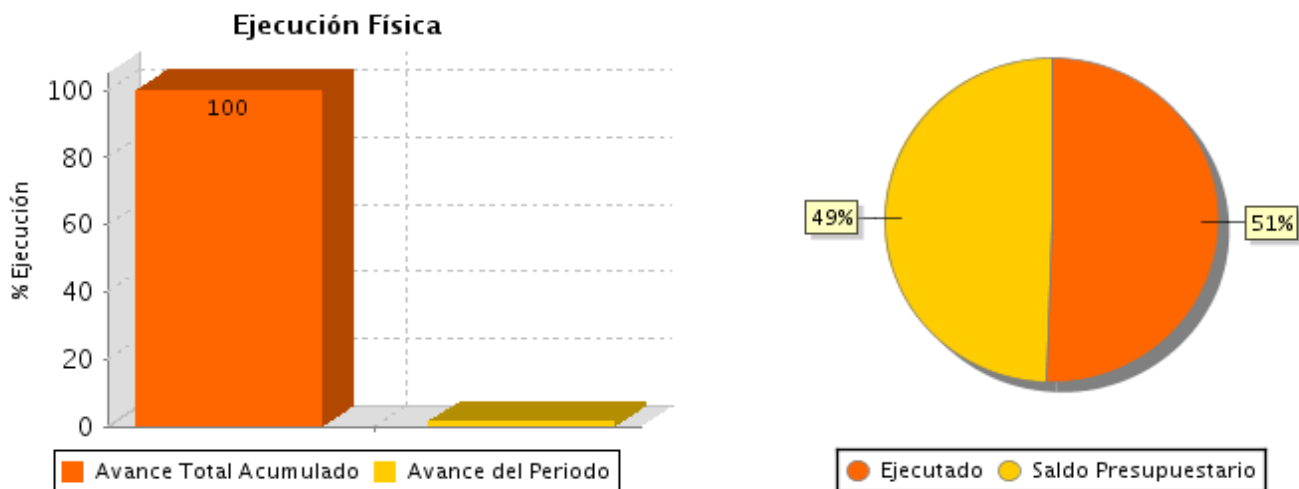


### SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.



<b>Proyecto</b>	Investigaci3n ,Educ. y Biotecnolog3a Aplicadas a la Salud		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE SALUD P3BLICA Y BIENESTAR SOCIAL		
<b>C3digo SNIP N3</b>	153		
<b>Financiamiento</b>	FOCEM, LOCAL		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	3.011.806	<b>GS.</b> 23.794.443.236
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>	<b>Porcentaje de Ejecuci3n</b>	
14.134.267.352	9.660.175.884	59,40 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>	<b>Fecha de Pr3rroga</b>	
20/12/2011	20/12/2014	31/12/2022	
<b>Ubicaci3n Geogr3fica del Proyecto</b>			
Internacional	Argentina, Brasil, Paraguay		
<b>Avance F3sico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance F3sico Acumulado Total</b>	
7 %		73 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecuci3n en Gs. al 31/08/ 2022</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
7.835.639.958	1.892.600.732	24,15 %	

### AVANCE F3SICO Y PRESUPUESTARIO

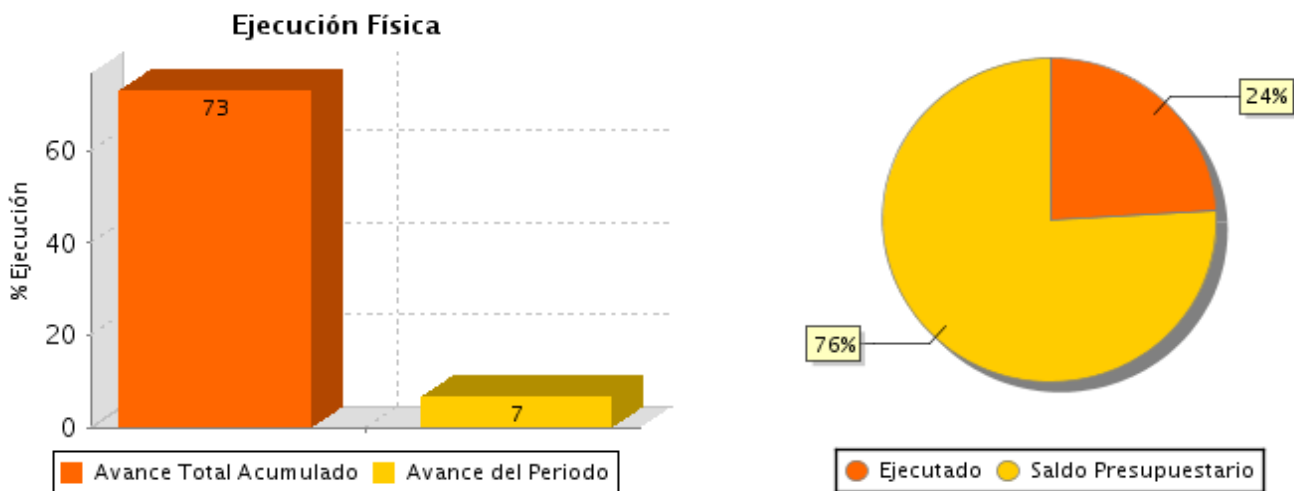

### SITUACI3N ACTUAL


La Unidad Ejecutora inform3 que en el periodo se realiz3 la presentaci3n de la Licitaci3n P3blica Internacional de equipamiento para el laboratorio de Biotecnolog3as Aplicadas a la Salud la cual se encuentra en etapa de certificaci3n para su levantamiento en el Portal de la Direcci3n Nacional de Contrataciones P3blicas (DNCP). As3 tambi3n los llamados de Licitaci3n por concurso de ofertas de Insumos y reactivos para el Laboratorio y la Compra Directa de Equipos de Computaci3n se encuentran levantados en el portal de la DNCP.

Se realizaron pagos de certificados de construcci3n y fiscalizaci3n de la obra en construcci3n y la realizaci3n del viaje de pasant3a del Postgrado de Doctorados.



Proyecto	Construcción Sist.AguaPot.y.San.Peq.Ciud.Com.Rural.e.Indig.		
OEE	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		
Código SNIP N°	555		
Financiamiento	BID , GOBIERNO ESPAÑOL		
Costo del Proyecto	USD	60.000.000	GS. 336.000.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
186.435.883.859	149.564.116.141	55,49 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
28/08/2018	28/08/2024	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		28 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022	Porcentaje Ejecutado	
104.090.164.780	51.164.156.705	49,15 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

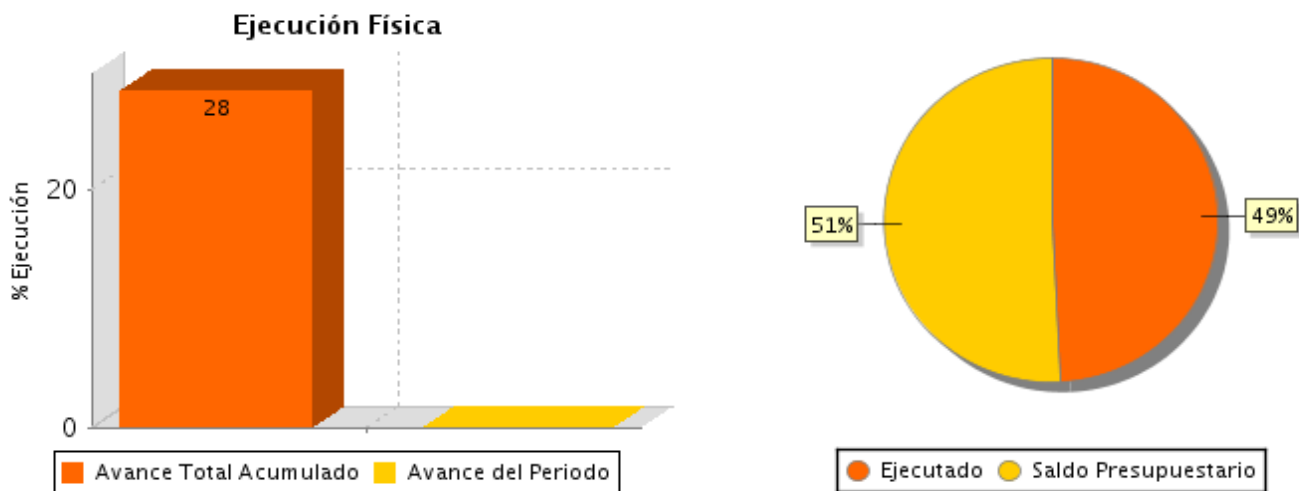


### SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.



Proyecto	Mejoramiento Fort. y Apoyo Integral a los Serv. de Salud Pública		
OEE	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		
Código SNIP N°	773		
Financiamiento	CAF, COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, FONACIDE, FONDO NACIONAL PARA LA		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 2.350.000.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
955.674.724.848	1.394.325.275.152		40,67 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
31/07/2017	31/12/2023		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		27 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022		Porcentaje Ejecutado
34.987.750.016	0		0,00 %

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

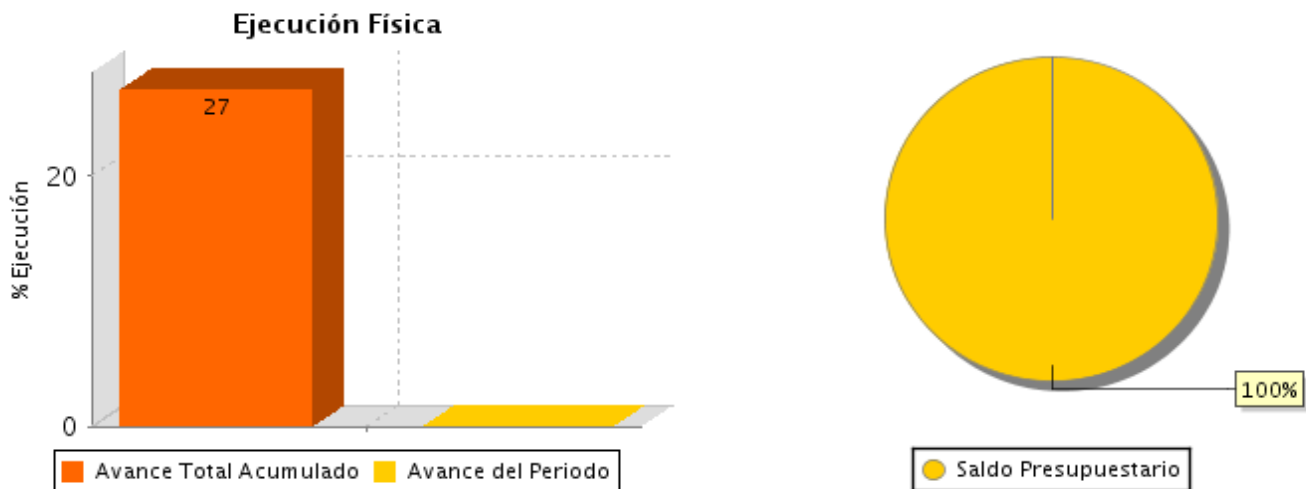


### SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.



<b>Proyecto</b>	Construcción Fortalecimiento de Atención Primaria en Salud		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		
<b>Código SNIP N°</b>	805		
<b>Financiamiento</b>	BIRF		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	115.000.000	<b>GS.</b> 709.550.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>	<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
69.211.638.735	640.338.361.265	9,75 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>	<b>Fecha de Prórroga</b>	
26/03/2020	26/03/2026	N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
<b>Departamental</b>	Amambay, Central, Cordillera, Paraguari		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
24 %		40 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
323.739.923.789	65.728.288.151	20,30 %	

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

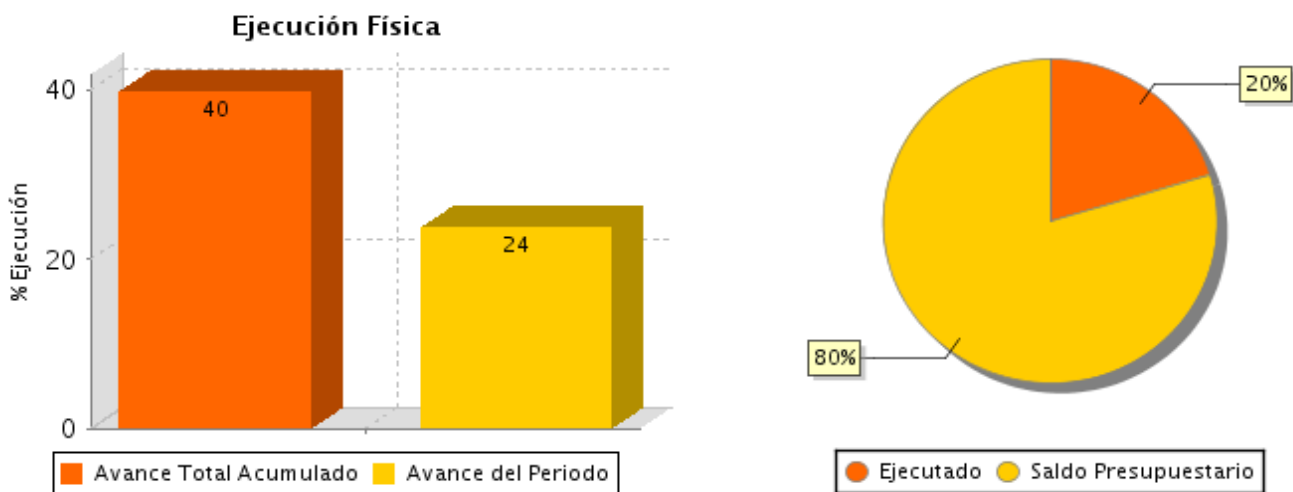

#### SITUACIÓN ACTUAL

En el presente periodo los principales avances vinculados se enmarcan en: i) Adjudicación y firma de contrato con 3 empresas contratistas para la construcción de 31 USF (25 rehabilitadas y 6 nuevas), y orden de inicio del proceso; ii) provisión de equipamiento para contribuir al fortalecimiento de 18 puntos del Servicio de Atención al Usuario (SAU) y gestiones para el avance en los procesos de adquisición de equipamiento, tanto médico como TIC para Unidades de Salud Familiar (USF) y otras dependencias ministeriales; iii) el curso de capacitación y actualización a médicos no intensivistas en manejo de COVID, se encuentra en proceso de evaluación ofertas para contratación firma consultora, y se cuentan con otros avances en los trámites preliminares para los llamados a los cursos de: capacitación en Líneas de Cuidados, y gestión de salud a nivel regional y local.

Se ha trabajado en el desarrollo de una estrategia complementaria a la capacitación dirigida a las (7) Regiones Sanitarias donde participaron 1.132 profesionales de 283 USF.

Se encuentra en proceso la solicitud de autorización del llamado a manifestación de interés para la capacitación en Líneas de Cuidados.


En lo referente al componente de Respuesta a la emergencia COVID-19 se llevaron a cabo actividades de: i) Ambulancias, en etapa de ejecución de contrato; ii) Medicamentos (CVE), en etapa de pago final; iii) Medicamentos (LPI), adjudicado el 12/08/2022 y en proceso de firma de contratos con las empresas proveedoras; iv) Plantas de oxígeno (LPI), en etapa de inicio de llamado (19/08/2022); v) Gases médicos (LPN) adjudicado vía Resolución de Adjudicación, en proceso de ejecución de contrato; vi) Accesorios para ventiladores pulmonares; y vii) Equipos de Terapia Intensiva (LPI) ambas en etapa de aprobación de Especificaciones Técnicas.





<b>Proyecto</b>	Mejoramiento de la calidad de atención de los estab. MSPBS		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		
<b>Código SNIP N°</b>	887		
<b>Financiamiento</b>	REPÚBLICA DE CHINA		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	14.992.733	<b>GS.</b> 303.977.502.722
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
85.509.606.112	218.467.896.610		28,13 %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
11/08/2020	11/08/2022		N/A
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
29 %		83 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
212.494.969.776	34.220.010.465	16,10 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

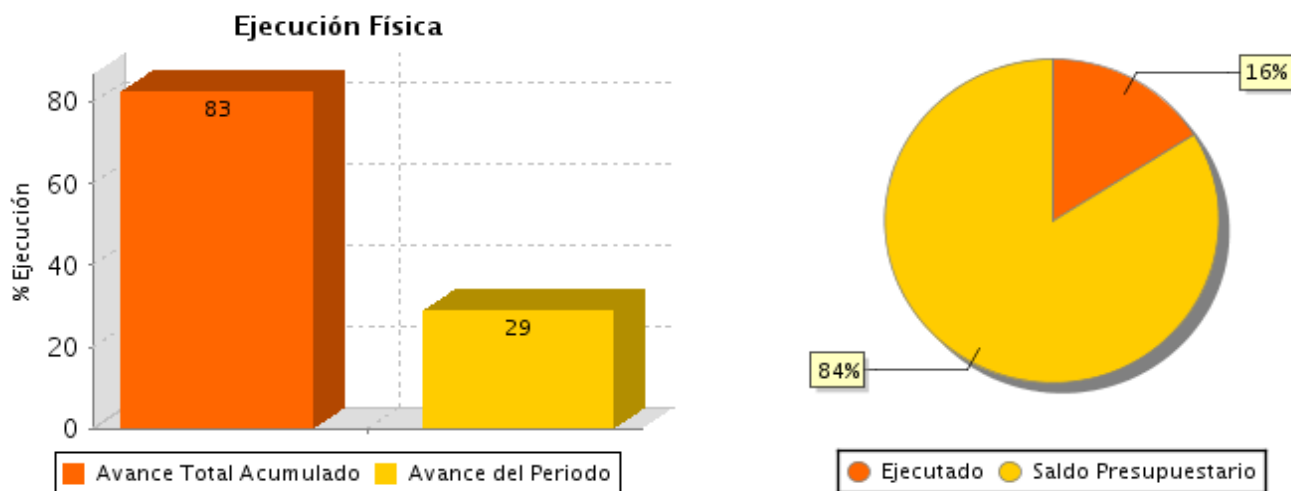

### SITUACIÓN ACTUAL



La Unidad Ejecutora informó que durante el segundo cuatrimestre se registraron avances importantes en sus actividades planificadas, entre las que se puede destacar la inauguración de la obra de infraestructura y su correspondiente equipamiento en el Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu". En cuanto a la provisión de equipamiento médico, la correspondiente al Hospital del Trauma se encuentran en la etapa de evaluación de ofertas y la del Hospital de Itaguá en etapa de adjudicación. En lo referente al equipamiento para el Desarrollo del Sistema Informático de Salud (HIS), se encuentra con tres (3) llamados en curso cuya conclusión esta prevista para finales del presente año. Los fondos para el componente de compra de vacunas fueron redireccionados a otras entidades beneficiarias con la Cooperación China-Taiwán.





<b>Proyecto</b>	Equipamiento Equip. Contenc y Apoyo a los Serv. de Salud		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		
<b>Código SNIP N°</b>	915		
<b>Financiamiento</b>	BIRF, CAF		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	20.000.000	<b>GS.</b> 829.999.998.500
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
771.604.668.068	58.395.330.432		92,96 %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
26/03/2020	26/03/2022		N/A
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
0 %		89 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
201.545.631.793	170.654.695.462	84,67 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

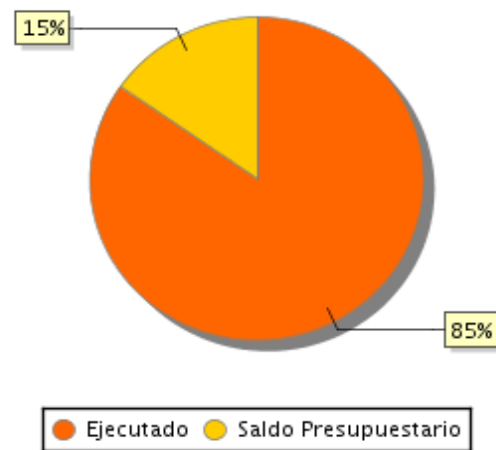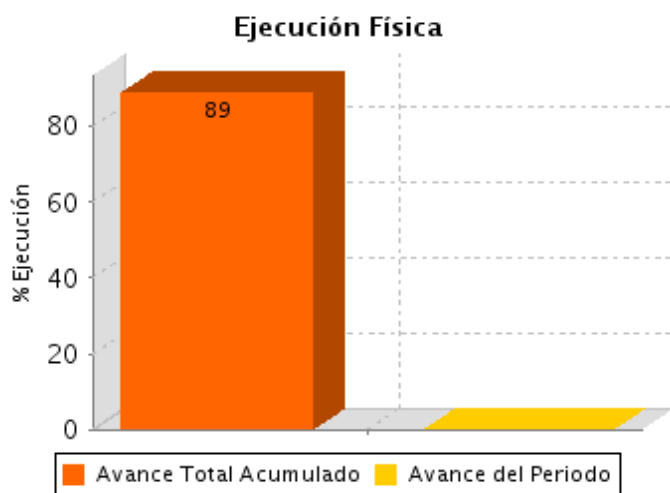

### SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre el proyecto se encuentra en etapa de cierre y se están realizando las últimas gestiones conforme a la planificación inicial como son distribución total de los insumos adquiridos mediante el acuerdo de adquisiciones de bienes e insumos entre el MSPBS y la UNOPS y contratación de empresa consultora que se encargará de la auditoría externa financiera del proyecto. Así también se informó que se ha realizado un proceso de compra de insumos y equipamientos médicos los cuales serán distribuidos en establecimientos de salud que atienden a la población afectada con enfermedades respiratorias.
