



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL


Mayo - Agosto 2023

 Sistema Nacional
de Inversión
Pública



| | | | |
|--|---|--------------------------------|----------------------------|
| Proyecto | SP ABAST.DE AGUA. POT.Y SAN.BAS PEQ.COM.RURAL E INDI(FOCEM) | | |
| OEE | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | | |
| Código SNIP N° | 50 | | |
| Financiamiento | FOCEM, LOCAL | | |
| Costo del Proyecto | USD | 39.470.702 | GS. 104.732.692.220 |
| Avance Financiero en Gs. | Saldo Financiero en Gs. | Porcentaje de Ejecución | |
| 37.739.275.445 | 66.993.416.775 | 36,03 % | |
| Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Fecha de Prórroga | |
| 16/05/2008 | 16/05/2013 | 31/12/2024 | |
| Ubicación Geográfica del Proyecto | | | |
| Nacional | N/A | | |
| Avance Físico Reportado del Periodo | Avance Físico Acumulado Total | | |
| 0 % | 93 % | | |
| PGN Vigente en Gs. | Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023 | Porcentaje Ejecutado | |
| 13.699.663.450 | 551.317.434 | 4,02 % | |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

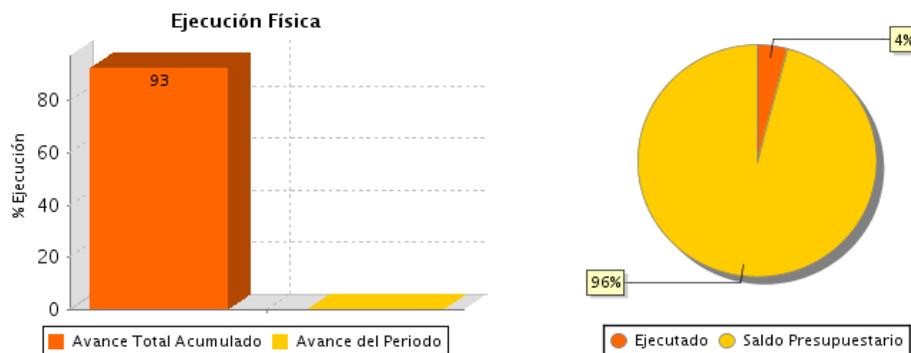


SITUACIÓN ACTUAL

El avance físico registrado en el segundo periodo cuatrimestral del proyecto es el siguiente: Componente 1: correspondiente a las actividades de "Ejecución de Obras de 60 Sistemas de Agua Potable para pequeñas Comunidades" y "Fiscalización de Obras de 60 Sistemas de Agua Potable para pequeñas Comunidades", la culminación del pozo N° 4 sigue en ejecución, esta pendiente el equipamiento de la caseta para finalizar el sistema de agua.

Componente 3: correspondiente a la actividad 1 "Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial para la ciudad de Iturbe" y actividad 2 "Fiscalización del Sistema de alcantarillado sanitario condominial para la ciudad de Iturbe", la ejecución de las obras y la fiscalización registra un avance del 0% para el presente periodo. El motivo del retraso se debe a que sigue en trámite la adenda por menores y mayores cantidades, por lo que las obras estan paralizadas. Actividad 4 - "Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial para la ciudad de Caazapá" y actividad 5 "Fiscalización del Sistema de alcantarillado sanitario condominial para la ciudad de Caazapá", para el presente cuatrimestre el avance sigue siendo 0. Está pendiente la realizacion del nuevo llamado para culminar las obras de Caazapá (Red y Planta) cuyo pliego está supeditado al informe final de la Consultora. Referente a la actividad 6 "Servicio de consultoría para readeacuación, ajuste, ampliación y actualización de diseño ejecutivo de redes colectoras y planta de tratamiento de desagüe cloacal para la ciudad de Caazapá", no hubo avance debido a que siguen suspendidos los trabajos por parte de la consultora, por la falta del finiquito de los documentos para el predio de la estación de bombeo.

| | | | |
|--|---|--------------------------------|---------------------------|
| Proyecto | Investigación ,Educ. y Biotecnología Aplicadas a la Salud | | |
| OEE | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | | |
| Código SNIP N° | 153 | | |
| Financiamiento | FOCEM, LOCAL | | |
| Costo del Proyecto | USD | 3.011.806 | GS. 23.794.443.236 |
| Avance Financiero en Gs. | Saldo Financiero en Gs. | Porcentaje de Ejecución | |
| 15.343.469.196 | 8.450.974.040 | 64,48 % | |
| Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Fecha de Prórroga | |
| 20/12/2011 | 20/12/2014 | 31/12/2023 | |
| Ubicación Geográfica del Proyecto | | | |
| Internacional | Argentina, Brasil, Paraguay | | |
| Avance Físico Reportado del Periodo | Avance Físico Acumulado Total | | |
| 6 % | 82 % | | |
| PGN Vigente en Gs. | Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023 | Porcentaje Ejecutado | |
| 7.099.565.514 | 678.558.422 | 9,56 % | |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

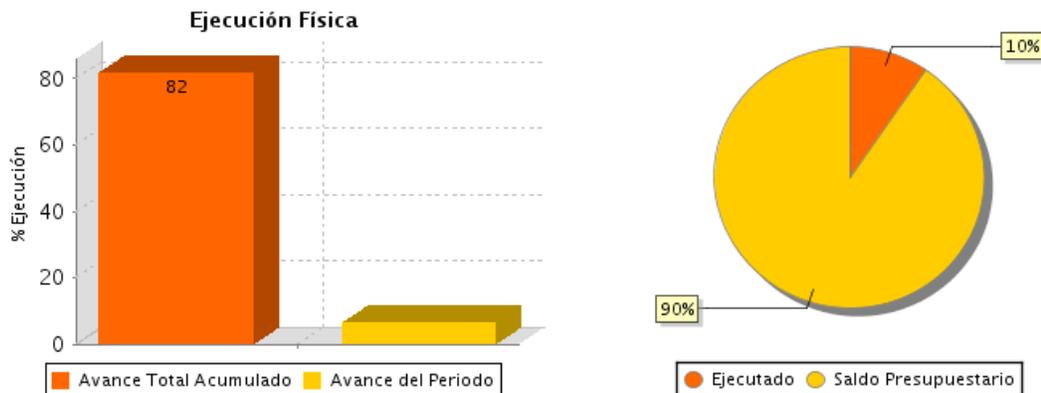


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informó que en el presente cuatrimestre la construcción del Laboratorio de Biotecnología se encuentra en etapa de recepción provisoria. Por otro lado, la Licitación Pública Nacional N° 92/2022 "De Reactivos e insumos" se encuentra adjudicada y procesada para su posterior obligación. En cuanto al llamado de equipos de oficina, el mismo fue adjudicado por convenio marco Tienda Virtual. Tres pasantes bioquímicos investigadores del doctorado realizaron pasantía en los meses de mayo a agosto en La Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Brasil, para poder culminar sus trabajos de doctorados. El Llamado a Licitación Pública Internacional 02/2023 para adquisición de equipos de laboratorio se encuentra en etapa de convocatoria en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|----------------------------|
| Proyecto | Construcción Sist.AguaPot.y.San.Peq.Ciud.Com.Rural.e.Indig. | | |
| OEE | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | | |
| Código SNIP N° | 555 | | |
| Financiamiento | BID, GOBIERNO ESPAÑOL | | |
| Costo del Proyecto | USD | 60.000.000 | GS. 336.000.000.000 |
| Avance Financiero en Gs. | Saldo Financiero en Gs. | Porcentaje de Ejecución | |
| 262.454.059.614 | 73.545.940.386 | 78,11 % | |
| Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Fecha de Prórroga | |
| 28/08/2018 | 28/08/2024 | N/A | |
| Ubicación Geográfica del Proyecto | | | |
| Nacional | N/A | | |
| Avance Físico Reportado del Periodo | | Avance Físico Acumulado Total | |
| 0 % | | 62 % | |
| PGN Vigente en Gs. | Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023 | Porcentaje Ejecutado | |
| 94.701.386.141 | 39.719.146.982 | 41,94 % | |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

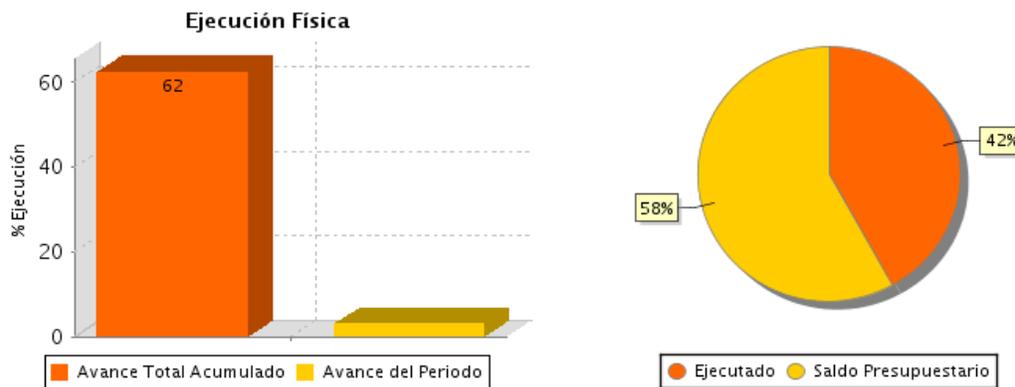


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| Proyecto | Mejoramiento Fort. y Apoyo Integral a los Serv de Salud Pub | | |
| OEE | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | | |
| Código SNIP N° | 773 | | |
| Financiamiento | FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY 4758/12 | | |
| Costo del Proyecto | USD | N/A | GS. 2.350.000.000.000 |
| Avance Financiero en Gs. | Saldo Financiero en Gs. | | Porcentaje de Ejecución |
| 1.289.296.655.519 | 1.060.703.344.481 | | 54,86 % |
| Fecha de Inicio | Fecha de Fin | | Fecha de Prórroga |
| 31/07/2017 | 31/12/2023 | | N/A |
| Ubicación Geográfica del Proyecto | | | |
| Nacional | N/A | | |
| Avance Físico Reportado del Periodo | | Avance Físico Acumulado Total | |
| 4,62 % | | 33,04 % | |
| PGN Vigente en Gs. | Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023 | | Porcentaje Ejecutado |
| 555.661.303.324 | 313.636.641.237 | | 56,44 % |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

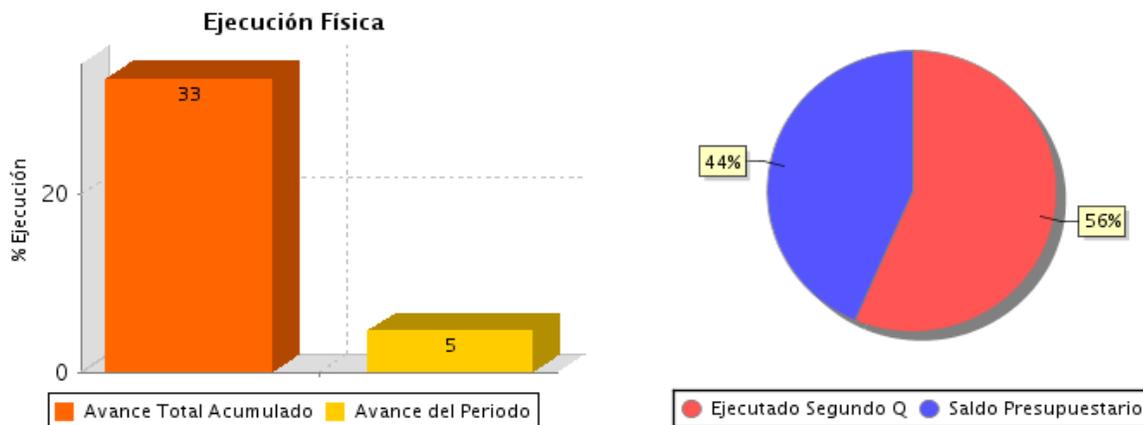


SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre se avanzó en el Componente 3: con la adquisición de productos e instrumentos químicos, farmacéuticos y medicinales. Se adquirieron también insecticidas, fumigantes, tintas, pinturas y colorantes para uso institucional, siendo estos distribuidos a diferentes dependencias del MSPBS.
En relación a los Componentes 1,2 y 4: no se registraron avances a la fecha.

| | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Proyecto | | Construcción Fortalecimiento de Atención Primaria en Salud | | | |
| OEE | | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | | | |
| Código SNIP N° | | 805 | | | |
| Financiamiento | | BIRF | | | |
| Costo del Proyecto | | USD | 115.000.000 | GS. | 828.235.039.928 |
| Avance Financiero en Gs. | | Saldo Financiero en Gs. | | Porcentaje de Ejecución | |
| 321.093.993.849 | | 507.141.046.079 | | 38,77 % | |
| Fecha de Inicio | | Fecha de Fin | | Fecha de Prórroga | |
| 26/03/2020 | | 26/03/2026 | | N/A | |
| Ubicación Geográfica del Proyecto | | | | | |
| Departamental | Amambay, Central, Cordillera, Paraguari | | | | |
| Avance Físico Reportado del Período | | | Avance Físico Acumulado Total | | |
| 34 % | | | 82 % | | |
| PGN Vigente en Gs. | | Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023 | | Porcentaje Ejecutado | |
| 233.966.226.355 | | 94.931.888.421 | | 40,58 % | |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

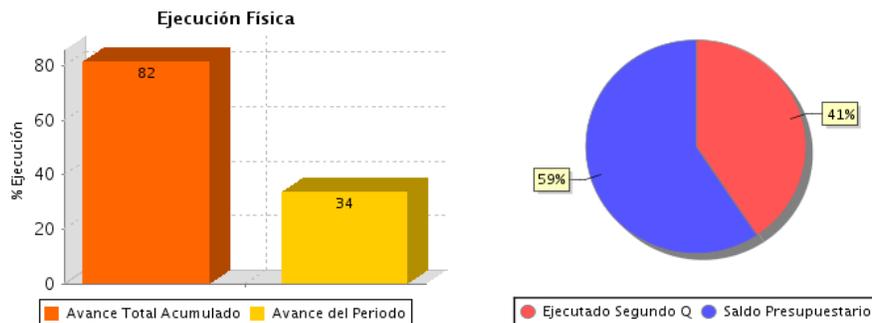

SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre se detallan los siguientes avances por componentes:

Componente 1: (Obras) 1er Grupo de obras (31 USF): Lote 1: avance físico promedio 58%; Lote 2: 60%; Lote 3: 42%; y Lote 4: 71%. Para los grupos 2,3,4,5 fueron adjudicados y con avance de anticipo del 10%. (Equipamiento) TIC para 345 USF existentes, y (ii) TIC para 31 USF fueron completados con anterioridad a la programación prevista.

(Capacitación) Curso sobre Líneas de Cuidado, y en revisión su Plan de Trabajo. (ii) Curso en Gestión sobre financiamiento basado en resultados, en etapa de evaluación de ofertas. (iii) Curso capacitación a médicos no intensivistas en etapa de negociación de contrato. (iv) Servicio de logística en gestión Resolución de aprobación inicio de llamado. (Fortalecimiento Institucional) Apoyo al C2; (ii) Estrategia de Comunicación y (iii) Diseño gráfico, en ejecución de contrato. (iv) Proceso SICIAP declarado desierto, en gestión su Resolución para volver a llamar con cambio de modalidad de adquisición. (v) INTRANET en gestión de adjudicación con pedido de Resolución. (vi) Sistema de Quejas y Reclamos en convocatoria publicada en el portal DNCP.

Componente 2: Las transferencias 2° y 3° cuatrimestre 2022 a 94 CLS. Recibidas y aprobadas rendiciones de cuentas de 60 Consejos Locales de Salud (CLS).


Componente 3: Elaborado, presentado y aprobado por el Banco Mundial (BM) un Plan de Priorización y de Acción con 4 ejes: (i) priorización de procesos de adquisición; (ii) fortalecimiento de la UEP en áreas claves; (iii) coordinación con el MSPBS con énfasis en procesos de pagos; y (iv) monitoreo. Están realizándose las actividades conforme al Plan.

Están priorizadas las líneas de adquisición; fueron incorporaciones especialistas en áreas claves (adquisiciones y finanzas); se está trabajando con la DGAF para la mejora de los tiempos. Actualización y consulta de documentos estratégicos como el Marco de Planificación y el Plan de Pueblos Indígenas (MPPI) y (PPI) 2022-2024, con el Consejo Nacional de Salud de Pueblos Indígenas (CONASAPI). Además, desarrollo de acciones de Consulta para el consentimiento, libre, previo e informado con las Comunidades Indígenas participantes en los procesos de construcción de USF, con acompañamiento del INDI para el cumplimiento con el Protocolo 1039/18.

Componente 4: Equipos de Terapia Intensiva con llamado abierto y en gestión para realizar una adenda al PBC; (ii) Plantas de oxígeno en proceso de cierre del informe de evaluación de ofertas.

| | | | | |
|--|---|------------|--------------------------------------|-----------------|
| Proyecto | Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de Salud | | | |
| OEE | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | | | |
| Código SNIP N° | 855 | | | |
| Financiamiento | BID | | | |
| Costo del Proyecto | USD | 45.000.000 | GS. | 279.000.000.620 |
| Avance Financiero en Gs. | Saldo Financiero en Gs. | | Porcentaje de Ejecución | |
| 0 | 279.000.000.620 | | 0,00 % | |
| Fecha de Inicio | Fecha de Fin | | Fecha de Prórroga | |
| 24/4/2023 | 24/4/2029 | | N/A | |
| Ubicación Geográfica del Proyecto | | | | |
| Nacional | N/A | | | |
| Avance Físico Reportado del Periodo | | | Avance Físico Acumulado Total | |
| 0 % | | | 0 % | |
| PGN Vigente en Gs. | Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023 | | Porcentaje Ejecutado | |
| 10.613.938.629 | 0 | | 0,00 % | |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

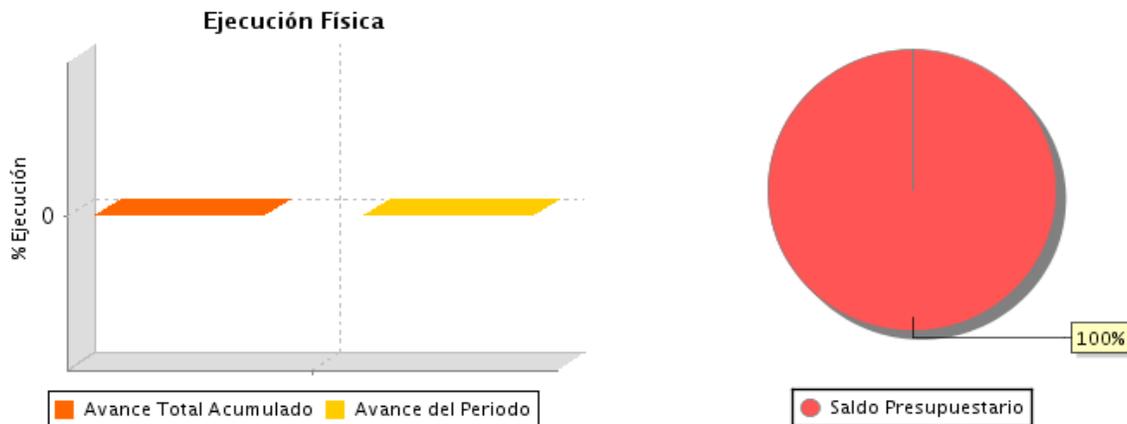


SITUACIÓN ACTUAL

Este proyecto es nuevo y en el presente cuatrimestre se están realizando las gestiones correspondientes para la conformación de la Unidad y obtener la elegibilidad por parte del BID. Posterior a ello, se procederá al desembolso de los recursos del préstamo.

| | | | | | |
|--|-----|--|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Proyecto | | Mejoramiento de la calidad de atención de los estab. MSPBS | | | |
| OEE | | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | | | |
| Código SNIP N° | | 887 | | | |
| Financiamiento | | REPÚBLICA DE CHINA | | | |
| Costo del Proyecto | | USD | 14.992.733 | GS. | 190.699.623.258 |
| Avance Financiero en Gs. | | Saldo Financiero en Gs. | | Porcentaje de Ejecución | |
| 146.200.756.654 | | 44.498.866.604 | | 76,67 % | |
| Fecha de Inicio | | Fecha de Fin | | Fecha de Prórroga | |
| 11/08/2020 | | 11/08/2022 | | 11/12/2023 | |
| Ubicación Geográfica del Proyecto | | | | | |
| Nacional | N/A | | | | |
| Avance Físico Reportado del Periodo | | | Avance Físico Acumulado Total | | |
| 28,5 % | | | 90,2 % | | |
| PGN Vigente en Gs. | | Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023 | | Porcentaje Ejecutado | |
| 62.551.315.038 | | 29.841.228.100 | | 47,71 % | |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

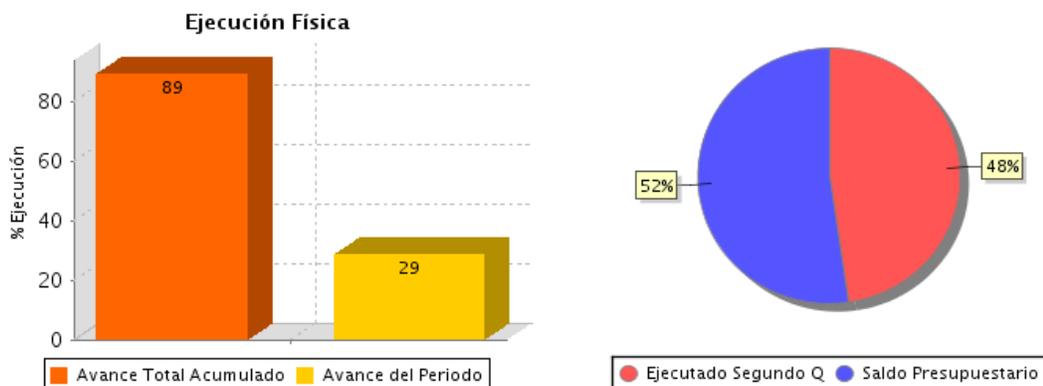

SITUACIÓN ACTUAL

Las actividades del Componente 1 ya concluyeron, queda pendiente un pago a la constructora adjudicada para la obra. Esto debido a que hubo un "reajuste" en los precios debido a las últimas subas de tarifa de la materia prima. Ante tal situación, la constructora se comprometió a presentar los comprobantes correspondientes para proseguir con los trámites financieros pertinentes.


Es importante resaltar que los procesos licitatorios del Componente 2, para compra de equipamiento para Establecimientos de Salud del MSPBS, fueron concluidas satisfactoriamente, quedando pendiente la entrega de algunos equipos por parte de las empresas y las cancelaciones correspondientes de obligados.

En cuanto al Componente 3, el equipamiento del Sistema Informático de Salud (HIS) tiene avance en la totalidad de los procesos licitatorios, quedando pendiente algunos entregables y cancelación de las obligaciones asumidas en el marco de este proyecto.

Como ya se menciona en otros informes, los Componentes 4 y 5 no registran avances ya que fueron redireccionados los fondos conforme a las necesidades de la Institución.

| | | | |
|--|--|--------------------------------|----------------------------|
| Proyecto | Equipamiento Equip. Contenc y Apoyo a los Serv. de Salud | | |
| OEE | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | | |
| Código SNIP N° | 915 | | |
| Financiamiento | BIRF, CAF | | |
| Costo del Proyecto | USD | 20.000.000 | GS. 829.999.998.500 |
| Avance Financiero en Gs. | Saldo Financiero en Gs. | Porcentaje de Ejecución | |
| 795.822.376.886 | 34.177.621.614 | 95,88 % | |
| Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Fecha de Prórroga | |
| 26/03/2020 | 26/03/2022 | 31/12/2023 | |
| Ubicación Geográfica del Proyecto | | | |
| Nacional | N/A | | |
| Avance Físico Reportado del Periodo | Avance Físico Acumulado Total | | |
| 0 % | 89 % | | |
| PGN Vigente en Gs. | Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023 | Porcentaje Ejecutado | |
| 5.550.000.000 | 4.360.056.625 | 78,56 % | |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

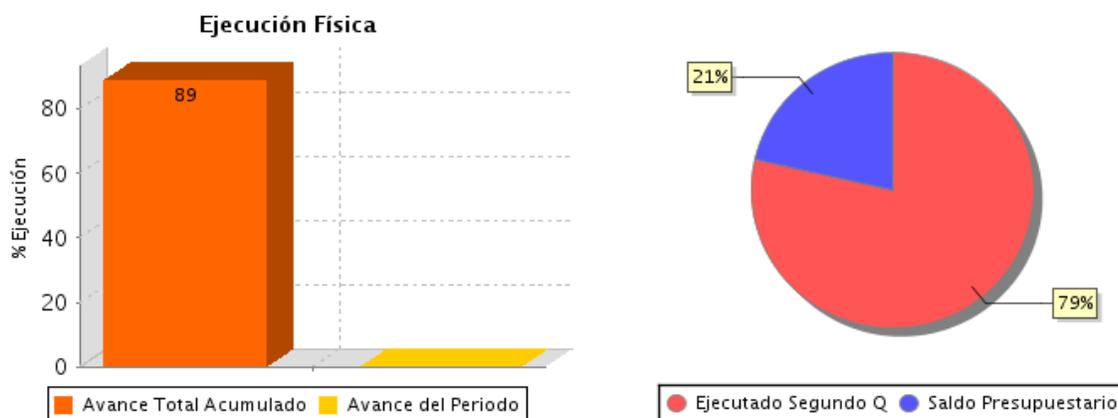

SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto concluyó en el mes de febrero 2023. En el mes de agosto, se realizó el pago correspondiente a la consultora adjudicada para la realización de la auditoría externa, por un valor total de Gs. 148.000.000. Cabe mencionar que queda pendiente la devolución de los fondos no utilizados a la cuenta informada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), una vez realizada la rendición de los gastos de la Auditoría Externa Financiera del Proyecto.
