



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Setiembre – Diciembre 2021

 *Sistema Nacional
de Inversión
Pública*






| | | | |
|---------------------------------|--|---|--|
| Proyecto | Construcción de Espacios Físicos y Equipamientos para Centros Recreativos y Aprendizaje. | | |
| OEE | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS | | |
| Código SNIP N° | 127 | | |
| Financiamiento | GOBIERNO ESPAÑOL | | |
| Costo del Proyecto | USD | 0 | GS. 48.330.000.000 |
| Avance Financiero en Gs. | Saldo Financiero en Gs. | | Porcentaje de Ejecución |
| 37.871.325.308 | 10.458.674.692 | | 78,36 % |
| Fecha de Inicio | Fecha de Fin | | Fecha de Prórroga |
| 16/07/2008 | 16/07/2012 | | Con respecto a la fecha de fin, en la Ley N° 3546/08, en el Art.8 inc. 1, se establece que..." los fondos de los recursos tendran vigencia hasta el agotamiento de los saldos" |

Ubicación del Proyecto

Alcance Nacional

| | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| Avance Físico Reportado del Periodo | Avance Físico Acumulado Total | |
| 0,50% | 10,68 % | |
| PGN Vigente en Gs. | Ejecución en Gs. al 31/12/2021 | Porcentaje Ejecutado |
| 16.053.107.467 | 1.590.434.989 | 9,91 % |

Ejecución Física

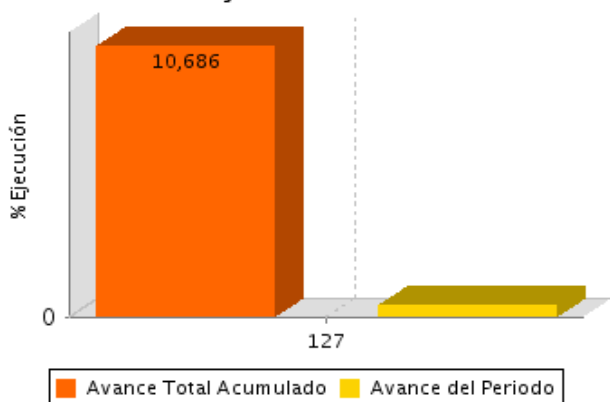

Ejecución Presupuestaria



SITUACIÓN ACTUAL

En el tercer cuatrimestre de 2021 los llamados realizados se declararon desiertos .Actualmente, se están mejorando las especificaciones técnicas de los llamados a fin de lanzar dichos procesos y adjudicar para el 2022. Por otro lado se realizó la regularización contable de los pagos directos efectuados por la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) de las obras concluidas en el marco del Contrato N° 01/2015, en 25 Institutos de Formación Docente (I.F.D), dicho proceso se realizó para activar patrimonialmente las obras dentro de los activos del M.E.C.



TETÁ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP py
Sistema Nacional de Inversión Pública


| | | | | |
|---------------------------------|---|------------|--------------------------------|-----------------|
| Proyecto | Ampliación y Reposición en 822 Establecimientos Educativos de Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del País. | | | |
| OEE | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS | | | |
| Código SNIP N° | 325 | | | |
| Financiamiento | Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest. | | | |
| Costo del Proyecto | USD | 42.791.803 | GS. | 771.131.114.798 |
| Avance Financiero en Gs. | Saldo Financiero en Gs. | | Porcentaje de Ejecución | |
| 463.976.543.506 | 307.154.571.292 | | 60,17% | |
| Fecha de Inicio | Fecha de Fin | | Fecha de Prórroga | |
| 11/09/2014 | 11/09/2017 | | 30/06/2023 | |

Ubicación del Proyecto

Alcance Nacional

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Avance Físico Reportado del Periodo | | Avance Físico Acumulado Total | |
| 1,201% | | 99,63% | |
| PGN Vigente en Gs. | Ejecución en Gs. al 31/12/2021 | Porcentaje Ejecutado | |
| 160.741.838.427 | 51.361.826.101 | 31,95% | |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

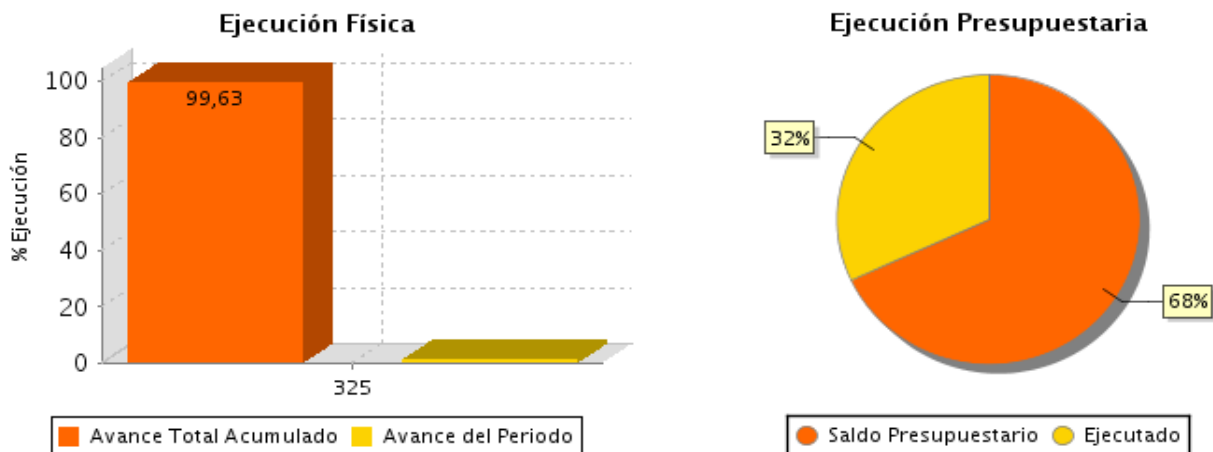

SITUACIÓN ACTUAL

En el tercer cuatrimestre de 2021 se suscribió el Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), para realizar la fiscalización de obras de la LPN/SBE N° 02/2020 "Construcciones, Ampliaciones, Reparaciones y Terminaciones de 272 establecimientos educativos ID N° 360.254. Se equiparon con mobiliarios (Escritorios, sillas, mesas, estantes), 482 establecimientos educativos en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera y Central.



TETÁ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP py
Sistema Nacional de Inversión Pública


| | | | |
|---------------------------------|---|-----|--------------------------------|
| Proyecto | Ampliación y Reposición en 108 Establecimientos Educativos de Asunción y 10 Departamentos Geográficos del País. | | |
| OEE | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS | | |
| Código SNIP N° | 326 | | |
| Financiamiento | Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest. | | |
| Costo del Proyecto | USD | N/A | GS. 76.120.825.486 |
| Avance Financiero en Gs. | Saldo Financiero en Gs. | | Porcentaje de Ejecución |
| 42.671.673.298 | 33.449.152.188 | | 56,06% |
| Fecha de Inicio | Fecha de Fin | | Fecha de Prorroga |
| 14/08/2014 | 14/08/2015 | | 31/12/2022 |

Ubicación del Proyecto

Alcance Nacional

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Avance Físico Reportado del Periodo | | Avance Físico Acumulado Total | |
| 0,14% | | 98,56% | |
| PGN Vigente en Gs. | Ejecución en Gs. al 31/12/2021 | Porcentaje Ejecutado | |
| 5.642.173.873 | 2.179.203.477 | 38,62% | |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

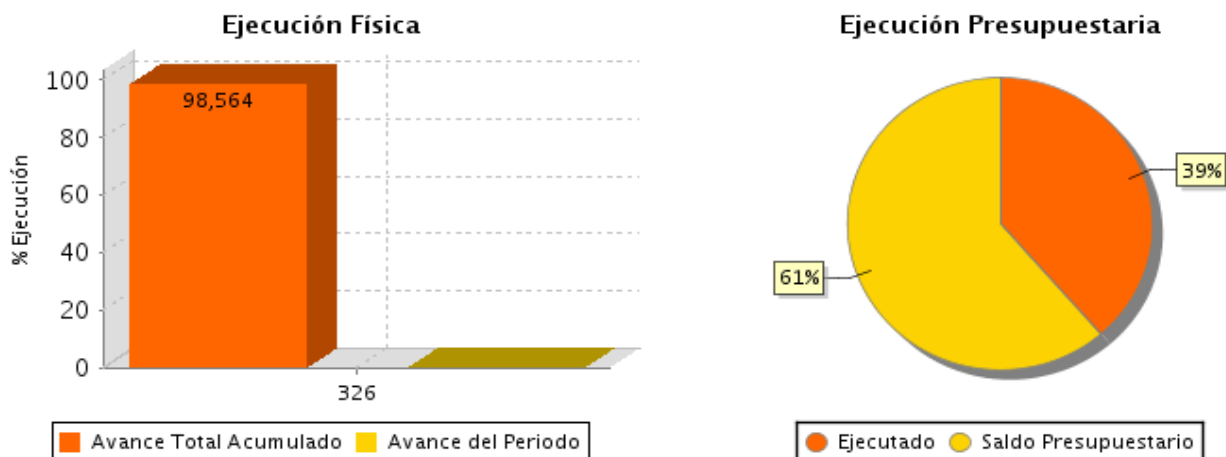

SITUACIÓN ACTUAL

En el tercer cuatrimestre del 2021 se contrataron a 3 supervisores de obras para realizar trabajos de coordinación de infraestructura en los establecimientos educativos. Por otra parte, se produjo el incumplimiento de los contratos con la Empresa Estructura Ingeniería S.A., lo que motivó la rescisión contractual para realizar la fiscalización de las obras.




| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|
| Proyecto | Capacitación a los Educadores de todos los Niveles y Modalidades | | |
| OEE | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS | | |
| Código SNIP N° | 387 | | |
| Financiamiento | Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest. | | |
| Costo del Proyecto | USD | 49.227.737 | GS. 494.033.265.681 |
| Avance Financiero en Gs. | Saldo Financiero en Gs. | Porcentaje de Ejecución | |
| 163.523.662.090 | 330.509.603.591 | 33,10% | |
| Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Fecha de Prórroga | |
| 30/12/2014 | 30/06/2018 | 31/12/2022 | |

Ubicación Geográfica del Proyecto

Alcance Nacional

| | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| Avance Físico Reportado del Periodo | Avance Físico Acumulado Total | |
| 2,84% | 77,15% | |
| PGN Vigente en Gs. | Ejecución en Gs. al 31/12/2021 | Porcentaje Ejecutado |
| 80.604.392.533 | 13.331.988.240 | 16,54% |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

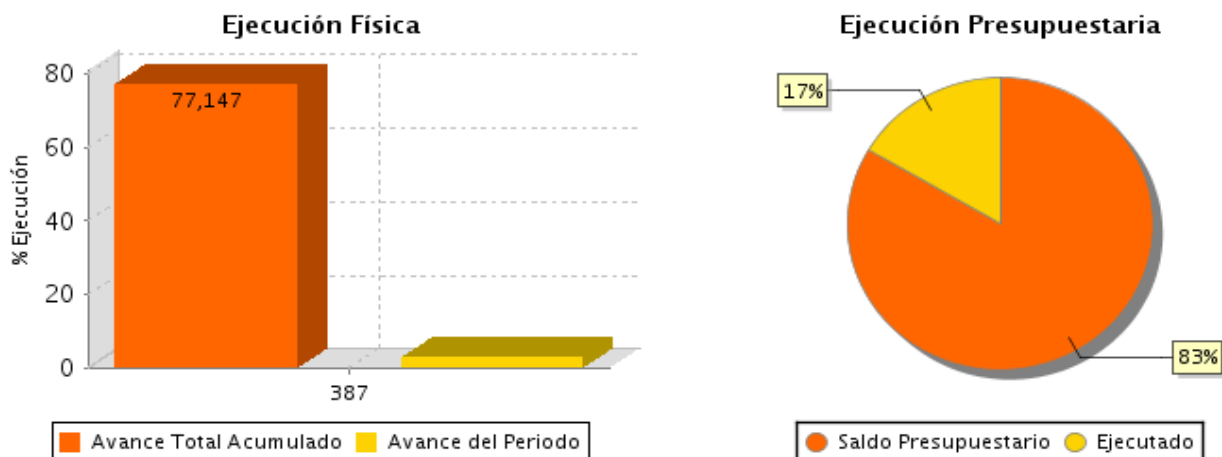

SITUACIÓN ACTUAL

Se encuentra en etapa de culminación el curso de formación en planificación, monitoreo y evaluación educativa, dirigido a 2000 gestores educativos a nivel país. Finalizaron los cursos de formación a 6000 coordinadores pedagógicos de educación escolar básica en centros de formación docente, y el curso de actualización y especialización para 1000 docentes de los niveles de bachillerato técnico, científico, educación permanente, plurigrado, multigrado, como así también el curso de técnico docente con un total de 1690 capacitados.




| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|
| Proyecto | Ampliación en la Atención Educacional desde la Gestación hasta 5 años. | | |
| OEE | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS | | |
| Código SNIP N° | 388 | | |
| Financiamiento | Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest. | | |
| Costo del Proyecto | USD | 35.931.322 | GS. 578.179.234.493 |
| Avance Financiero en Gs. | Saldo Financiero en Gs. | Porcentaje de Ejecución | |
| 237.088.012.248 | 341.091.222.245 | 41,01% | |
| Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Fecha de Prórroga | |
| 24/05/2015 | 31/12/2018 | 31/03/2022 | |

Ubicación Geográfica del Proyecto

Alcance Nacional

| | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| Avance Físico Reportado del Periodo | Avance Físico Acumulado Total | |
| 9,46% | 75,57% | |
| PGN Vigente en Gs. | Ejecución en Gs. al 31/12/2021 | Porcentaje Ejecutado |
| 112.074.158.060 | 60.166.071.731 | 53,68% |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

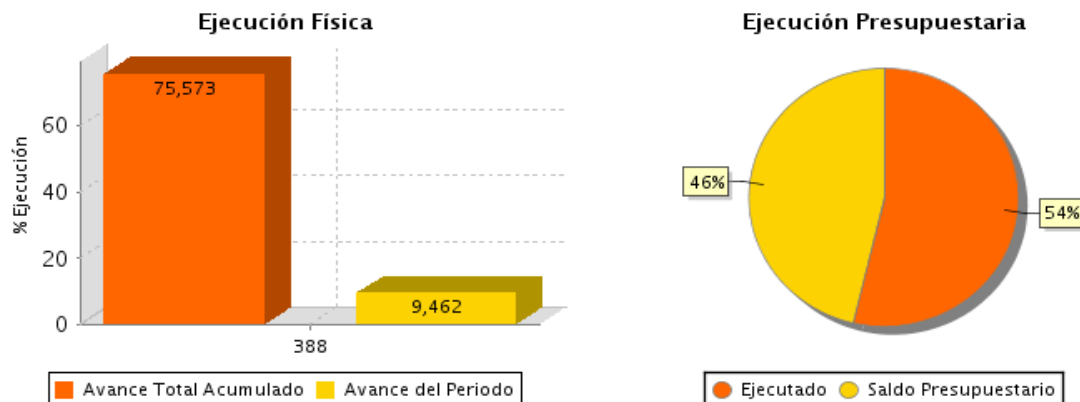


SITUACIÓN ACTUAL

En el tercer cuatrimestre de 2021 se culminaron 118 obras de construcciones de espacios educativos y 10 espacios de desarrollo infantil. Se revisó y ajustó un material para docentes y educadoras comunitarios de primera infancia indígena y un cuadernillo para niños de pre jardín y jardín para instituciones indígenas. Se realizó un análisis participativo de validación de materiales para docentes y niños de 3 y 4 años, con 70 participantes en los departamentos de Caaguazú y Boquerón. Se adjudicó una firma consultora para la evaluación del programa. Se equiparon 370 espacios educativos con mobiliarios y 124 instituciones educativas con parques infantiles. Se instalaron 326 parques infantiles. Se realizaron llamados para adquisición de materiales didácticos y kit de textos. Se realizaron de talleres presenciales en los departamentos de: Alto Paraná, Guairá, Caazapá, Cordillera, Canindeyú, San Pedro, Misiones y Concepción. Además de talleres en la modalidad virtual, y mesas de trabajos en los distintos departamentos del país. Se contrataron 658 docentes titulares, auxiliares, maestras mochileras, psicólogos de educación inicial.



| | | | |
|--|---|--------------------------------------|----------------------------|
| Proyecto | Investigación, Evaluación Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes | | |
| OEE | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS | | |
| Código SNIP N° | 389 | | |
| Financiamiento | Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest. | | |
| Costo del Proyecto | USD | 12.854.499 | GS. 122.232.616.625 |
| Avance Financiero en Gs. | Saldo Financiero en Gs. | Porcentaje de Ejecución | |
| 54.525.797.603 | 67.706.819.022 | 44,61% | |
| Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Fecha de Prórroga | |
| 30/12/2014 | 30/12/2021 | 30/07/2023 | |
| Ubicación Geográfica del Proyecto | | | |
| Alcance Nacional | | | |
| Avance Físico Reportado del Periodo | | Avance Físico Acumulado Total | |
| 8,25% | | 82,91% | |
| PGN Vigente en Gs. | Ejecución en Gs. al 31/12/2021 | Porcentaje Ejecutado | |
| 2.864.671.997 | 2.018.430.439 | 70,46% | |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

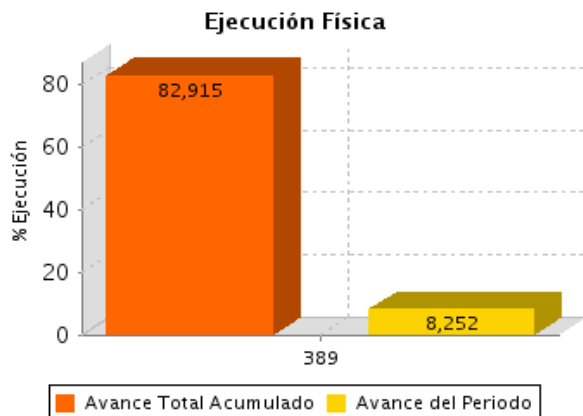

SITUACIÓN ACTUAL

En el tercer cuatrimestre del 2021 se realizaron actividades de divulgación de los resultados de las pruebas estandarizadas. Para las evaluaciones internacionales, se realizaron eventos de presentación de los resultados, con la participación de 417 actores educativos del MEC y un seminario denominado "Desafíos para el uso de los resultados en la mejora educativa". Se realizó el entrenamiento a 6 técnicos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Paraguay, (INEEP) para la preparación de la Aplicación Principal PISA 2022, a través de diferentes webinars, 706 jóvenes de 28 instituciones educativas participaron de la aplicación piloto. En lo referente al Cuarto Estudio Regional Comparativo y Explicativo, se realizó la presentación del informe regional por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), en el mes de noviembre de 2021 y los resultados nacionales fue presentados por el MEC.




| | | | |
|---------------------------------|---|-----|--------------------------------|
| Proyecto | Mejoramiento de Condiciones de Aprendizaje con Incorporación de TIC | | |
| OEE | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS | | |
| Código SNIP N° | 394 | | |
| Financiamiento | Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest. | | |
| Costo del Proyecto | USD | N/A | GS. 658.739.694.799 |
| Avance Financiero en Gs. | Saldo Financiero en Gs. | | Porcentaje de Ejecución |
| 342.584.323.794 | 316.155.371.005 | | 52,01% |
| Fecha de Inicio | Fecha de Fin | | Fecha de Prórroga |
| 25/11/2015 | 25/12/2019 | | 30/06/2023 |

Ubicación Geográfica del Proyecto

Alcance Nacional

| | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| Avance Físico Reportado del Periodo | Avance Físico Acumulado Total | |
| 6,30% | 49,79% | |
| PGN Vigente en Gs. | Ejecución en Gs. al 31/12/2021 | Porcentaje Ejecutado |
| 252.008.708.291 | 190.888.709.111 | 75,75% |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

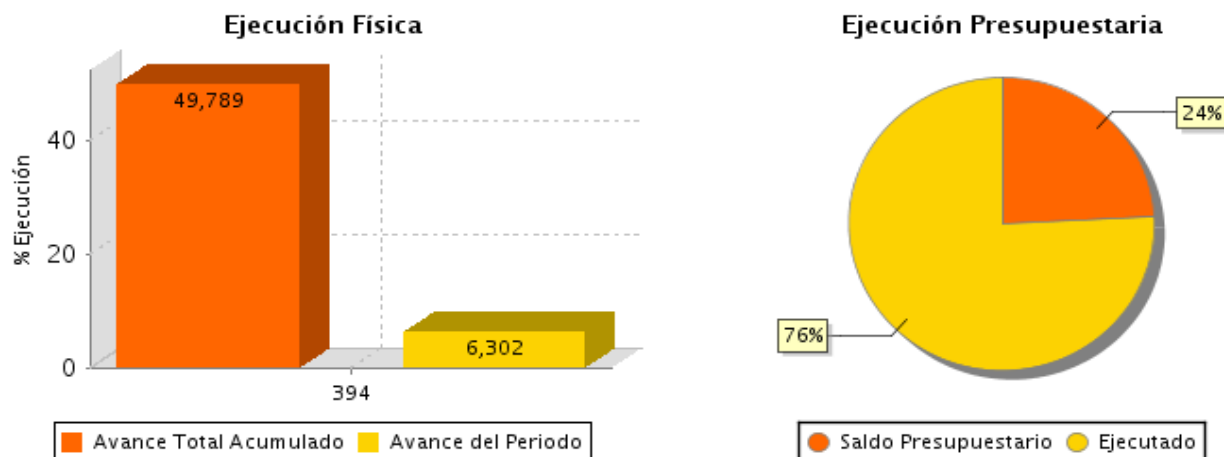

SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha reportado su avance de ejecución en el tercer cuatrimestre de 2021.



**TETÁ VIRU
MOHENDAPY**
Motenondcha
Ministerio de
HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP *py* Sistema Nacional
de Inversión
Pública

| | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------|----------------|
| Proyecto | | Capacitación Apoyo a la ampliación de la jornada escolar | | | |
| OEE | | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS | | | |
| Código SNIP N° | | 570 | | | |
| Financiamiento | | BID | | | |
| Costo del Proyecto | | USD | 16.823.200 | GS. | 94.209.920.000 |
| Avance Financiero en Gs. | | Saldo Financiero en Gs. | | Porcentaje de Ejecución | |
| 35.366.763.354 | | 58.843.156.646 | | 37,54% | |
| Fecha de Inicio | | Fecha de Fin | | Fecha de Prórroga | |
| 31/10/2017 | | 10/10/2022 | | N/A | |
| Ubicación Geográfica del Proyecto | | | | | |
| Alcance Nacional | | | | | |
| Avance Físico Reportado del Periodo | | | Avance Físico Acumulado Total | | |
| 21,14% | | | 31,28% | | |
| PGN Vigente en Gs. | | Ejecución en Gs. al 31/12/2021 | | Porcentaje Ejecutado | |
| 40.701.673.123 | | 32.731.420.571 | | 80% | |
| AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO | | | | | |
| Ejecución Física | | | Ejecución Presupuestaria | | |
| <p>96,8% 3,20%</p> <p>570</p> <p>■ Avance Total Acumulado ■ Avance del Periodo</p> | | | <p>20% 80%</p> <p>■ Saldo Presupuestario ■ Ejecutado</p> | | |
| SITUACIÓN ACTUAL | | | | | |
| En el marco de la ejecución del tercer cuatrimestre de 2021, la Unidad Ejecutora de Proyectos, no reportó las observaciones remitidas por esta dependencia. | | | | | |




**TETÁ VIRU
MOHENDAPY**
Motenondcha
Ministerio de
HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP py Sistema Nacional
de Inversión
Pública

| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|------------|----------------|
| Proyecto | Mejoramiento Condiciones de transporte de estudiantes | | | |
| OEE | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS | | | |
| Código SNIP N° | 571 | | | |
| Financiamiento | BID | | | |
| Costo del Proyecto | USD | 3.176.800 | GS. | 17.790.080.000 |
| Avance Financiero en Gs. | Saldo Financiero en Gs. | Porcentaje de Ejecución | | |
| 0 | 17.790.080.000 | 0% | | |
| Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Fecha de Prórroga | | |
| 31/10/2017 | 10/10/2022 | N/A | | |
| Ubicación Geográfica del Proyecto | | | | |
| Alcance Nacional | | | | |
| Avance Físico Reportado del Periodo | | Avance Físico Acumulado Total | | |
| 0,81% | | 2,01% | | |
| PGN Vigente en Gs. | Ejecución en Gs. al 31/12/2021 | Porcentaje Ejecutado | | |
| 715.637.000 | 0 | 0% | | |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

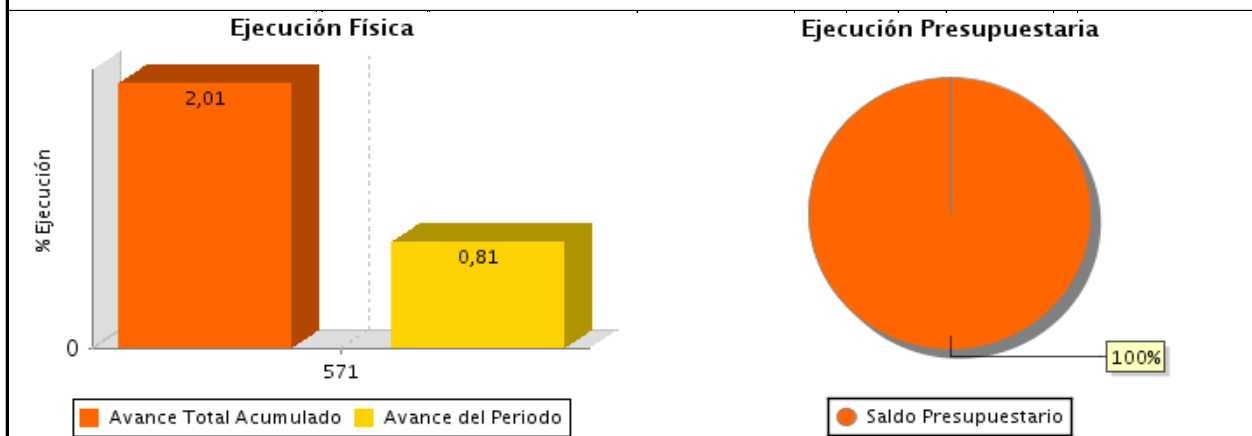

SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del tercer cuatrimestre de 2021, se actualizó la lista de escuelas de proyecto. Se presentó una propuesta técnica de la firma mejor puntuada para realizar el diagnóstico de necesidades y las condiciones de los establecimientos escolares que requieren transporte; esta no llegó a abrirse debido a que la lista de escuelas del proyecto fue actualizada. Este motivo que obligó a que la propuesta técnica vuelva a ser presentada atendiendo a las nuevas localizaciones geográficas de las escuelas beneficiarias. Se realizó una solicitud al BID para cambiar la modalidad de contratación de calificación de consultores a selección basada en calidad y costo. Se realizaron gestiones para que el PNUD apoye la implementación del servicio de transporte escolar.




TETĀ VIRU MOHENDAPY
Motenondcha
Ministerio de HACIENDA

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP py Sistema Nacional de Inversión Pública

| | | | | | |
|--|--|-----|--------------------------------------|------------|----------------|
| Proyecto | Apoyo Operativo para la ejecución de Programas y Proyectos del MEC | | | | |
| OEE | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS | | | | |
| Código SNIP N° | 709 | | | | |
| Financiamiento | Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest. | | | | |
| Costo del Proyecto | USD | N/A | | GS. | 48.370.745.864 |
| Avance Financiero en Gs. | Saldo Financiero en Gs. | | Porcentaje de Ejecución | | |
| 28.248.824.650 | 20.121.921.214 | | 58,40% | | |
| Fecha de Inicio | Fecha de Fin | | Fecha de Prórroga | | |
| 31/01/2017 | 30/06/2019 | | 30/06/2022 | | |
| Ubicación Geográfica del Proyecto | | | | | |
| Alcance Nacional | | | | | |
| Avance Físico Reportado del Periodo | | | Avance Físico Acumulado Total | | |
| 5,27% | | | 87,64% | | |
| PGN Vigente en Gs. | Ejecución en Gs. al 31/12/2021 | | Porcentaje Ejecutado | | |
| 7.094.791.000 | 3.964.618.371 | | 55,88% | | |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

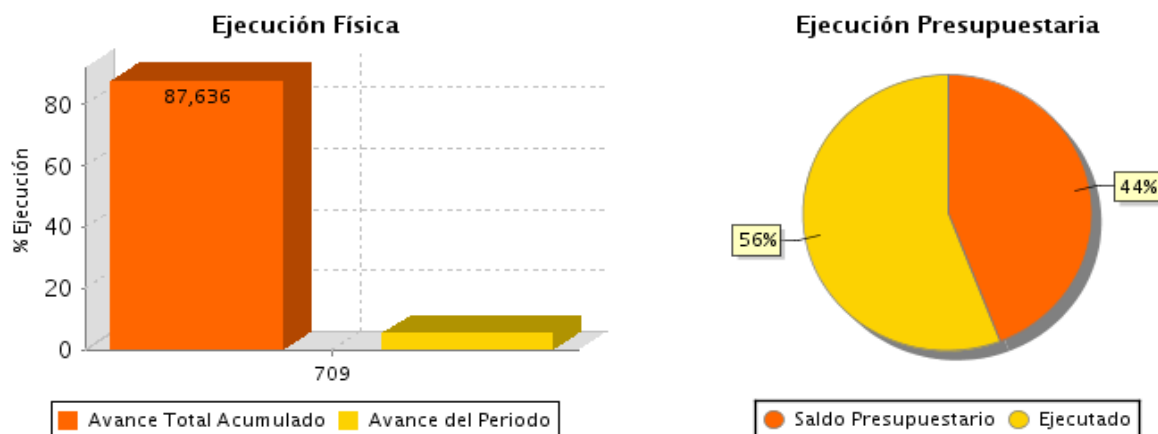

SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del tercer cuatrimestre de 2021, se realizaron las gestiones para la renovación de los contratos y comisionamientos del personal. Los pagos del personal contratado y comisionado de todas las áreas se realizaron mensualmente. Actualmente se encuentra vigente el contrato con la empresa Wilcar S.A. encargada del mantenimiento y reparación de vehículos. Se amplió el contrato a través de una adenda con la Compañía Paraguaya de Rulemanes S.A. para la provisión de neumáticos para la flota de vehículos de la Unidad Ejecutora de Proyectos. En dicho contexto, se concretó la provisión de neumáticos y se procedió al pago de los mismos. El contrato con la empresa Alfa Aseguradora S.A. feneció en el mes de octubre/21. Por ello se iniciaron los trámites para asegurar el seguro de la flota de vehículos de la Unidad Ejecutora. Se adquirieron productos de papel y se ha realizado un nuevo llamado para la adquisición de cajas y cartones. Se realizaron los pagos de los servicios básicos (ANDE y ESSAP) de manera regular.



TETÁ VIRU MOHENDAPY
Motenondcha
Ministerio de HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP py
Sistema Nacional de Inversión Pública


| | | | | |
|---------------------------------|--|---|--------------------------------|----------------|
| Proyecto | Difusión diseño de la estrategia de transformación educativa | | | |
| OEE | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS | | | |
| Código SNIP N° | 779 | | | |
| Financiamiento | Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest. | | | |
| Costo del Proyecto | USD | 0 | GS. | 35.481.455.340 |
| Avance Financiero en Gs. | Saldo Financiero en Gs. | | Porcentaje de Ejecución | |
| 12.880.028.059 | 22.601.427.281 | | 36,30% | |
| Fecha de Inicio | Fecha de Fin | | Fecha de Prórroga | |
| 24/10/2017 | 24/12/2018 | | 31/03/2022 | |

Ubicación del Proyecto

Alcance Nacional

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Avance Físico Reportado del Periodo | | Avance Físico Acumulado Total | |
| 15,59% | | 51,05% | |
| PGN Vigente en Gs. | Ejecución en Gs. al 31/12/2021 | Porcentaje Ejecutado | |
| 3.144.647.362 | 38.965.606 | 1,24% | |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

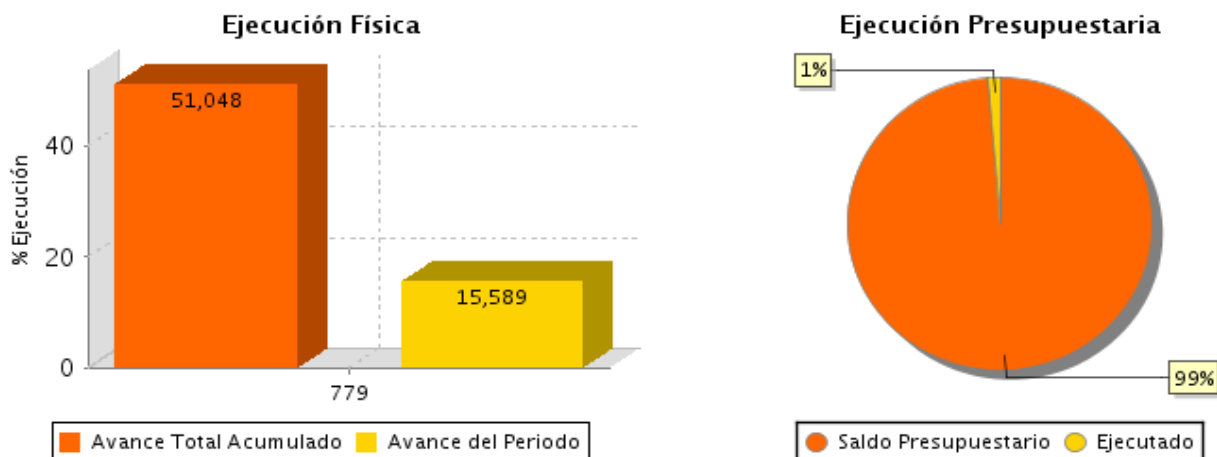

SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del tercer cuatrimestre 2021, hubo avances importantes en las actividades de participación y en la elaboración del primer acuerdo para el Diseño del Plan Nacional de Transformación Educativa, disponible en la web del proyecto. Actualmente el plan se encuentra en fase de retroalimentación por parte de la ciudadanía a través de una consulta digital también disponible en la página del proyecto. El mismo fue presentado al Congreso el 30/11/2021.
