



INFORME DE MONITOREO FÍSICO MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Enero – Abril 2022




Sistema Nacional
de Inversión
Pública





Proyecto	SP FOCEM-LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD FORT. DEL LAB. DE CONTROL DEALIMENTOS		
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
Código SNIP N°	13		
Financiamiento	FOCEM, LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	5.261.440	GS. 33.980.136.757
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
27.658.367.136	6.321.769.621	81,40 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
28/05/2007	28/05/2009	31/12/2022	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional			
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
1 %		102 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022	Porcentaje Ejecutado	
3.709.979.472	31.738.401	0,86 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

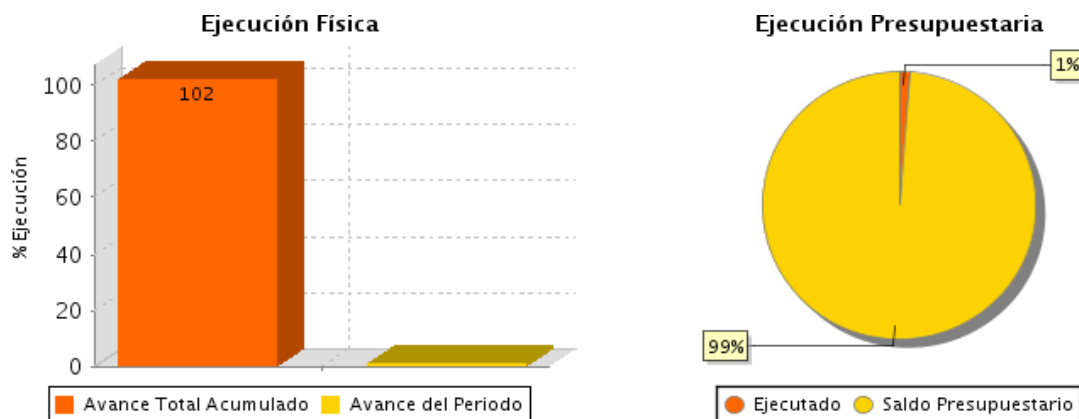


SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre el proyecto tiene un avance físico total de 96,21%. Los productos principales de éste proyecto son: a) La construcción de un Laboratorio de Bioseguridad NSB2A, con un avance físico acumulado del 100%. Se ha realizado el acto de Recepción Final de Obra de Laboratorio de Bioseguridad NSB2A, el cual se encuentra operando y en proceso de certificación; b) El llamado a LPI para Adquisición de Equipos Móviles de Laboratorio se encuentra en proceso de entrega de ofertas; c) Se han dado por concluidas las actividades de Consultoría de Fiscalización con la firma del Acta de Recepción de Obra de Laboratorio y de Publicidad, con la publicación del llamado para adquisición de equipos de laboratorio, en un periódico de gran circulación, acorde a las normativas.



Proyecto		Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en la Región Oriental			
OEE		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°		567			
Financiamiento		FIDA			
Costo del Proyecto	USD	22.468.000	GS.	121.400.000.000	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
12.555.610.019		108.844.389.981		10,34 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/10/2018		31/10/2024		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Caaguazú, Canindeyú, Concepción, San Pedro				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,48 %			8,84 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
27.246.200.000		475.997.808		1,96 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

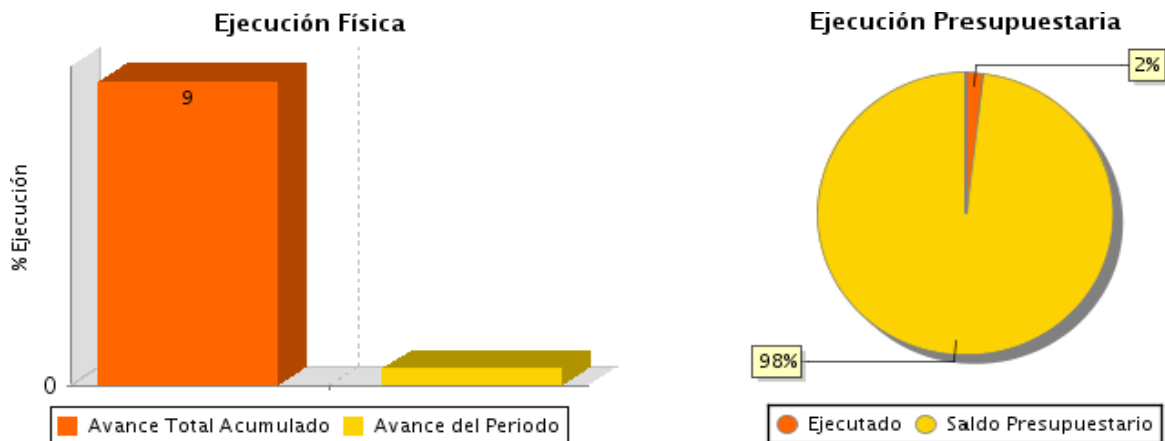


SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2022, la Unidad Ejecutora de Proyectos, reportó que no se ejecutaron planes, no obstante, se realizaron las gestiones ante las organizaciones rurales para ajustar los diferentes tipos de documentos que son requeridos por parte de los organismos de control, a fin de que las mismas puedan acceder al financiamiento. Por otra parte, la dificultad que se presenta es la falta de licencia ambiental por parte de las organizaciones rurales, las que deben realizar gestiones ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) ya que constituye un requisito establecido por el ente financiador para acceder al financiamiento de su plan de negocios.



Proyecto	Restauración y Manejo Sostenible de Recursos Naturales			
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°	664			
Financiamiento	KFW			
Costo del Proyecto	EUROS	8.463.250	GS.	52.082.839.992
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
42.410.025	52.040.429.967		0,08 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
13/09/2017	13/02/2022		30/06/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional				
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total		
4,00 %		4,00 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
15.449.651.950	42.410.025		1,34 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

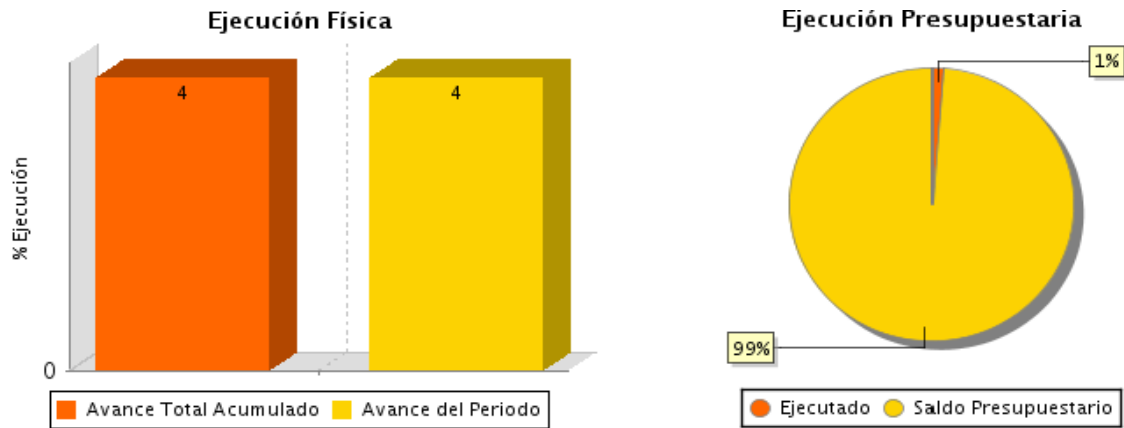


SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2022, la Unidad Ejecutora de Proyectos, no reportó las observaciones remitidas por esta dependencia.



Proyecto	Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Cadenas de Valoren la Región Oriental (FASE II)			
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°	708			
Financiamiento	FIDA			
Costo del Proyecto	USD	14.714.000	GS.	82.398.400.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
20.932.642.018	61.465.757.982		25,40 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/10/2018	31/10/2023		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,67 %			9,37 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
11.043.205.491	943.694.108		8,91 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

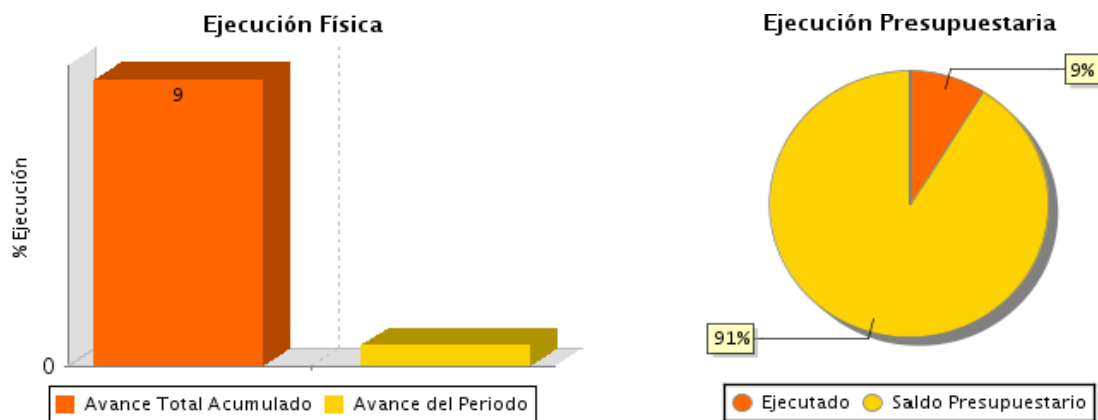


SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyecto reportó que se aprobaron dos planes de negocios, además se realizaron las gestiones ante las organizaciones rurales para ajustar los diferentes tipos de documentos que son requeridos por parte de los organismos de control, a fin de que las mismas puedan acceder al financiamiento. Por otra parte, la dificultad que se presenta es la falta de licencia ambiental por parte de las organizaciones rurales, las que deben realizar gestiones ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) ya que constituye un requisito establecido por el ente financiador para acceder al financiamiento de su plan de negocios.



Proyecto		Implementación del Sistema de Censo y Encuestas Agropecuarias			
OEE		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°		714			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto	USD	12.315.661	GS.	88.935.000.000	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
22.601.811.412		66.333.188.588		25,41 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
25/05/2019		25/05/2024		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
4,26 %			42,76 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
42.523.816.149		8.505.590.240		20,41 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

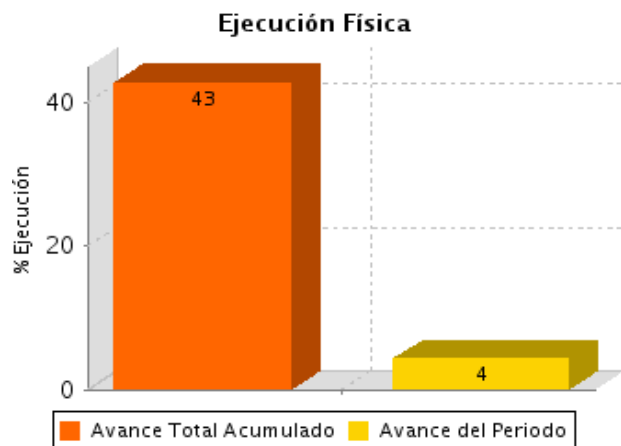


SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2022, la Unidad Ejecutora de Proyectos, no reportó las observaciones remitidas por esta dependencia.



Proyecto		Mejoramiento de la inserción a mercados R. Oriental y Occidental			
OEE		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°		904			
Financiamiento		BIRF			
Costo del Proyecto		USD	100.000.000	GS.	635.000.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
203.466.088.771		431.533.911.229		32,28 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
26/03/2020		30/06/2026		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro, Ñeembucú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
2,27 %			33,13 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
66.532.501.403		8.243.358.116		12,64 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

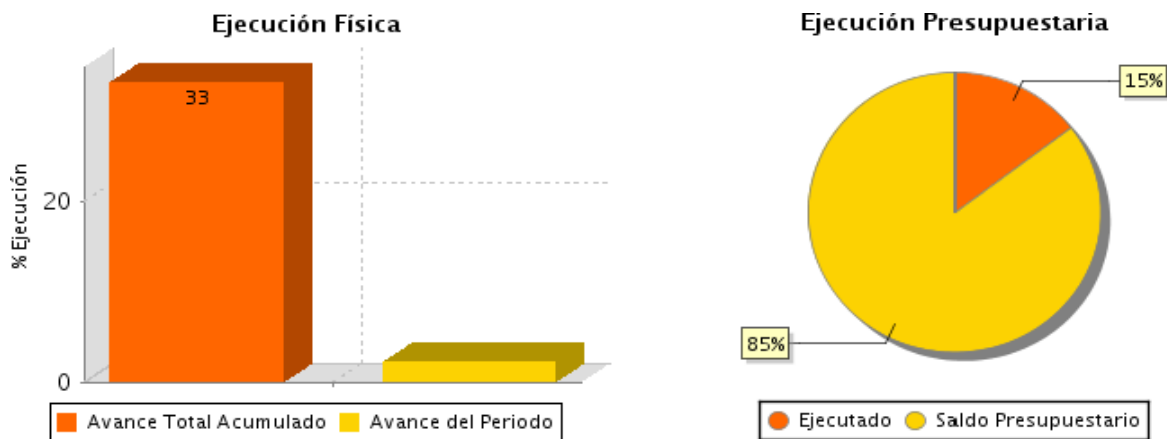

SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2022, la Unidad Ejecutora de Proyectos, no reportó las observaciones remitidas por esta dependencia.
