



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
CIENCIAS


Enero - Abril 2023

 Sistema Nacional
de Inversión
Pública



Proyecto	Ampliación REP. 822 EST. EDUC. ASU 17 DPTOS		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	325		
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 578.568.001.943
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
498.786.362.221	79.781.639.722		86,21 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
11/09/2014	11/09/2017		30/06/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
3 %		83 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado
77.329.209.287	2.636.449.694		3,41 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

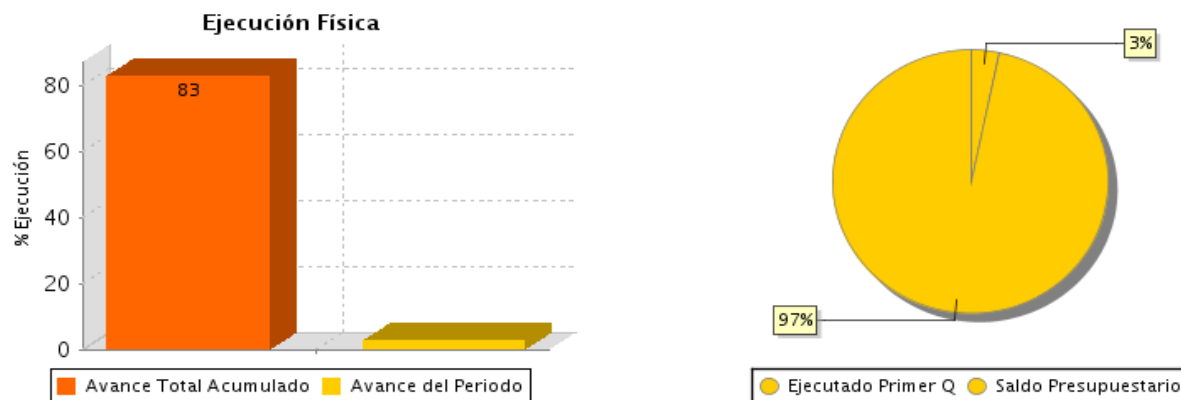

SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2023 la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se realizaron fiscalizaciones y supervisiones en 123 establecimientos educativos en los departamentos de: Central, Ñeembucú, Misiones, Caaguazú, Caazapá, Paraguari, Cordillera, Guaira, Canindeyú, Itapúa y San Pedro.

Se realizaron pagos de honorarios a supervisores, especialistas y técnicos, por provisión en combustibles a proveedores y a empresas contratistas por certificación de obras.


Por otro lado, se encuentran terminadas con actas de recepción provisorias las obras en los establecimientos educativos de los siguientes Departamentos: Misiones, 12, y Ñeembucú 1.

Asimismo, se recepcionó un informe referente a la Consultoría Forense y la Auditoría Financiera se encuentra con recepción de cronograma y plan de trabajo en proceso de aprobación en la Coordinación de Proyectos de Infraestructura. Se renovó el Convenio con la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA) para la fiscalización de Obras pendientes.



Proyecto	Ampliación REP. 108 EST. EDUC. ASU Y 10 DEP. GEOG.		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	326		
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 46.134.643.694
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
45.472.926.944	661.716.750		98,57 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
14/08/2014	14/08/2015		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		100 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado
484.590.698	0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

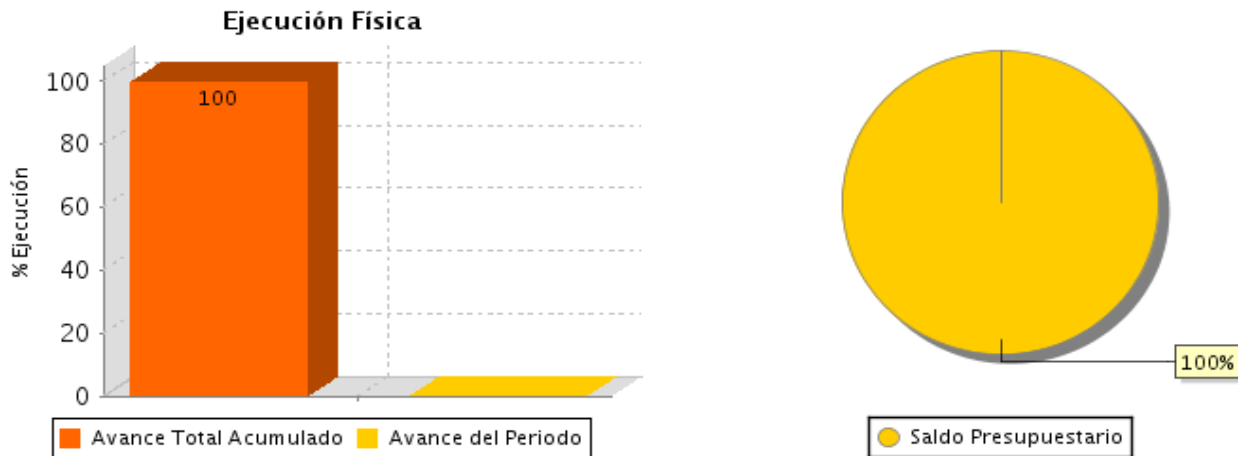


SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto culminó su ejecución física en diciembre del año 2022. Este año realizó su cierre administrativo.



Proyecto		Capacitación a los Educadores de todos los niveles y modal.		
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°		387		
Financiamiento		Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	272.530.950.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
184.116.819.848		88.414.130.152		67,56 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
30/12/2014		30/06/2018		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0 %			86 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado
14.775.799.023		748.400.000		5,07 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

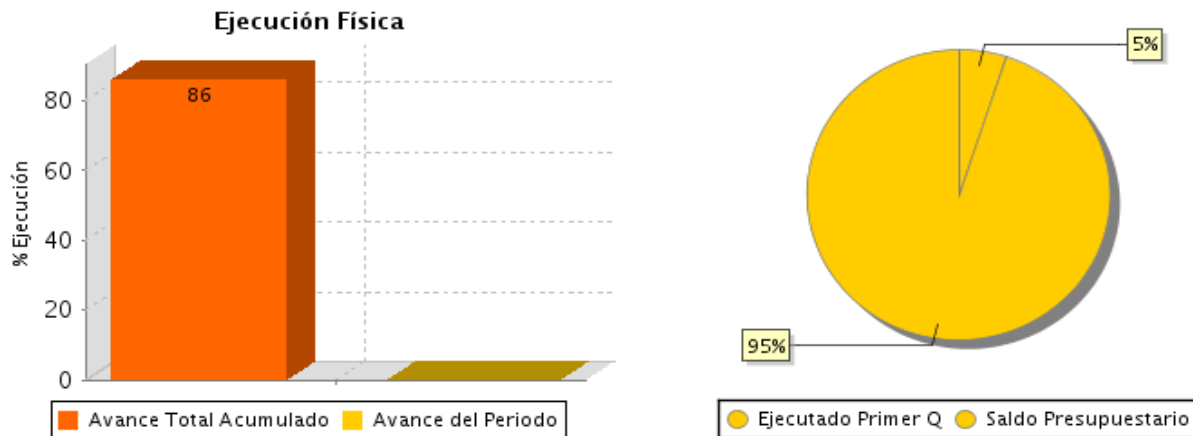



SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que el proyecto se encuentra en proceso de cierre, con todas las actividades finalizadas, algunas en proceso de pago. Con respecto, al avance físico de 86 % se aclara que algunas actividades planificadas inicialmente no se realizarán en atención a que los procesos licitatorios fueron declarados desiertos, como el caso del Curso de Actualización en Neuroeducación.



Proyecto	Ampliación en la atenc. educ. desde la gest. hasta 5 años		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	388		
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 407.488.286.993
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
323.145.782.039	84.342.504.954		79,30 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
24/05/2015	31/12/2018		31/03/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
1 %		82 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado
81.234.599.971	10.432.910.436		12,84 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

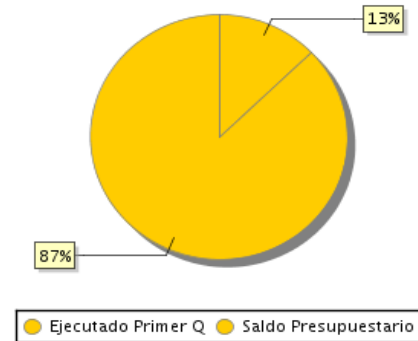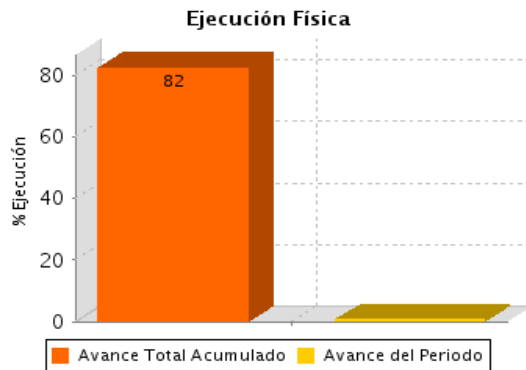

SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre del periodo fiscal 2023 la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que 32 obras se encuentran en proceso de ejecución conforme al llamado a licitación ID N° 406.738. Además, 8 instituciones educativas se encuentran con acta de recepción definitiva en los Departamentos de: Pdte. Hayes, Concepción, Caaguazú, San Pedro y Boquerón.

Se realizó la contratación de docentes titulares y auxiliares, maestras mochileras, psicólogos de educación inicial, educadoras comunitarias cuya vigencia de contratos inicia en el 15/02/2023. Así también se contrató a consultores para el periodo 2023, mediante Resolución UEPP N° 30/2023.

Se impartieron talleres virtuales y presenciales realizados por la instancia misional, dirigido a los contratados para los servicios educativos para dar orientaciones generales del nivel inicial, talleres de capacitación para el fortalecimiento del rol de los actores involucrados en el servicio educativo maestra mochilera.

Por otra parte, se efectuó el desembolso final a la firma encargada de la auditoría técnica de obras. Así mismo, se realizó la adjudicación de la auditoría financiera y de gestión del periodo 2022 y se implementó la evaluación de impacto del programa.


Se realizaron los siguientes llamados:

- Llamado para adquisición de parques infantiles, ID N° 422.246, declarado desierto.
- Llamado para adquisición de mobiliarios, ID N° 422.176, declarado desierto.
- Llamado para adquisición de materiales didácticos, ID N° 422.087, declarado desierto.



Proyecto	Investigación Eval. estandarizadas de desempeño a estud.		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	389		
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 63.790.750.573
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
59.515.907.983	4.274.842.590		93,30 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
30/12/2014	30/12/2021		31/07/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
1 %		95 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado
2.890.539.112	603.752.620		20,89 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

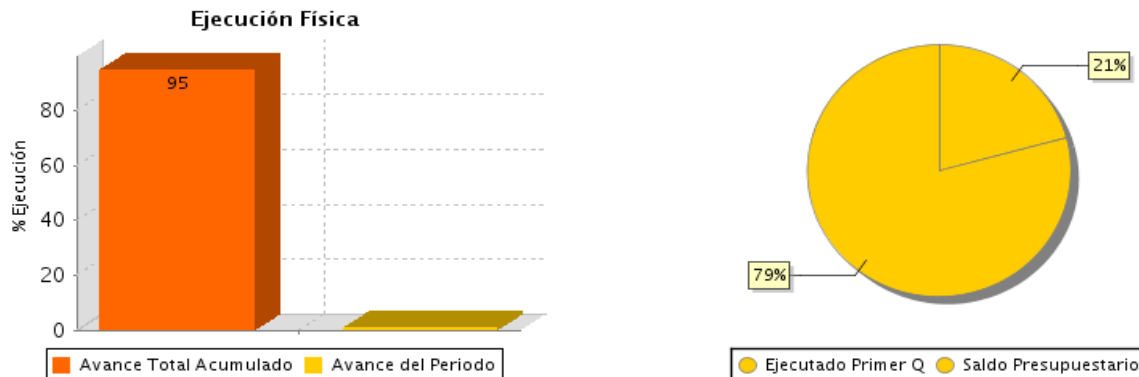


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se realizaron las capacitaciones de los procesos de evaluación de la calidad de las prácticas pedagógicas y del desempeño de los gestores educativos a 334 docentes de la Red de Educadores del Paraguay. Así también, el equipo de especialistas participó en la preparación del diseño y adaptación de los instrumentos de evaluación regional, para la aplicación piloto a estudiantes del 3° y 6° grado de la Escuela Escolar Básica en las diferentes áreas. Se publicaron los resultados de la evaluación aplicada en el año 2022 a estudiantes de 15 años de edad de las instituciones educativas de gestión oficial, privada y subvencionada. Además, se inició la capacitación para la evaluación PISA 2025, que comprende el diseño, traducción y adaptación de los instrumentos de evaluación de las diferentes áreas, así como el pago de la membresía y contratación del equipo técnico. Se realizó el llamado de licitación del "Servicio de Auditoría Externa de Gestión" del programa evaluaciones estandarizadas, que será ejecutado en siguientes cuatrimestres.

Proyecto	Mejoramiento de cond. de aprendiz. con incorporación de TIC				
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS				
Código SNIP N°	394				
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	649.737.299.524
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución		
548.825.169.052	100.912.130.472		84,47 %		
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga		
25/11/2015	25/12/2019		30/06/2023		
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
2 %			75 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al		30/04/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
97.271.880.307	2.308.530.638			2,37 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

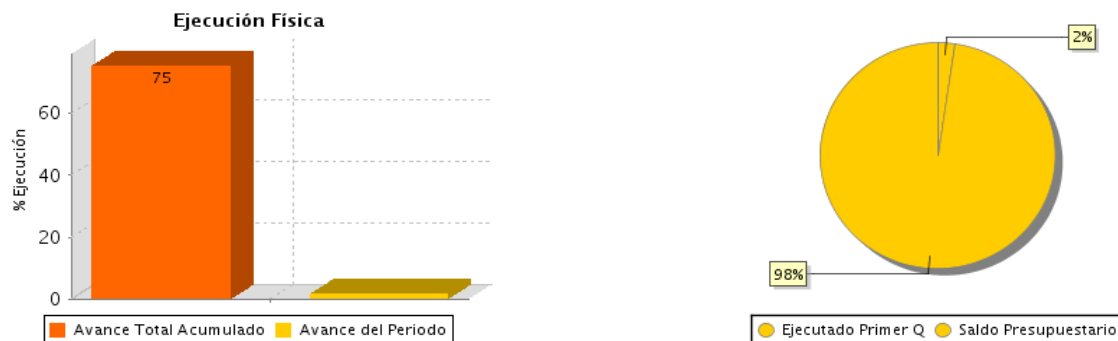

SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre se realizaron conexiones a internet mediante fibra óptica a 80 establecimientos educativos. Asimismo, en el marco del Acuerdo Especifico suscrito con COPACO y 23 establecimientos educativos se realizaron las conexiones conforme al llamado "Contratación de Servicios de Conectividad para establecimientos educativos del MEC –ID 417.295.

Se efectuó el relevamiento y aprobación de planos para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de conectividad en el marco del llamado a licitación "Ampliación Suministro Instalación y Puesta en servicio de infraestructura de conectividad en instituciones educativas del Paraguay, ID 417.928, beneficiando a 300 nuevas instituciones educativas y ampliación de la cobertura de internet a 760 instituciones educativas.

Se recibieron en depósitos, equipos informáticos adquiridos en el marco de la ampliación del llamado "Adquisición de Equipos Informáticos para Instituciones Educativas ID 400.741 que beneficiará a un total de 64 instituciones educativas.

Además, se recibieron en depósitos, equipos informáticos para 48 instituciones de educación inclusiva beneficiadas con el llamado ID 406.275 "Adquisición de laboratorios móviles de informática y elementos periféricos adaptados para instituciones educativas de educación inclusiva.


Respecto, al Contrato N° 01/22 MEC - UAA, Contratación para el desarrollo del curso "Especialización en el uso de las tecnologías de la información y comunicación en las prácticas pedagógicas, se encuentra en proceso de cierre, con 286 graduados.

Así mismo, se desarrolló el curso "Capacitación de Educadores en el desarrollo de competencias TIC para la integración pedagógica y la gestión escolar", en el marco del Contrato N° 03/22 MEC – UAA, con un total de 6532 educadores inscriptos.

Se firmó el contrato "Capacitación de Educadores en Metodologías Activas para el Desarrollo de Habilidades del siglo 21", Contrato N° 01/2023, se encuentra en proceso de organización, con 2.500 gestores TIC institucionales designados.

Proyecto	Capacitación Apoyo a la ampliación de la jornada escolar.			
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°	570			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	16.823.200	GS.	141.656.054.468
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
76.627.245.028	65.028.809.440		54,09 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/10/2017	10/05/2024		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
6 %			47 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
27.355.815.974	4.429.947.265		16,19 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

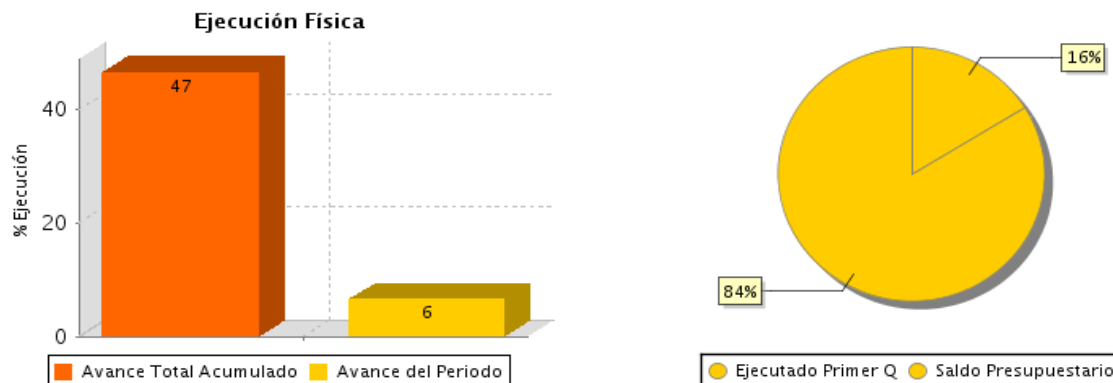

SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se encuentra en proceso de impresión y distribución los materiales educativos (guías docentes, cuadernos de aprendizaje del estudiante) del 1º al 6 Grados de la Educación Escolar Básica.

Se realizó la rendición de cuentas de las instituciones que recibieron transferencias para compra de mobiliarios y Kits escolares. Se completó la adquisición, provisión y distribución de 2200 notebooks para docentes de las 300 escuelas focalizadas en todos los departamentos del país.

Finalizó la ejecución del contrato de diseño conceptual de la herramienta del seguimiento a la gestión y el contrato para la evaluación intermedia del proyecto.


Se realizaron talleres en las instituciones educativas de Amambay, Concepción, Canindeyú, San Pedro, Alto Paraná, Caaguazú, Itapúa, Caazapá, Ñeembucú, Misiones, Guairá, Paraguarí, Cordillera, Pte. Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.

Se elaboraron materiales para el vínculo de la escuela, la comunidad y la familia (boletines para alumnos desde el 1er al 2do ciclo, cuadernillos para docentes, cuadernillos para familias, materiales audiovisuales para la comunidad educativa). Por otra parte, se realizó una Adenda al Contrato con la firma auditora y se presentaron los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal 2022.



Proyecto	Mejoramiento Condiciones de transporte de estudiantes		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	571		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	3.176.800	GS. 17.790.080.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
0	17.790.080.000	0,00 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
31/10/2017	10/05/2024	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		2 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
11.683.184.026	0	0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

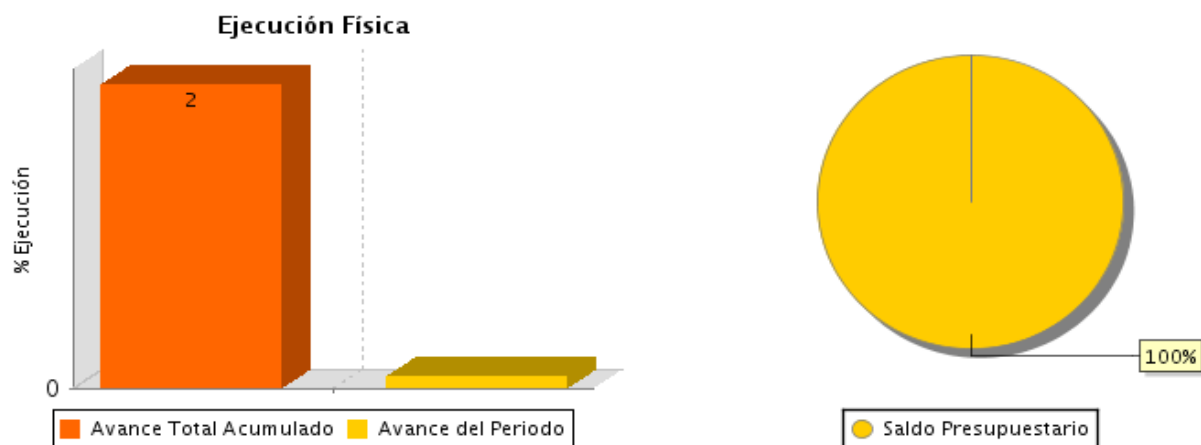


SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2023 la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que en fecha 26 de abril de 2023 se procedió a la apertura de la propuesta financiera de la firma Ernst & Young Paraguay Auditores y Asesores de Negocios S.R.L para la realización de un estudio de transporte, en el cual se determinará las facilidades de traslado a las instituciones educativas rurales.



Proyecto	Fomento y apoyo operat. para la ejec. de proy. del MEC				
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS				
Código SNIP N°	709				
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	58.994.841.017
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
38.910.954.071		20.083.886.946		65,96 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/01/2017		30/06/2019		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
5 %			71 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al		30/04/ 2023	
12.912.475.212		3.350.333.679		Porcentaje Ejecutado	
				25,95 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

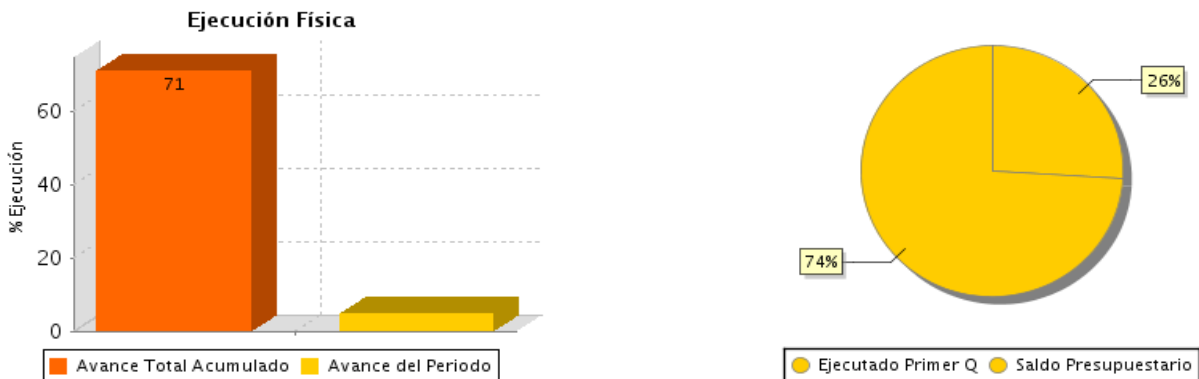

SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se realizó la recontractación del personal. Además se efectuaron los pagos correspondientes a las coordinaciones de :Apoyo a la Gestión; Administración y Finanzas, Adquisiciones y Contrataciones.


Por otra parte, se iniciaron los procesos para el llamado de contrataciones de: servicios de mantenimiento de vehículos, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, adquisición de cubiertas, cámara de aire, provisión de agua, recarga de extintores, servicio de auditoría y el servicio de limpieza.

Se ejecutaron contratos de servicios de publicaciones, seguro de los vehículos de la unidad ejecutora, servicios de escribanía, alquiler de las oficinas administrativas, mantenimiento de equipos informáticos y alquiler de fotocopadoras.

Fueron entregadas a la dirección Ejecutiva del FEEI las rendiciones de cuentas correspondientes al segundo semestre del periodo fiscal 2022 y del primer trimestre del presente año. Se firmó una adenda de ampliación del Convenio entre el MEC y la OEI y se gestionó la resolución de pago del citado convenio.

Proyecto		Mejoramiento de infraest. y equipam. de Colegios Técnicos	
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS	
Código SNIP N°		972	
Financiamiento		Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.	
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 208.780.522.064
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.	
170.000.000		208.610.522.064	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin	
21/01/2022		31/07/2025	
Fecha de Prórroga		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		3 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023	
139.609.219.597		170.000.000	
Porcentaje Ejecutado		0,12 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

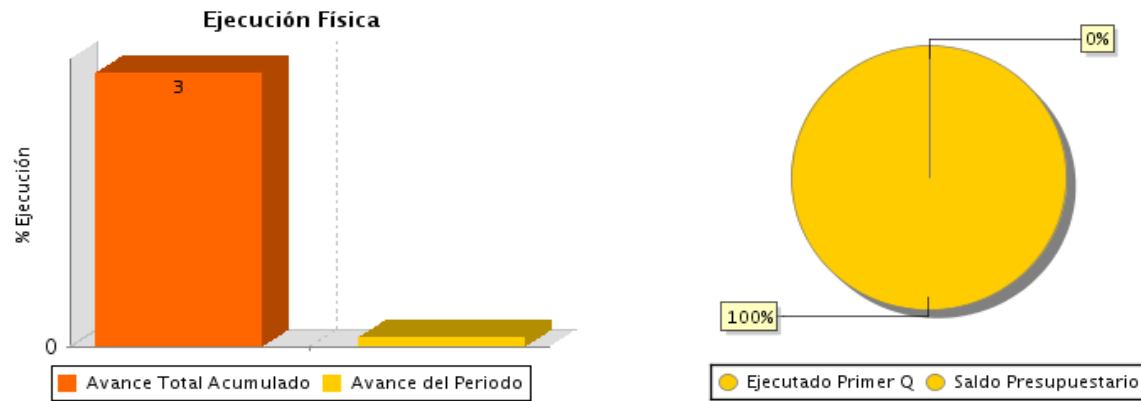

SITUACIÓN ACTUAL


La Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que en este periodo se contrató a 5 profesionales que conforman el "Equipo de gestión y coordinación de proyectos de Infraestructura-Supervisión de proyectos", quienes realizaron trabajos de gabinete para el análisis de 2 tipologías de espacios educativos como: planillas, cálculos y especificaciones técnicas, planos de implantación, estudio de itinerario de entrega de sitio, formato de encuesta a los directores de colegios, verificación de títulos de propiedad, verificación de cantidad de espacios educativos con el mobiliario correspondiente, legajo individual de cada colegio técnico con sus correspondientes cantidades de espacios educativos a implementarse. Por otro lado, se realizó la adjudicación de la licitación N° 416.036, para Consultoría de relevamiento edilicio y proyecto ejecutivo de obras, que luego fue impugnada por protestas delm Consorcio TECON, situación que aún no fue resuelta.

Así también, los trabajos de campo como visita a los sitios de obras se realizarán una vez resuelto el citado proceso licitatorio.



Proyecto	Capacitación de las competencias profesionales de educadores		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	1071		
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 175.000.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
0	0		0,00 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
21/4/2023	21/4/2027		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		0 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado
26.220.000.000	0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

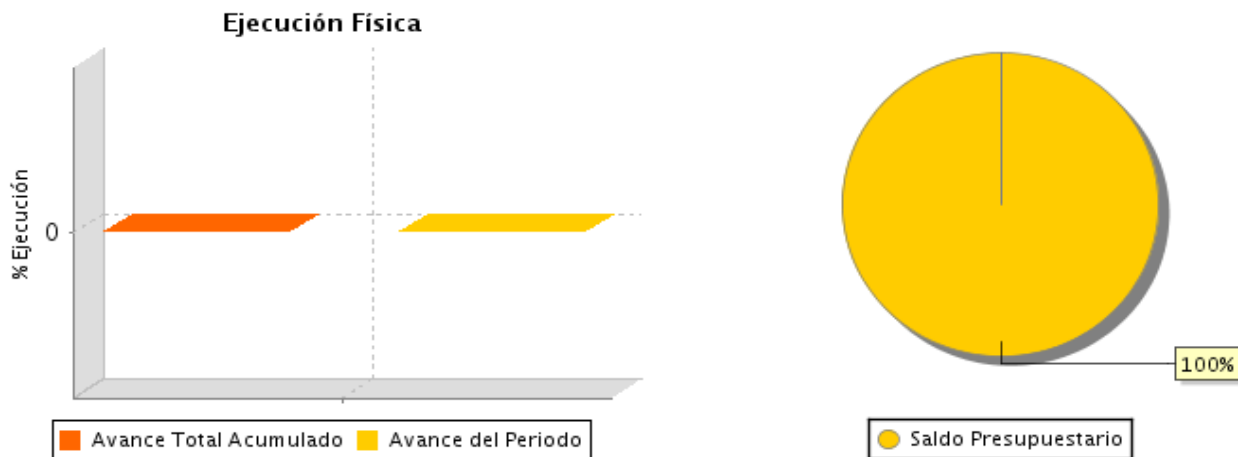

SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto es nuevo y recientemente obtuvo presupuesto por lo que la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que las actividades se iniciarán efectivamente en el próximo cuatrimestre.
