



INFORME DE MONITOREO FÍSICO


PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Enero – Abril 2022



Proyecto	Transferencia PROCENCIA		
OEE	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
Código SNIP N°	252		
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 580.650.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
560.459.433.813	20.190.566.187		96,52 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
20/01/2014	20/01/2019		30/06/2022
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional			
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		99 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022	Porcentaje Ejecutado	
1.266.171.352	426.395.752	53,64 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

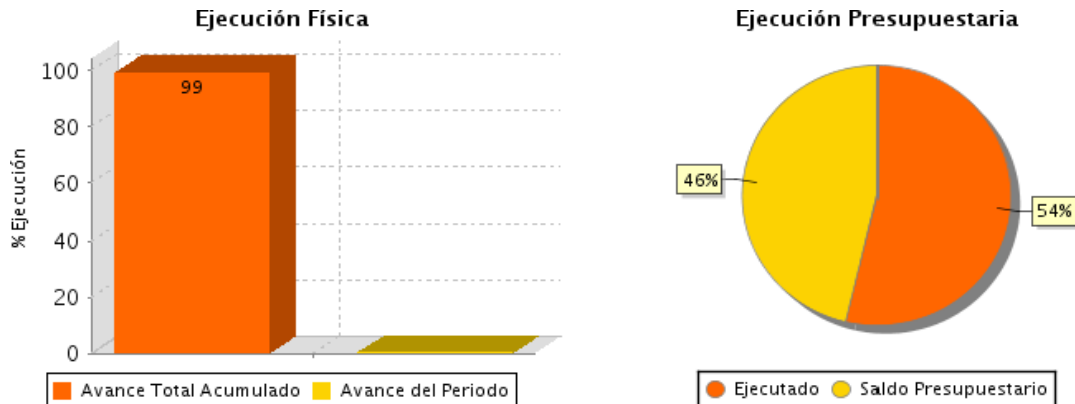


SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre el componente Fomento a la Investigación Científica contó con 55 actas de cierre suscritas. Se realizó el monitoreo y seguimiento de las convocatorias en ejecución. Se inició la elaboración de informes de cierre de instrumentos de los Componentes: II, III, IV y V. Se gestionó la firma del acta de cierre de los programas de posgrados, finalizados a la fecha de corte del informe. Se realizaron actividades de publicación de pósteres en la página web de CONACYT. Se cuenta con tres becarios con beneficio activo con incentivos vigentes hasta el primer semestre del año 2022. Se gestionaron adendas a los contratos de investigadores categorizados que continuarán percibiendo beneficios en marco de la fase II del Programa PROCENCIA. Se implementó el curso "El enfoque de CTS en la enseñanza de la ciencia y la tecnología" en formato MOOC. Igualmente, en el marco del llamado a Licitación Pública nacional N° 401.546 para el Servicio de Implementación de Repositorio institucional (ReVA) se desarrolló el software DSPACE, se generó un servidor proxy, se implementó un descubridor y se catalogaron publicaciones y resultados de investigación científica.



Proyecto	Innovación en Empresas del Paraguay		
OEE	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
Código SNIP N°	568		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	10.000.000	GS. 56.000.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs		Porcentaje de Ejecución
14.362.864.136	41.637.135.864		25,64 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
21/09/2017	21/09/2022		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional			
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		71 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022		Porcentaje Ejecutado
27.929.515.356	990.438.310		6,91 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

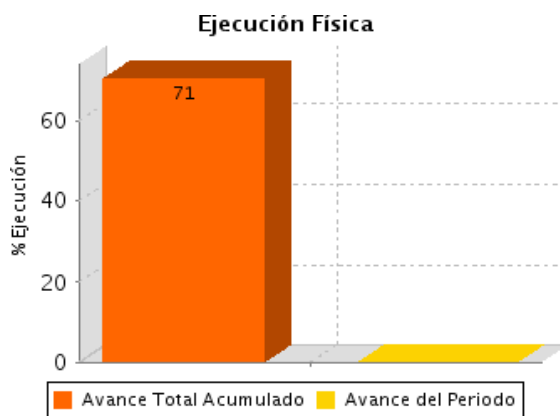


SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre no se avanzaron en temas relacionados a firmas de resoluciones de adjudicación y/o firma de contratos dado que los proyectos presentados requieren entre 10 a 12 meses para su ejecución. Se obtuvo el documento oficial de extensión de plazo de finalización del proyecto en fecha 30 de marzo, a partir del cual se solicita la emisión de resoluciones de adjudicación, así como la actualización de los documentos de las organizaciones adjudicadas para firma de contrato. Igualmente se procede a la admisión y evaluación de varias propuestas de proyectos.



Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL LAB. SENAD		
OEE	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
Código SNIP N°	890		
Financiamiento	REPÚBLICA DE CHINA		
Costo del Proyecto	USD	2.500.000	GS. 15.300.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
13.516.395.527	1.783.604.473		88,34 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
26/12/2018	26/12/2020		31/12/2022
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Asunción			
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		75 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022		Porcentaje Ejecutado
4.000.000.000	30.500.000		0,76 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

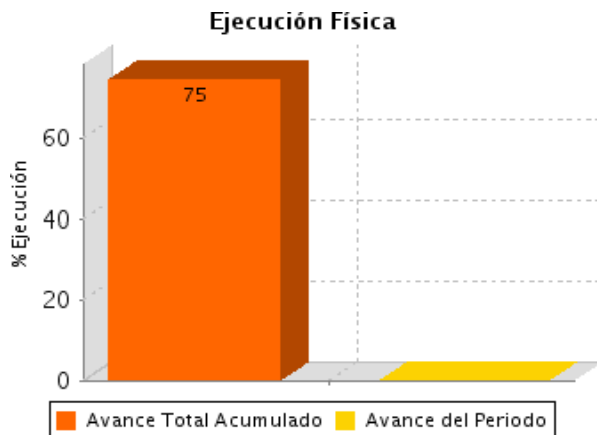


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.



Proyecto	Equipamiento e Implementación de bibliotecas públicas		
OEE	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
Código SNIP N°	923		
Financiamiento	LOCAL, REPÚBLICA DE CHINA		
Costo del Proyecto	USD	450.000	GS. 2.335.650.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
866.807.887	1.468.842.113		37,11 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
09/09/2020	09/12/2022		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
9,50 %		38,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022		Porcentaje Ejecutado
1.140.998.400	503.907.640		44,16 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

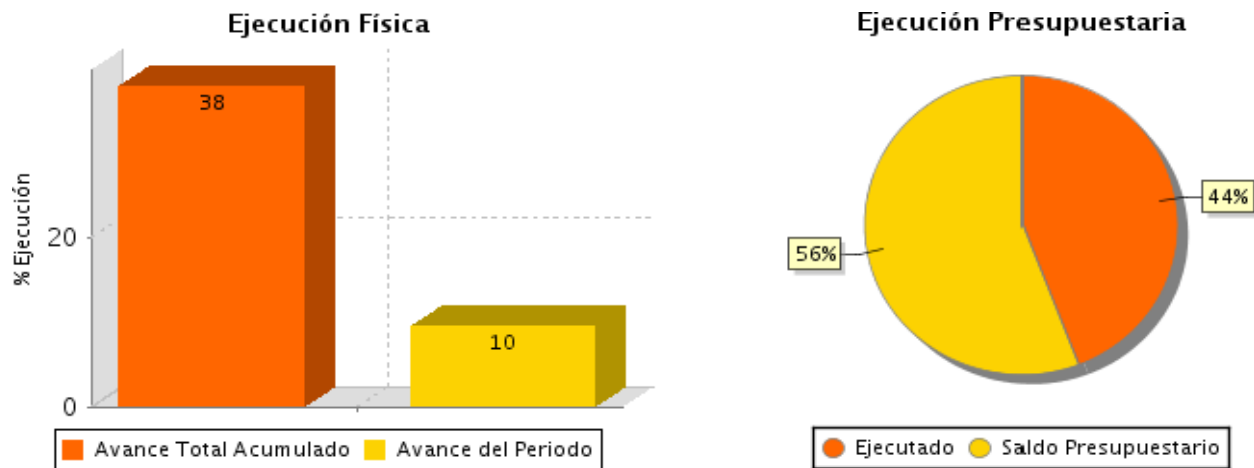


SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos, reportó que en lo referente a la adecuación, mantenimiento y reparación de Bibliotecas Públicas se realizaron trabajos consistentes en desmontes, nivelaciones, reparaciones de mamposterías y de techo, contrapisos, revoques y revestimientos, instalación sanitaria, trabajos de carpintería de madera y metálicos, instalación eléctrica, pinturas y vidrios, en cuatro localidades: Loreto, Dpto. de Concepción y Liberación, Dpto. de San Pedro, Corpus Christi, Dpto. de Canindeyú y Cptán. Bado, Dpto. Amambay, Además, se realizaron ocho suscripciones de Convenios Marco y Acuerdos Específicos entre los municipios y la Secretaría Nacional de Cultura.

Proyecto	Construcción, Mejoram. Escen. Deport. y Desarr.de XII J.S		
OEE	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
Código SNIP N°	932		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD		GS. 481.138.359.633
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
73.912.604.092	407.225.755.541		15,36 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/07/2021	01/07/2023		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Asunción			
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		8 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al	30/04/ 2022	Porcentaje Ejecutado
432.000.000.000	41.763.618.812		17,16 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

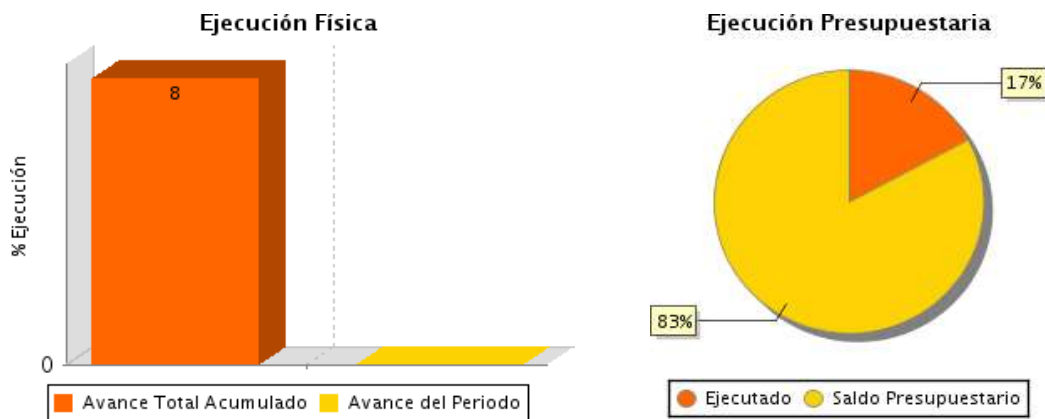


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de construcción y adecuación de los escenarios deportivos se encuentran en proceso de ejecución de acuerdo a lo planificado, las que son fiscalizadas por empresas especializadas de acuerdo a los estándares internacionales establecidos por la organización deportiva suramericana. La coordinación de los juegos se encuentra trabajando en las adjudicaciones para la provisión de los implementos deportivos y/o accesorios y/o materiales necesarios para la organización y desarrollo eficiente de la competencia, con el fin de alcanzar las metas establecidas.



Proyecto	Transferencia PROCENCIA II		
OEE	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
Código SNIP N°	958		
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.		
Costo del Proyecto	USD		GS. 663.549.337.479
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs		Porcentaje de Ejecución
1.893.290.184	661.656.047.295		0,29 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/08/2021	01/08/2027		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional			
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
1 %		2 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022		Porcentaje Ejecutado
111.265.013.363	1.767.856.876		2,28 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

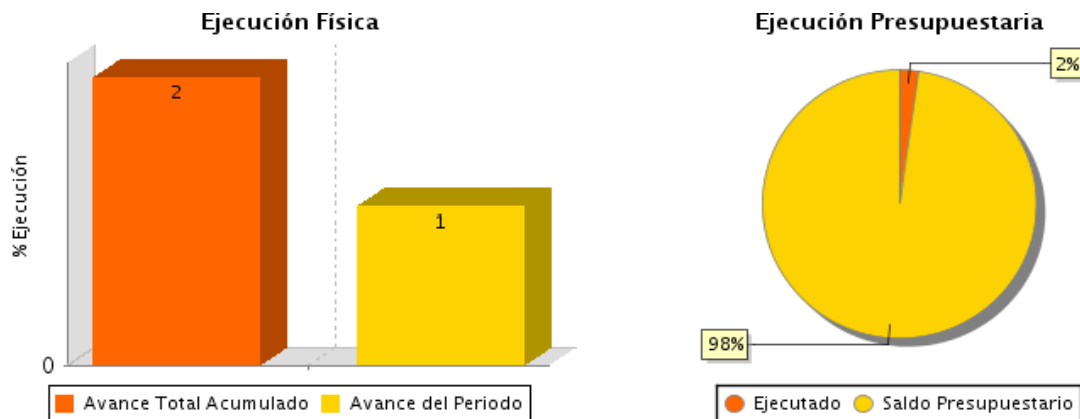

SITUACIÓN ACTUAL

En el marco del Componente 1 "Fomento a la Investigación Científica" fue lanzada la ventanilla de Fondos para eventos científicos. En el Componente 2 "Fortalecimiento del Capital Humano" se cuenta con una ventanilla abierta para la postulación de interesados en los instrumentos de financiamiento de estancias de investigación. El Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior cuenta con una convocatoria abierta disponible para la postulación de instituciones. En el Componente 4 "Iniciación y apropiación social de la Ciencia y la Tecnología" fue lanzada la 19ª edición del "Premio Nacional Juvenil de Ciencias Pierre et Marie Curie" financiado con el instrumento de ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología, los demás instrumentos no cuentan con avances debido a que
