



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO

## SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL


Enero - Abril 2023





<b>Proyecto</b>		Mejoramiento y ampliación de los servicios del SENACSA.	
<b>OEE</b>		SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL	
<b>Código SNIP N°</b>		710	
<b>Financiamiento</b>		BID , LOCAL	
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	16.306.294	<b>GS.</b> 91.315.246.400
<b>Avance Financiero en Gs.</b>		<b>Saldo Financiero en Gs.</b>	
23.506.916.658		67.808.329.742	
<b>Fecha de Inicio</b>		<b>Fecha de Fin</b>	
26/03/2020		27/03/2025	
<b>Fecha de Prórroga</b>		N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
7 %		39 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>		<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023</b>	
28.919.957.040		2.079.763.587	
<b>Porcentaje Ejecutado</b>		7,19 %	

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

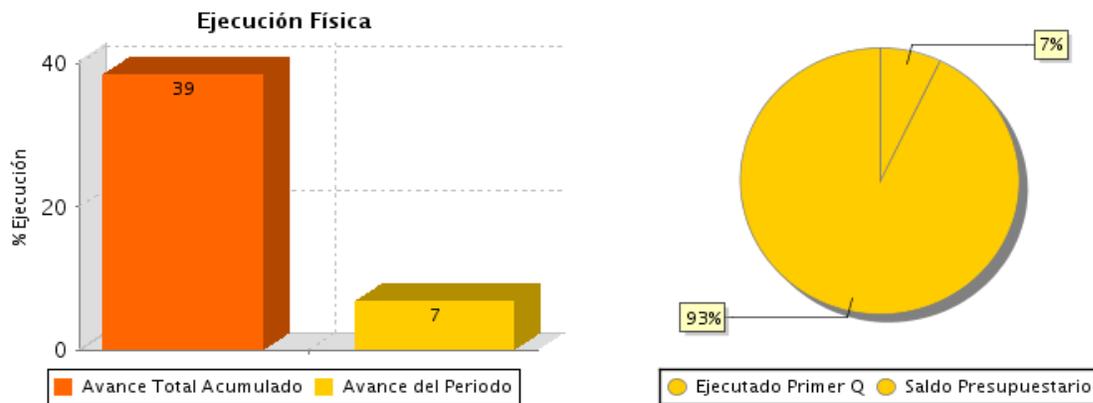

#### SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre se avanzó en el desarrollo del Sistema SISA 2.0 y en la implementación del software de laboratorios (LIMS) con el desarrollo del Módulo de Gestión de Calidad, además concluyeron tres consultorías a citar: factibilidad de laboratorio de genética molecular, programa de enfermedades reproductivas en rumiantes y programa de formación de técnicos de laboratorio para diagnóstico de la Brucelosis.

Por otro lado, se avanzó en la implementación del Datacenter único del SENACSA y la puesta en producción para el público de 12 trámites digitales, asimismo, en la contratación directa de una consultoría para compartimentación aviar, la contratación de desarrolladores de software y de una asistencia técnica para la implementación del plan maestro de TICs. Así también se lograron avances en las obras de construcción de la Unidad Zonal de Dr. J. Eulogio Estigarribia, que contempla la estructura, mampostería, instalaciones eléctricas y sanitarias y en la Coordinación de Pozo Colorado, se avanzó en la estructura vertical (pilares estructurales).

Se trabajó en el desarrollo de la reglamentación para el transporte de ganado menor (ovino/caprino). La unidad ejecutora entregó el informe de auditoría externa del proyecto al BID
