



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

Mayo - Agosto 2022


 Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública





<b>Proyecto</b>		Ampliación REP. 822 EST. EDUC. ASU 17 DPTOS		
<b>OEE</b>		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
<b>Código SNIP N°</b>		325		
<b>Financiamiento</b>		Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	N/A	<b>GS.</b>	578.568.001.943
<b>Avance Financiero en Gs.</b>		<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
485.962.985.944		92.605.015.999		83,99 %
<b>Fecha de Inicio</b>		<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
11/09/2014		11/09/2017		30/06/2023
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional	N/A			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
0 %			80 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>		<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>
109.012.971.831		17.659.091.276		16,20 %

**AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO**

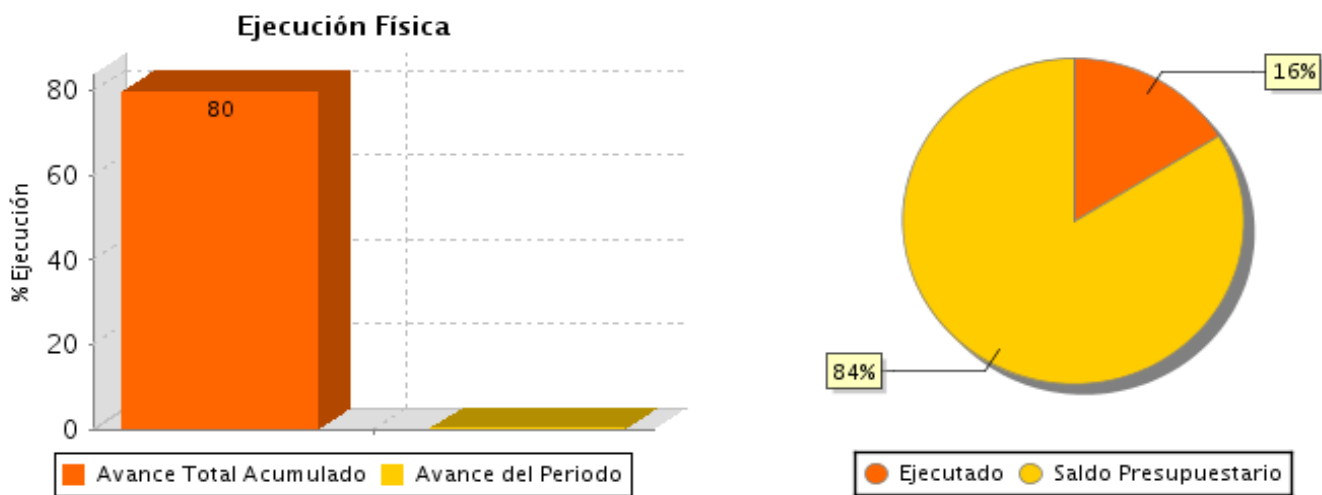


**SITUACIÓN ACTUAL**

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos, reportó que se realizaron llamados a licitaciones en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.



<b>Proyecto</b>		Ampliación REP. 108 EST. EDUC. ASU Y 10 DEP. GEOG.		
<b>OEE</b>		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
<b>Código SNIP N°</b>		326		
<b>Financiamiento</b>		Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	N/A	<b>GS.</b>	46.134.643.694
<b>Avance Financiero en Gs.</b>		<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
45.030.355.018		1.104.288.676		97,61 %
<b>Fecha de Inicio</b>		<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
14/08/2014		14/08/2015		31/12/2022
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional	N/A			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
0 %			99 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>		<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>
3.463.620.397		2.291.972.070		66,17 %

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

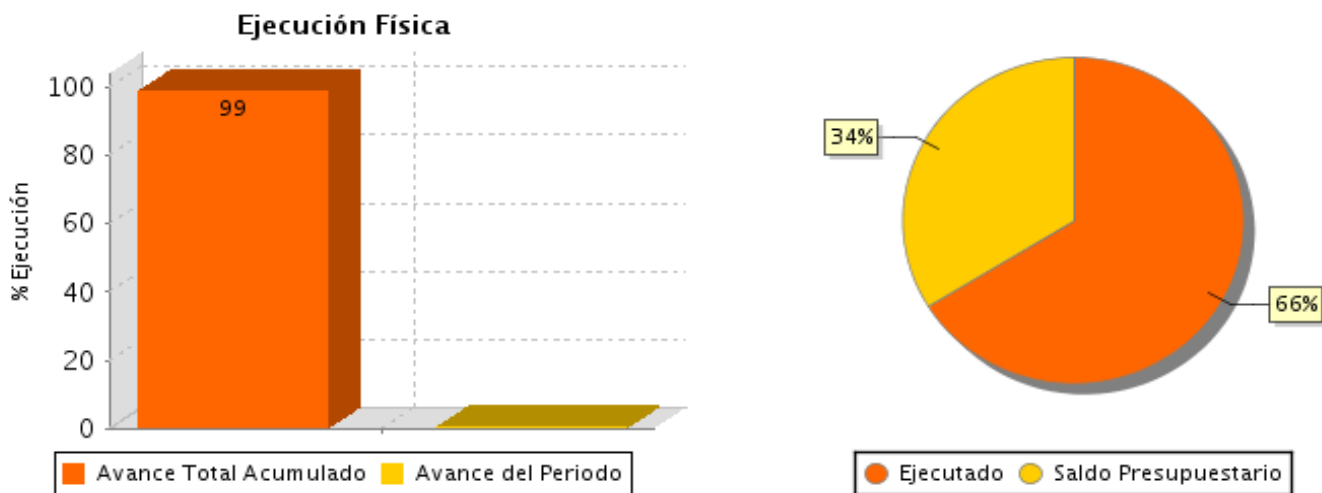


### SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos, reportó que se encuentran culminadas las construcciones y reparaciones en 21 establecimientos educativos, situados en los Departamentos de: Concepción 8 Instituciones Educativas, San Pedro 4 Instituciones Educativas, Presidente Hayes 4 Instituciones Educativas y Central 5 Instituciones Educativas.



<b>Proyecto</b>		Capacitación a los Educadores de todos los niveles y modal.			
<b>OEE</b>		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
<b>Código SNIP N°</b>		387			
<b>Financiamiento</b>		Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	N/A		<b>GS.</b>	272.530.950.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>		<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
172.253.937.997		100.277.012.003		63,21 %	
<b>Fecha de Inicio</b>		<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
30/12/2014		30/06/2018		31/12/2022	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>					
Nacional	N/A				
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>		
3 %			80 %		
<b>PGN Vigente en Gs.</b>		<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
30.000.000.000		5.931.517.091		19,77 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

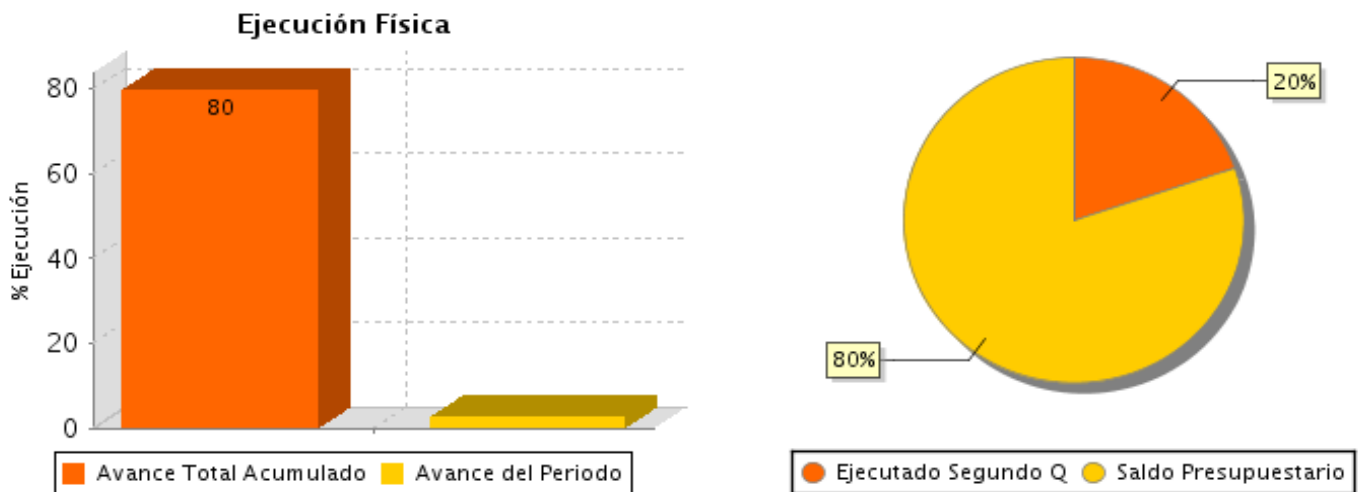

### SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos, reportó que se adjudicaron a Instituciones de Formación en Educación Superior los siguientes cursos: Actualización en Trabajo, Tecnología, y Asesoría Pedagógica con Base en la Priorización Curricular, y Lengua Inglesa. Se realizaron llamados y evaluación de ofertas para Cursos de Especialización de Aprendizajes basado en Redes y Liderzgo Pedagógico y actualización en Neuroeducación. Se realizaron trámites para firma de Convenio para Cursos de Educación Basado en competencias.

300 formadores de los Institutos de Formación Docente, de gestión oficial y Equipo Técnico del Nivel Central fueron matriculados en cursos de especialización. Se encuentra en proceso la titulación de 200 participantes de los cursos de especialista en Gestión del Currículum por Competencias e Innovaciones en la enseñanza de Matemática, Ciencias y Lengua. Se inició el Curso de Lengua Inglesa dirigido a 700 docentes de educación media, mediante el Convenio con el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. Se adjudicó al Consorcio Universidad San Ignacio de Loyola para el desarrollo del Curso de Ofertas Diferenciadas e inicio del Curso dirigido a 3500 docentes de todos los niveles del sistema educativo correspondientes a las ofertas de plurigrado.



<b>Proyecto</b>	Ampliación en la atenc. educ. desde la gest. hasta 5 años		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
<b>Código SNIP N°</b>	388		
<b>Financiamiento</b>	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	N/A	<b>GS.</b>
			414.488.286.993
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
288.582.076.572	125.906.210.421		69,62 %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
24/05/2015	31/12/2018		31/03/2024



**Ubicación Geográfica del Proyecto**

Nacional	N/A
----------	-----

<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
4 %		79 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
114.607.020.028	42.681.467.679	37,24 %	

**AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO**

**Ejecución Física**

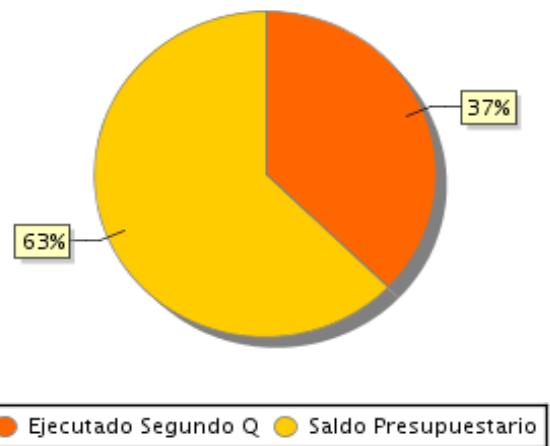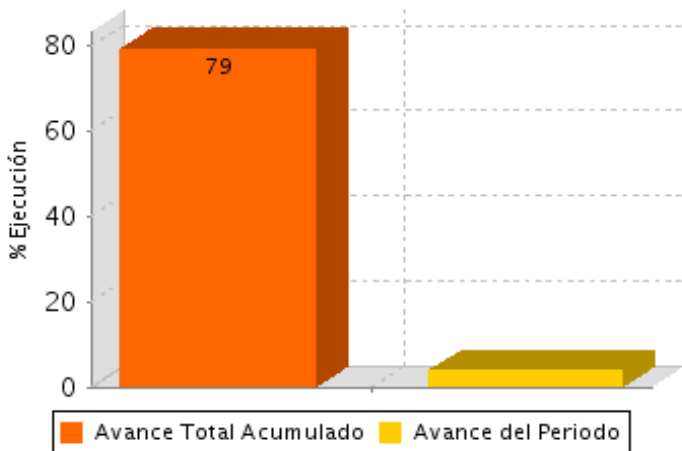


**SITUACIÓN ACTUAL**

En el segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2022, la Unidad Ejecutora de Proyectos, reportó que se adjudicó un llamado para la construcción de 57 espacios en instituciones educativas. Se reconstruyó a recursos humanos (educadoras comunitarias, docentes auxiliares) para la prestación de servicios educativos en las instituciones indígenas y no indígenas. Se realizó dotación de materiales didácticos a las maestras mochileras. Se realizaron actividades de capacitación, asesoramiento y seguimiento a los distintos servicios formales y no formales. Se distribuyeron materiales educativos del nivel inicial y se realizaron talleres zonales con directores, docentes, educadoras comunitarias, miembros de supervisiones, para el uso pedagógico de los materiales en los departamentos de: Alto Paraná, San Pedro, Concepción, Canindeyú, Central, Caazapá, Guairá, Alto Paraguay, Amambay, Pdte. Hayes. Más de 300 kits para maestras mochileras fueron entregados en los departamentos de: Central, Paraguari, San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná, Canindeyú, Cordillera, Amambay, Pdte Hayes, Caaguazú, Guairá, Misiones, Itapúa, Ñeembucú y la Capital. Se capacitaron a 15 agentes involucrados con los Servicios de Atención Temprana en los Departamentos de: Presidente Hayes y Boquerón. Se distribuyeron materiales didácticos a las instituciones focalizadas que implementan servicios educativos: Servicios de Atención Temprana en Capital y en los departamentos de: Concepción, San Pedro, Itapúa, Paraguari, Central, Ñeembucú, Canindeyú y Boquerón. Dotación de mobiliarios a 2 espacios socioeducativos de contextos de encierro de Coronel Oviedo y Asunción. Se dió inicio a la auditoría financiera de los periodos 2020-2021 Se elaboró los términos de referencia para el nuevo llamado de auditoría financiera y de gestión periodo 2022 y se remitió para aprobación del Consejo del FEEI.



<b>Proyecto</b>		Investigación Eval. estandarizadas de desempeño a estud.			
<b>OEE</b>		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
<b>Código SNIP N°</b>		389			
<b>Financiamiento</b>		Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.			
<b>Costo del Proyecto</b>		<b>USD</b>	0	<b>GS.</b>	63.790.750.573
<b>Avance Financiero en Gs.</b>		<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
58.123.620.811		5.667.129.762		91,12 %	
<b>Fecha de Inicio</b>		<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
30/12/2014		30/12/2021		30/07/2023	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>					
Nacional		N/A			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>		
9 %			92 %		
<b>PGN Vigente en Gs.</b>		<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
8.939.514.084		2.571.770.950		28,77 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

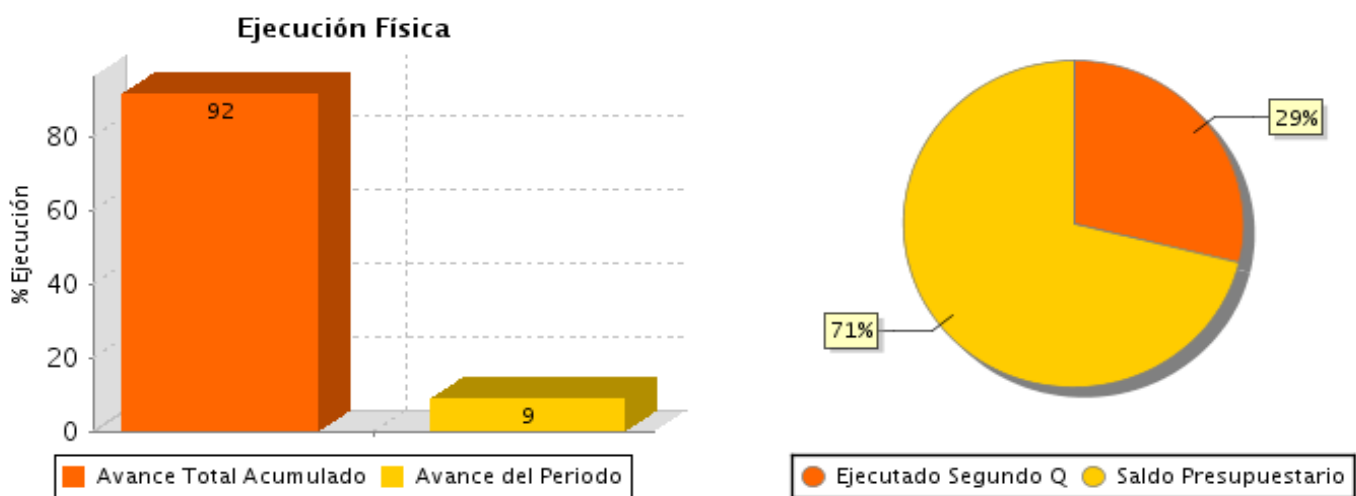

### SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos, reportó que se continuó con las actividades y jornadas de sensibilización dirigido a referentes de Instituciones educativas y supervisores educativos. Se implementó la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizajes de Contenidos Esenciales - ENLACE (aplicación experimental) a 35 Instituciones con la participación de 2197 estudiantes y 116 docentes. Fueron evaluados 1.261 estudiantes de 62 instituciones educativas en el marco de la aplicación definitiva PISA 2022 en los departamentos de: Asunción, Cordillera, Pte. Hayes, Central, Concepción, San Pedro, Amambay, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Canindeyú, Guaira, Caaguazú y Caazapá.



Se presentaron los resultados de las pruebas del Cuarto Estudio Regional Comparativo y Explicado (ERCE), con referentes de las direcciones misionales del MEC. Se adjudicó el llamado de "SERVICIO DE CONSULTORÍA DE APOYO ESPECIALIZADO, LOGÍSTICO Y PROCESAMIENTO PARA LA APLICACIÓN PILOTO DE ENLACE Y APLICACIÓN DEFINITIVA DE PISA -PLURIANUAL" y "SERVICIO DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES".



<b>Proyecto</b>	Mejoramiento de cond. de aprendiz. con incorporación de TIC		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
<b>Código SNIP N°</b>	394		
<b>Financiamiento</b>	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	N/A	<b>GS.</b> 649.737.299.524
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
428.160.160.325	221.577.139.199		65,90   %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
25/11/2015	25/12/2019		30/06/2023
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
8 %		71 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>
232.406.759.506	76.476.402.185		32,91 %

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

##### Ejecución Física

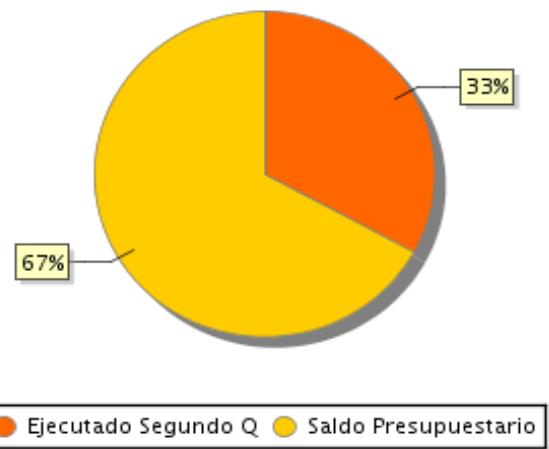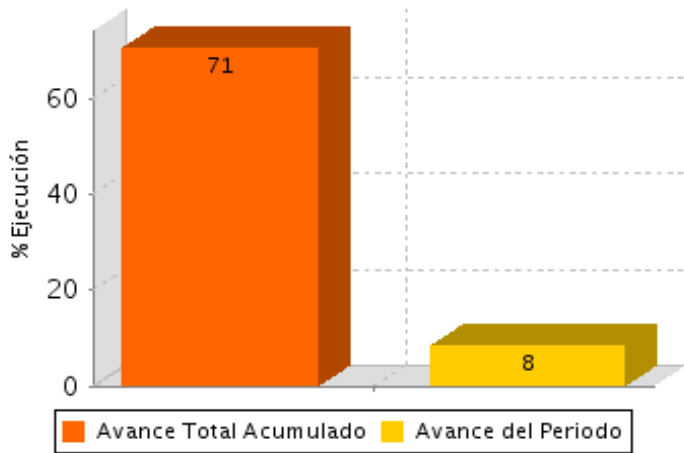

#### SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos, reportó que se realizó la instalación y puesta en marcha de la infraestructura de conectividad en 464 establecimientos educativos, en los departamentos de Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Capital, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes y San Pedro.

Se formalizó el Contrato N° 01/22 entre el MEC y la Universidad Autónoma de Asunción (UAA) para el desarrollo del curso de especialización en el uso de las tecnologías de la información y comunicación en las prácticas pedagógicas, con 286 educadores inscriptos.


Se distribuyeron 3.512 notebooks en el marco del llamado con ID 357.401, beneficiando a instituciones de escolar básica, en los siguientes departamentos: Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Guairá, Itapúa, Cordillera, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes y San Pedro y Asunción.

Se contrataron 3 programadores para la gestión en los sistemas integrados en la gestión de las evaluaciones.



<b>Proyecto</b>	Capacitación Apoyo a la ampliación de la jornada escolar.			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
<b>Código SNIP N°</b>	570			
<b>Financiamiento</b>	BID			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	16.823.200	<b>GS.</b>	94.209.920.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
46.059.593.386	48.150.326.614		48,89 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
31/10/2017	10/10/2022		N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional	N/A			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
5 %			36 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
46.884.396.016	4.302.159.762		9,18 %	

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

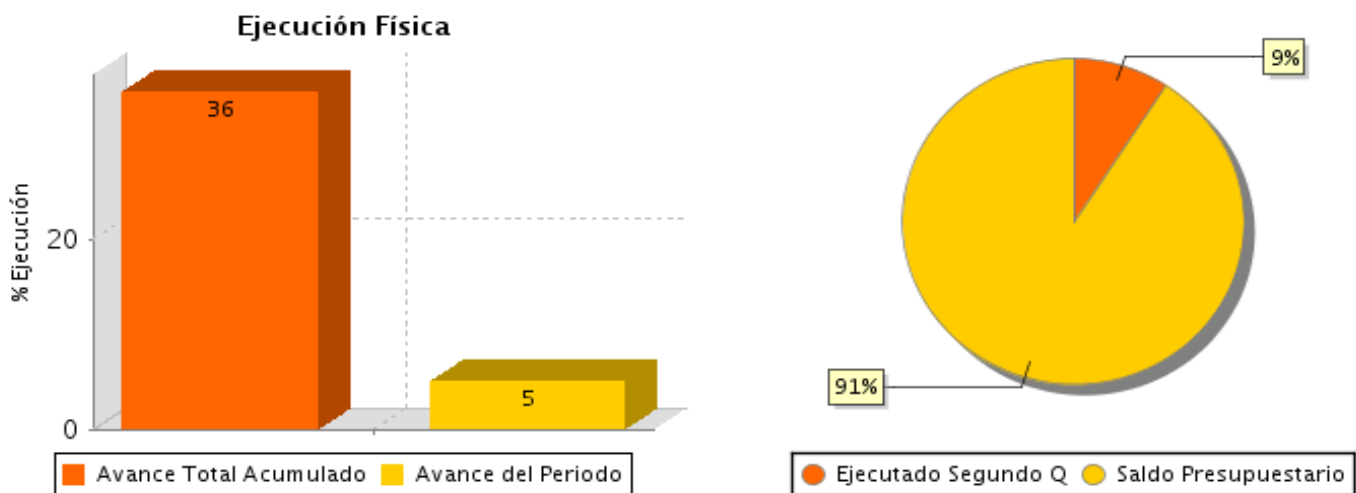

#### SITUACIÓN ACTUAL


La Unidad Ejecutora de Proyectos, reportó que en este periodo se aprobaron los informes finales de los contratos para la elaboración de guías docentes y cuadernos de aprendizaje para estudiantes en el área curricular de lengua castellana/guaraní y matemáticas; para la revisión didáctica de materiales educativos y para la consultoría para garantizar la calidad, la funcionalidad y la pertinencia de materiales. Se distribuyeron 1670 SMART TV, en instituciones de los departamentos de Capital y Central. Se realizó la rendición de cuentas de las instituciones que recibieron transferencias para compra de mobiliarios y readecuación de infraestructura. Se encuentra en etapa de aprobación de informes finales la elaboración de materiales educativos sobre el vínculo entre la escuela, la comunidad y la familia; y la contratación de consultor para el diseño gráfico y edición de materiales para familia y consejo escolares. Se contrató a un especialista en adquisiciones. Se encuentra en proceso de convocatoria el llamado de adquisición de equipos informáticos. La auditoría externa cuenta No objeción del BID sobre la presentación de los estados financieros auditados 2021.





<b>Proyecto</b>		Mejoramiento Condiciones de transporte de estudiantes			
<b>OEE</b>		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
<b>Código SNIP N°</b>		571			
<b>Financiamiento</b>		BID			
<b>Costo del Proyecto</b>		<b>USD</b>	3.176.800	<b>GS.</b>	17.790.080.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>		<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
0		17.790.080.000		0,00 %	
<b>Fecha de Inicio</b>		<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
31/10/2017		10/10/2022		N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>					
Nacional	N/A				
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>		
0 %			2 %		
<b>PGN Vigente en Gs.</b>		<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
3.181.829.424		0		0,00 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

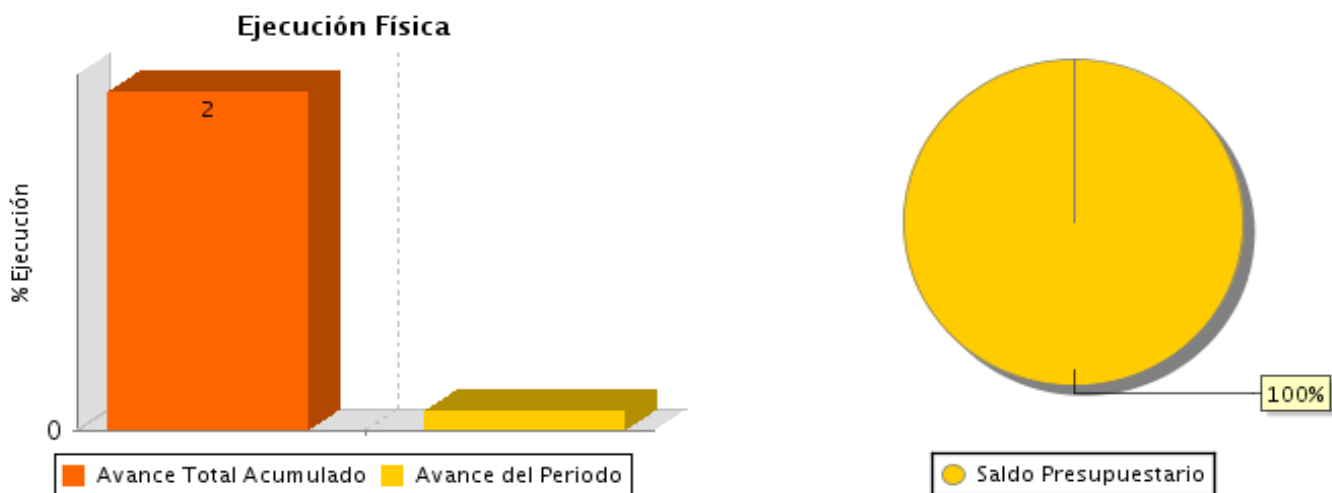


### SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos, reportó que la consultoría de "Estudio de viabilidad y propuesta de soluciones de transporte escolar", se encuentra con un retraso en el proceso de convocatoria ID N° 409.885 para 101 escuelas rurales focalizadas en el proyecto, debido a una rectificación en la resolución de inicio del llamado. Una vez concluida la consultoría se implementaría el servicio y la evaluación económica de las opciones de transporte.



<b>Proyecto</b>	Fomento y apoyo operat. para la ejec. de proy. del MEC			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
<b>Código SNIP N°</b>	709			
<b>Financiamiento</b>	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	N/A	<b>GS.</b>	58.994.841.017
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
33.171.258.870	25.823.582.147		56,23 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
31/01/2017	30/06/2019		31/12/2025	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional	N/A			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
3 %			63 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
9.625.273.000	3.855.405.861		40,06 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

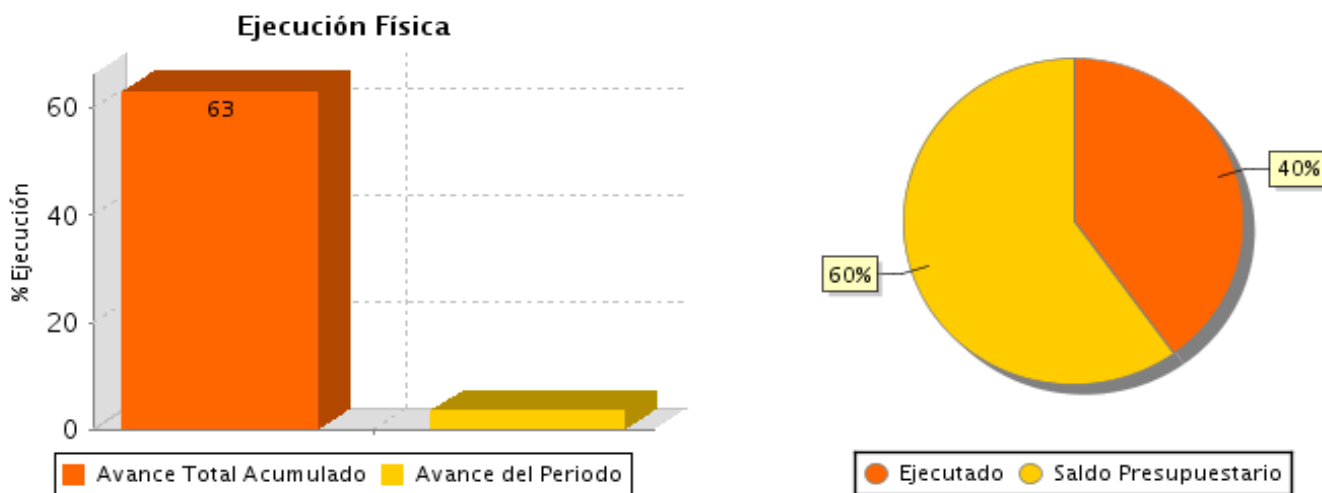

### SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se contrataron los siguientes servicios: mantenimiento de vehículos, profesionales de auditoría externa con la firma Morales Paoli para realizar la auditoría financiera al proyecto Apoyo Operativo, publicación, servicios básicos, provisión de agua mineral, de resmas de papel y útiles de oficina.

Por otro lado el convenio con PETROPAR, los contratos por alquileres siguen vigentes y son abonados regularmente, se realizó el pago de la habilitación por la flota de vehículos que posee la Unidad y el pago de salarios a funcionarios permanentes y contratados.


Se encuentran pendientes de adjudicación los siguientes llamados a licitaciones: ID 415.869 adquisición de cubiertas, ID 406.748 seguro de vehículo, e ID 406.747 alquiler de fotocopidora.

Se entregó al FEEI el monitoreo externo y rendición de cuentas del segundo informe semestral del 2021 (julio a diciembre) y el informe del primer trimestral del 2022 .



<b>Proyecto</b>		Difusión Diseño de la Estrategia de Transformación Educ			
<b>OEE</b>		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
<b>Código SNIP N°</b>		779			
<b>Financiamiento</b>		Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.			
<b>Costo del Proyecto</b>		<b>USD</b>	N/A	<b>GS.</b>	23.364.033.126
<b>Avance Financiero en Gs.</b>		<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
12.938.928.059		10.425.105.067		55,38 %	
<b>Fecha de Inicio</b>		<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
24/10/2017		24/12/2018		31/12/2022	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>					
Nacional	N/A				
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>		
11 %			62 %		
<b>PGN Vigente en Gs.</b>		<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
821.481.674		58.900.000		7,17 %	

**AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO**

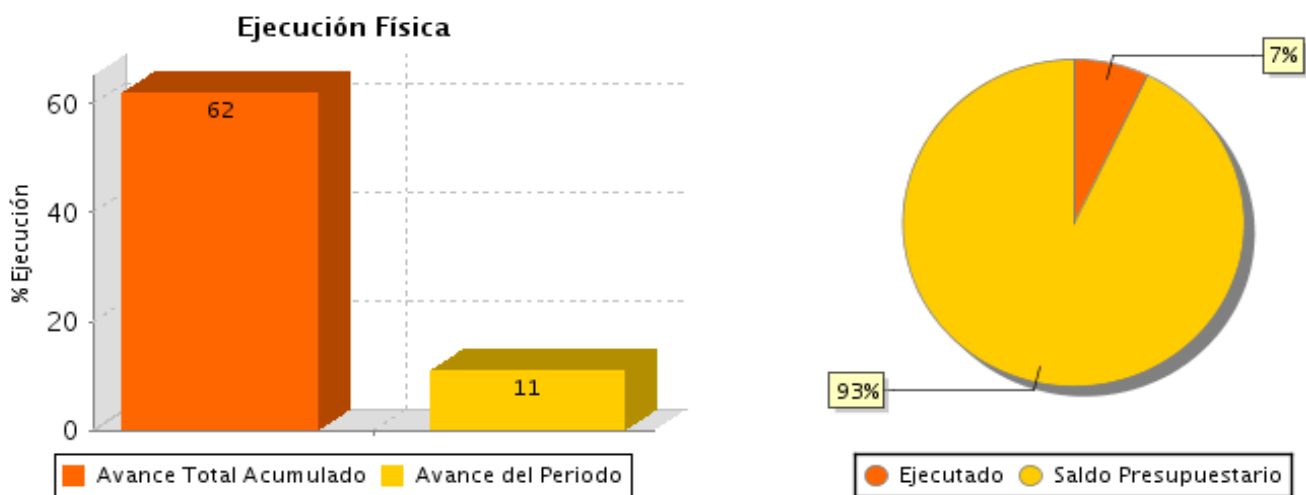


**SITUACIÓN ACTUAL**

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos, reportó que 5 especialistas nacionales colaboraron en la facilitación y sistematización de las actividades de participación y en el diseño del Plan Nacional de Transformación Educativa y la Hoja de Ruta. Fue contratada una empresa consultora para el diseño del PNTE y la hoja de ruta. El equipo estuvo a cargo del diseño y producción de materiales audiovisuales, diseño y difusión de boletines, gacetillas, flyers, producción y edición del programa de televisión semanal y actualización de la página web del proyecto. Los informes de auditoría externa de los periodos 2018, 2019 y 2020 fueron entregados y aprobados. Se presentó al CAFEEI el plan de cierre del proyecto que fue aprobado.



<b>Proyecto</b>	Mejoramiento de infraest. y equipam. de Colegios Técnicos		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS		
<b>Código SNIP N°</b>	972		
<b>Financiamiento</b>	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	N/A	<b>GS.</b> 208.780.522.064
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
0	208.780.522.064		0,00 %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
21/01/2022	31/07/2025		N/A
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
3 %		3 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
3.557.370.662	0	0,00 %	

**AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO**

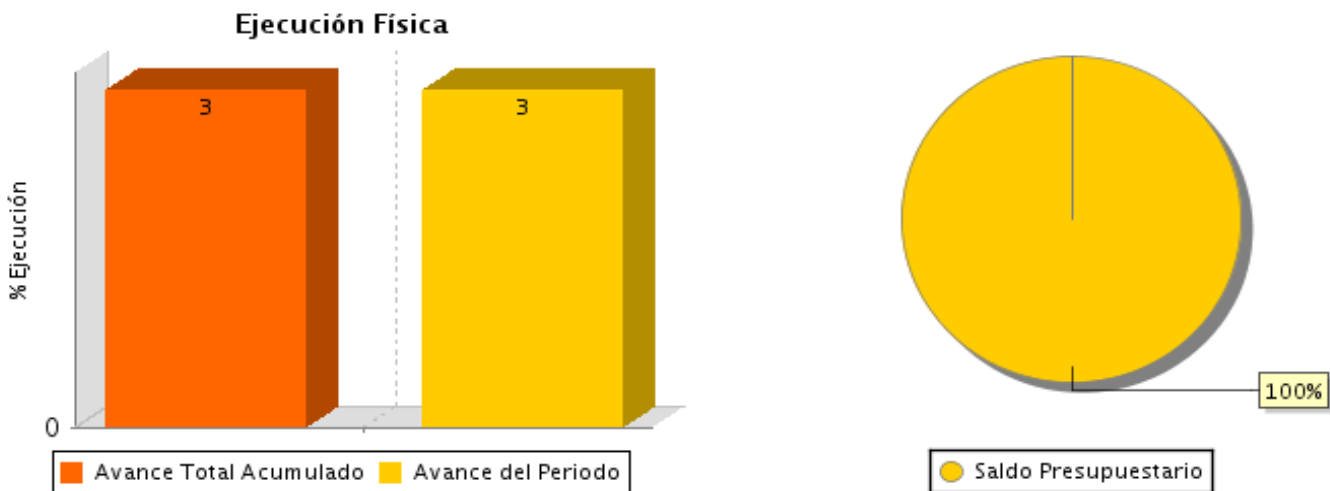

**SITUACIÓN ACTUAL**

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2022, la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se realizaron las gestiones administrativas para el llamado a contratación de Consultoría para el Relevamiento edilicio y proyecto ejecutivos, así como la contratación de supervisores de proyectos.
