



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS


Mayo - Agosto 2023

 Sistema Nacional
de Inversión
Pública



Proyecto	Ampliación y Reparación de 822 Establecimientos Educativos en Asunción y 17 Departamentos			
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°	325			
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	578.568.001.943
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
507.247.532.527	71.320.469.416		87,67 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
11/09/2014	11/09/2017		30/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
8 %			88 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
77.329.209.287	11.097.620.000		14,35 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

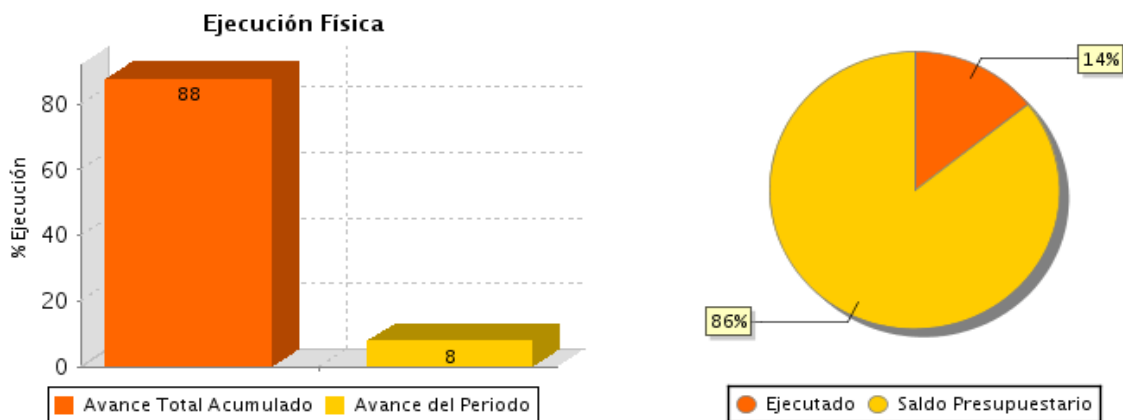


SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre la Unidad Ejecutora de Proyectos informó que 8 establecimientos educativos se encuentran terminados con sus respectivas actas de recepción definitivas, en los Departamentos de Paraguarí e Itapúa.

Proyecto		Capacitación a los Educadores de todos los niveles y modalidades		
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°		387		
Financiamiento		Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS. 272.530.950.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
189.754.373.443		82.776.576.557		69,63 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
30/12/2014		30/06/2018		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
4 %			90 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
14.775.799.023		6.385.953.595		43,22 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

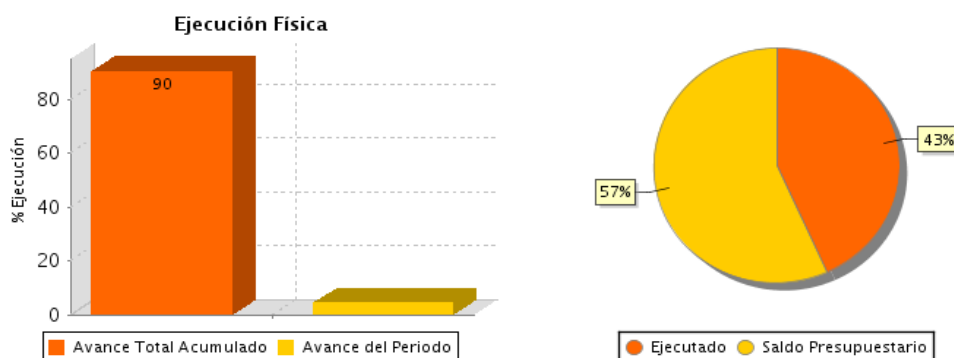

SITUACIÓN ACTUAL


En el presente cuatrimestre la Unidad Ejecutora reportó que concluyeron los cursos de Gestión del currículum por competencias e innovaciones en la enseñanza de matemática, ciencias y lenguaje, con 186 docentes participantes; Actualización en el Modelo basado en competencias, con 435 docentes participantes; Actualización en Trabajo y Tecnología, con 3125 docentes; Actualización en Lengua Inglesa, con 686 docentes; Asesoría Pedagógica en Redes Colaborativas con base en la priorización curricular, con 9168 docentes y 2043 tutores participantes; Técnico Docente en Planificación, Monitoreo y Seguimiento, con 2092 docentes participantes.

Se realizó el pago a la firma Classic Mobles, por la provisión de mobiliario (50 armarios con puertas y 23 sillas estándar para docentes) a 48 Instituciones de Formación Docente en los Departamentos de Amambay, Concepción, Ñeembucú, Guairá, Capital, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Canindeyú, Itapúa, Boquerón, Paraguari, Cordillera, Misiones y Pdte. Hayes.

Por otro lado, se realizó el pago por la dotación de equipos informáticos y sus accesorios a las firmas Data Systems, Infosystem y Emprendimientos del Sur, para la entrega a Direcciones Departamentales e Instituciones de Formación Docente a nivel país.

Proyecto	Ampliación en la atención educativa desde la gestación hasta 5 años		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	388		
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 407.488.286.993
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
346.920.804.779	60.567.482.214		85,14 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
24/05/2015	31/12/2018		31/03/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
4 %		86 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
81.234.599.971	34.207.933.176		42,11 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

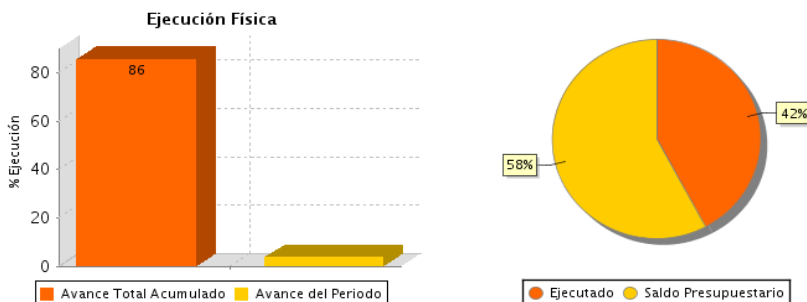

SITUACIÓN ACTUAL

En este segundo cuatrimestre, la Unidad Ejecutora reportó que se gestionó la adenda de monto y plazo con la firma PROEL para la finalización de las obras .LPN/SBE N° 03/2020 ID N° 387.474.

El Llamado LPN N° 01/22 "Construcción de 49 espacios educativos para Primera Infancia" - Plurianual - ID 406.738, se encuentra con 13 obras iniciadas y en proceso de ejecución.

Se contrataron 23 docentes titulares, 555 maestras mochileras, 796 docentes auxiliares, 51 educadoras comunitarias y 386 psicólogos de educación inicial, y también se han presentado renuncias en los distintos cargos

Asimismo, se realizaron talleres de formación y capacitación a los recursos humanos de las instituciones focalizadas de la modalidad formal, además de acompañamiento pedagógico a docentes, educadoras comunitarias, directores y padres de familia, de las instituciones focalizadas de los departamentos de Canindeyú, Caaguazú y Central.

Se efectuaron orientaciones administrativas de forma virtual sobre uso de materiales educativos existentes para niños de 3 y 4 años, distribución de materiales educativos para prejardín y jardín en los departamentos de Amambay, Concepción, San Pedro, Pdte.Hayes, Central, Caaguazú,Boquerón.


Por otro lado, se habilitó el Espacio de Atención Socio educativo en Contexto de Encierro EASCE "Corazones Felices" dependiente de la Escuela Básica N° 4617 "Divino Niño", del Departamento de Itapúa.

Se canceló el llamado para la campaña de difusión. Además se presentaron borrador de informe de la firma auditora encargada del periodo 2022 e informes finales de auditoría financiera de los periodos 2020 y 2021 por parte de la firma adjudicada.

Se distribuyeron 185 kits de limpieza a las instituciones beneficiadas por el proyecto y se canceló contrato con la firma adjudicada para la entrega de botiquines de primeros auxilios. También fueron distribuidas 229 canastas básicas (textos referentes a orientación y estimulación para educadores y psicólogos de educación inicial) a las instituciones focalizadas.

Proyecto	Investigación Evaluaciones estandarizadas de desempeño a estudiantes		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	389		
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 63.790.750.573
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
61.045.064.652	2.745.685.921		95,70 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
30/12/2014	30/12/2021		31/07/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
2 %		96 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
4.498.595.210	2.132.909.289		47,41 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

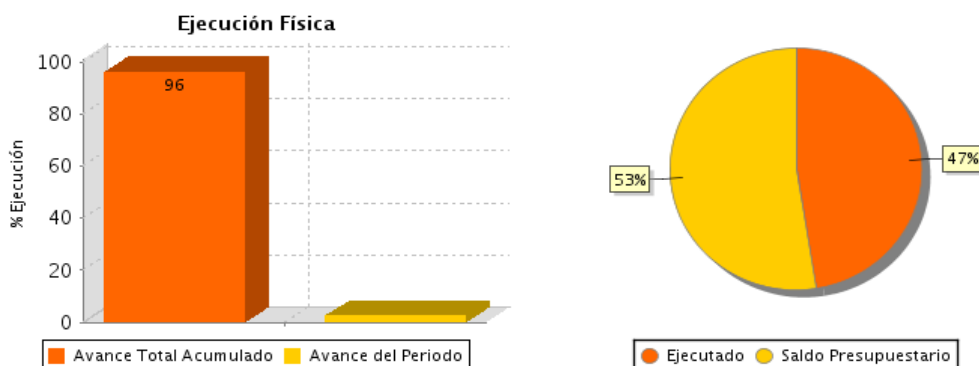

SITUACIÓN ACTUAL


Se realizó la aplicación de las pruebas de la evaluación enlace a nivel nacional a 142.000 estudiantes, 8.000 docentes y 2.300 instituciones educativas del 4º y 7º grado de la Educación Básica Bilingüe y del 1º y 3º curso de la Educación Media. Además, se efectuó la Crítica de instrumentos de evaluación (pruebas cognitivas y cuestionarios) del 4º grado en Capital, Concepción y San Pedro, y del 7º grado en Capital.

Por otro lado, se realizó la divulgación de los resultados de las pruebas PISA 2022 aplicadas a estudiantes de 15 años en las instituciones educativas de gestión oficial, privadas y subvencionadas.

Además, se participó de los siguientes procesos preparatorios de: diseño de las evaluaciones regionales Erce, para la evaluación PISA, el diseño del estudio y traducción y adaptación de los instrumentos de evaluación de las áreas de lectura, matemática y ciencias; así como de factores asociados al aprendizaje a estudiantes, el diseño del estudio y adaptación de los instrumentos de evaluación regional ERCE, para la aplicación piloto a estudiantes del 3.º y 6.º grado de la Educación Básica Bilingüe en las áreas de Lectura, Matemática y Ciencias Naturales.

Proyecto	Mejoramiento de condiciones de aprendizajes con incorporación de TIC		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	394		
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 649.737.299.524
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
570.867.534.859	78.869.764.665		87,86 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
25/11/2015	25/12/2019		30/06/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
3 %		77 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
97.271.880.307	24.350.896.445		25,03 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

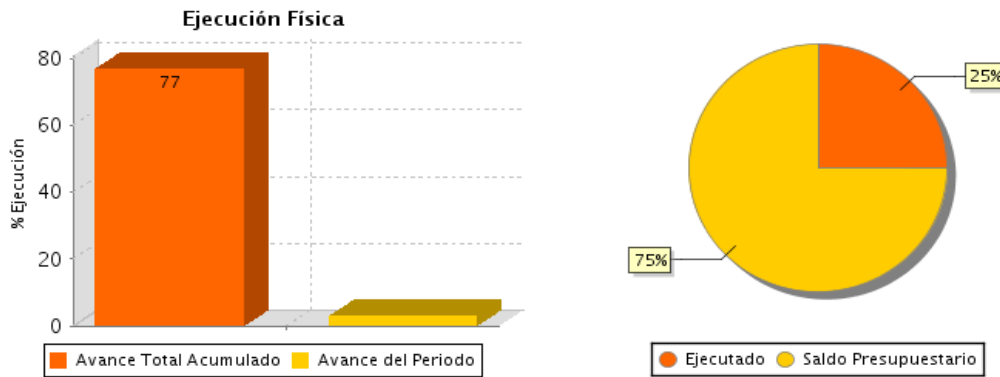

SITUACIÓN ACTUAL


En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2023 la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se recibieron en depósito los equipos de conectividad en el marco del llamado a licitación "Ampliación, suministro, instalación y puesta en servicio de infraestructura de conectividad en instituciones educativas del Paraguay - Plurianual." ID 417.928.

Se realizó conexión a internet mediante fibra óptica a 67 establecimientos educativos en los departamentos de Alto Paraguay, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Capital, Central, Concepción, Misiones, Ñeembucú, Paraguari, Presidente Hayes y San Pedro, mediante el llamado "Contratación de servicios de conectividad para establecimientos educativos del MEC - Plurianual" ID 417.295.

Además se efectuó la distribución total de notebooks, carritos móviles y proyectores a 48 instituciones de educación inclusiva de los siguientes Departamentos: Central, Capital, Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Ñeembucú, Canindeyu, Amambay, Presidente Hayes, beneficiadas con el llamado "Adquisición de laboratorios móviles de informática y elementos periféricos adaptados para instituciones educativas de educación inclusiva - Plurianual ID 406.275

Proyecto	Capacitación Apoyo a la ampliación de la jornada escolar.		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	570		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	16.823.200	GS. 141.656.054.468
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución
81.896.988.127		59.759.066.341	57,81 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin	Fecha de Prórroga
31/10/2017		10/05/2024	N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
12 %		52 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
27.355.815.974	9.699.690.364	35,46 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

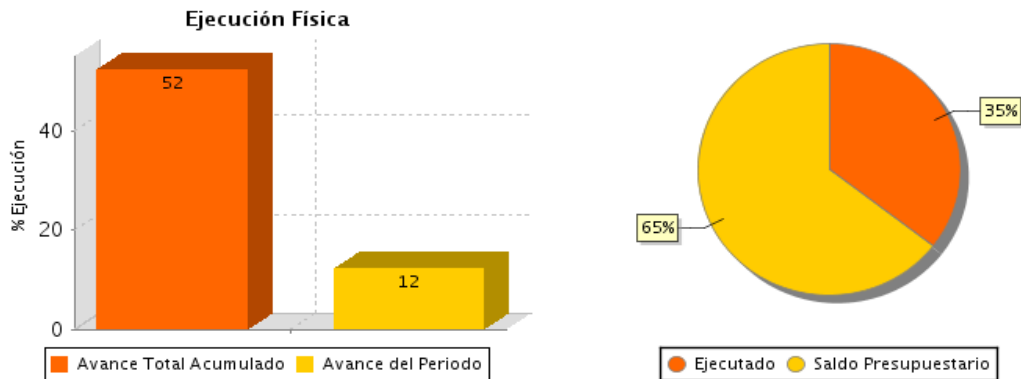

SITUACIÓN ACTUAL


En el segundo cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, la Unidad Ejecutora informó que se complementó mediante una adenda la adquisición, provisión y distribución de 220 notebooks adicionales a las 1200 previstas inicialmente dirigidas a docentes y 112 SMART TV de 55" adicionales a los 1670 previstos inicialmente, distribuidas en las 300 instituciones educativas focalizadas en el proyecto.

Se encuentra en ejecución la consultoría para la elaboración de una guía docente orientadora para la formación de los consejos escolares en instituciones focalizadas.

En lo referente al llamado para la adquisición de equipos informáticos, se declaró desierto por segunda vez y se volverá a realizar el llamado con ajustes en el siguiente cuatrimestre.

Proyecto	Mejoramiento Condiciones de transporte de estudiantes			
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°	571			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	3.176.800	GS.	17.790.080.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
148.947.828		17.641.132.172		0,84 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
31/10/2017		10/05/2024		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0 %			3 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
11.683.184.026		148.947.828		1,27 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

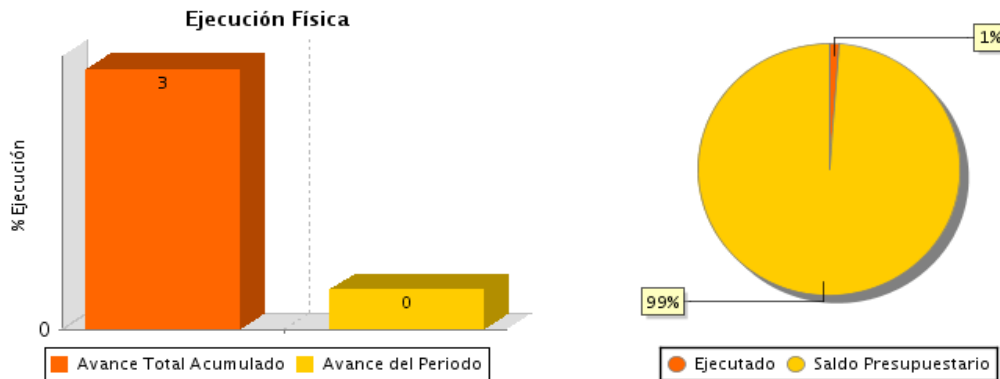


SITUACIÓN ACTUAL

La unidad ejecutora reportó que en el presente cuatrimestre se firmó contrato N° 15/2023 con la firma Ernst & Young Paraguay Auditores y Asesores de Negocios S.R.L. para la prestación del servicio "Consultoría y Viabilidad y propuesta de soluciones de transporte".

Proyecto	Fomento y apoyo operativo para la ejecución de proyectos del MEC		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	709		
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 58.994.841.017
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
41.567.742.205	17.427.098.812		70,46 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
31/01/2017	30/06/2019		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
8 %		74 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
12.912.475.212	6.007.121.813		46,52 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

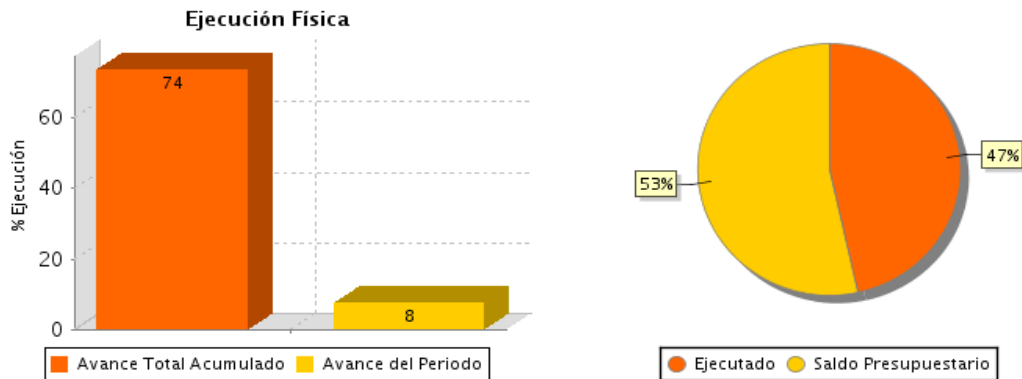

SITUACIÓN ACTUAL


En el presente cuatrimestre se realizaron los pagos mensuales a los contratados y comisionados (internos y externos) que cumplen las funciones en la Unidad Ejecutora de programas y proyectos en las dependencias de Coordinación de Apoyo a la Gestión, Coordinación de Administración y Finanzas, Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones y Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones.

Además se efectuaron pagos por servicios de mantenimiento de vehículos, reparación, compra de cubiertas y cámara de aire, adquisición de la provisión de agua; recarga de extintores, servicio de auditoría y el servicio de limpieza.

Por otro lado, se ejecutaron contratos de servicios de publicaciones, convenio con Petropar; alquiler de las oficinas administrativas, mantenimiento de equipos informáticos y el alquiler de fotocopiadoras, También se entregaron los informes a la dirección Ejecutiva del FEEI y comité técnico.

Proyecto	Mejoramiento de infraestructura y equipamiento de Colegios Técnicos		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	972		
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 208.780.522.064
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
204.000.000	208.576.522.064		0,10 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
21/01/2022	31/07/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		3 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
53.848.672.301	204.000.000		0,38 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

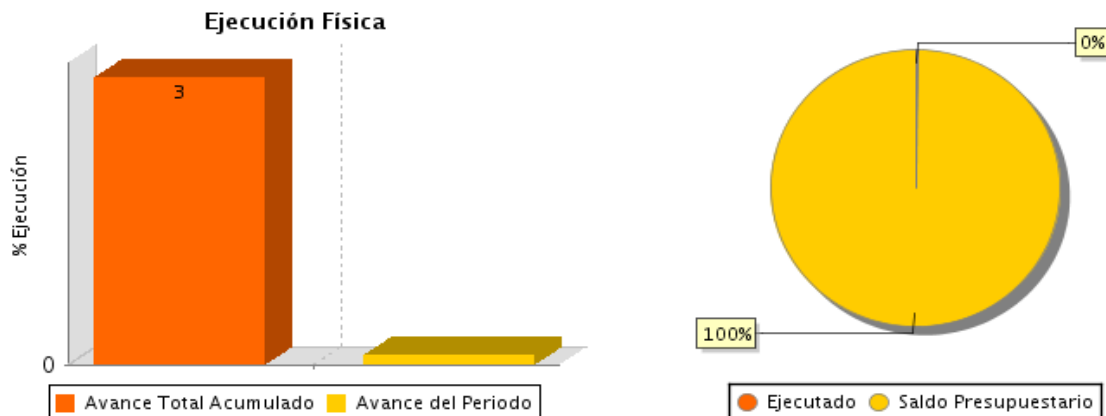


SITUACIÓN ACTUAL

La Consultoría para el relevamiento y diseño de los 151 colegios técnicos, fue adjudicada a través del llamado ID N° 416.036 al Consorcio de Proyectos Ejecutivos (CPE).

Proyecto	Capacitación de las competencias profesionales de educadores		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	1071		
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 175.000.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
0	175.000.000.000		0,00 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
21/4/2023	21/4/2027		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		0 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
26.220.000.000	0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

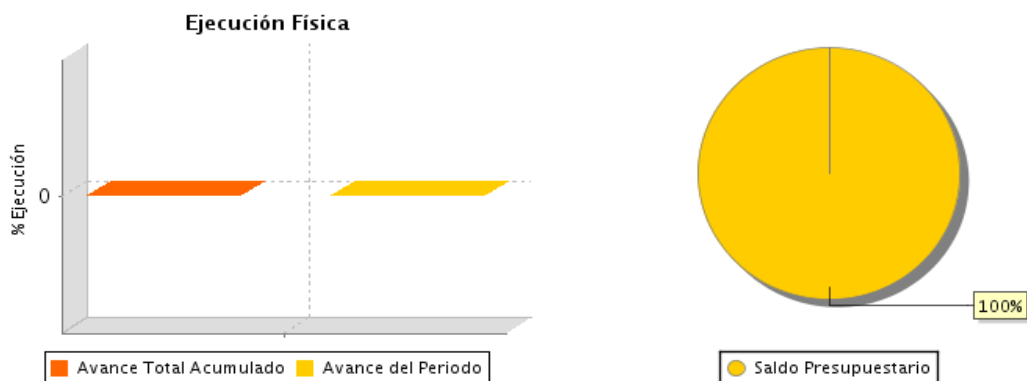


SITUACIÓN ACTUAL

El presente proyecto es nuevo, es financiado por el (FEEI) Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educación. La Unidad Ejecutora reportó que se encuentra en fase de confirmación de términos de referencia de los cursos a ser implementados, así como los llamados a ser realizados,

Proyecto	Mejoramiento de los entornos de aprendizaje, establecimientos escolares e instituciones		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	1073		
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.-BIRF		
Costo del Proyecto	USD	170.245.000	GS. 1.242.788.502.873
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
0	1.242.788.502.873	0,00 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
1/7/2023	1/7/2028	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		0 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
58.207.750.000	0	0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

El presente proyecto es nuevo, es financiado por 2 Organismos Financiadores que son el (FEEI) Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación y el (BIRF), Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

La Unidad Ejecutora reportó que el proyecto se halla actualmente en un proceso de rediseño de su estrategia para la implementación.
