



INFORME DE MONITOREO FÍSICO MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Setiembre – Diciembre 2021

 Sistema Nacional
de Inversión
Pública





**TETÁ VIRU
MOHENDAPY**
Motenondcha
Ministerio de
HACIENDA

**TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL**

SNIP Sistema Nacional
de Inversión
Pública


Proyecto	SP FOCEM-LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD FORT. DEL LAB. DE CONTROL DE ALIMENTOS			
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°	13			
Financiamiento	FOCEM			
Costo del Proyecto	USD	5.261.440	GS.	25.428.539.520
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
25.798.129.034	-369.589.514		101,45 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
28/05/2007	28/05/2009		N/A	

Ubicación geográfica del Proyecto

Alcance Nacional

Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
7,6 %		94,78 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021	Porcentaje Ejecutado	
5.870.980.142	539.286.568	9,18 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

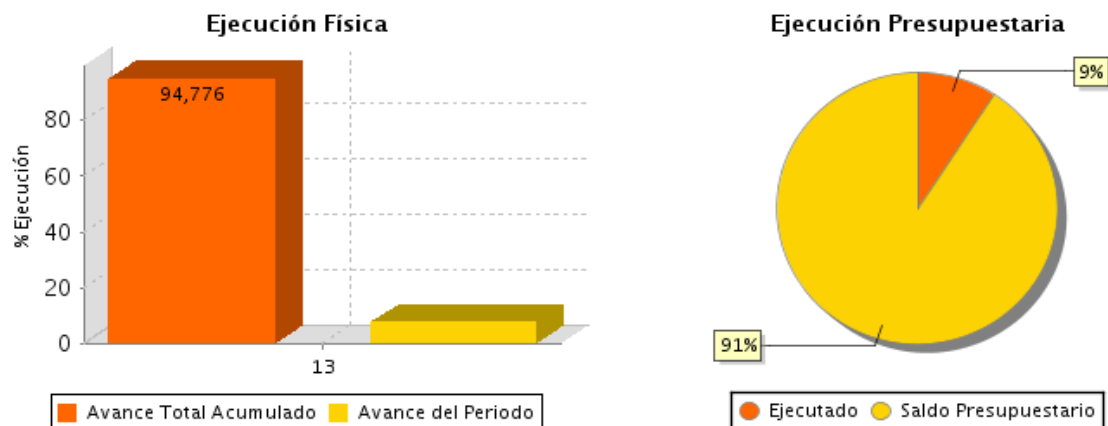

SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informó que en el tercer cuatrimestre prosiguió la operativización del Laboratorio y se realizaron todas las acciones tendientes a la mejora y ajustes en imperfecciones observados por la Fiscalizadora, Auditoría Externa y Técnicos del SENACSA, a los efectos de recepcionar la obra tal como establecen las Especificaciones Técnicas del Contrato de la construcción de Laboratorio de Bioseguridad NSB2A. En cuanto a la adquisiciones se han recepcionado la totalidad de los equipos informáticos y se han iniciado las acciones para el inicio del llamado Ad Referéndum de los equipos móviles de laboratorio, así también, se han iniciado las capacitaciones y entrenamientos de los técnicos laboratoristas del SENACSA.



**TETÁ VIRU
MOHENDAPY**
Motenondcha
Ministerio de
HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP py
Sistema Nacional
de Inversión
Pública


Proyecto	Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en la Región Oriental			
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°	567			
Financiamiento	FIDA			
Costo del Proyecto	USD	22.400.000	GS.	121.400.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
12.021.731.264	109.378.268.736		9,90%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/10/2018	08/11/2024		N/A	

Ubicación Geográfica del Proyecto

Caaguazú, Canindeyú, Concepción, San Pedro

Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total	
2,42%	8,36%	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021	Porcentaje Ejecutado
32.699.714.076	2.481.762.310	7,59%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

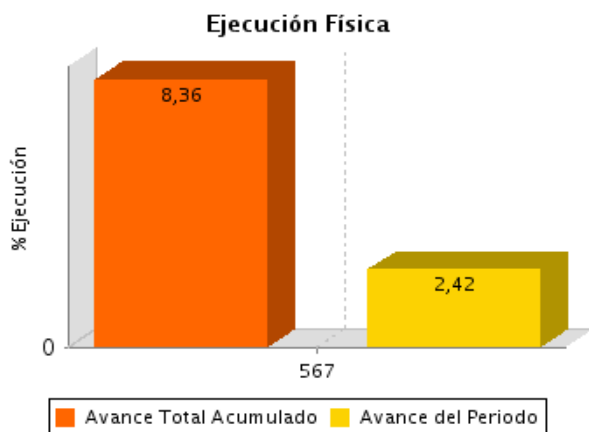

SITUACIÓN ACTUAL

Dentro del marco del avance físico en el tercer cuatrimestre de 2021, se aprobaron 1 Plan de Desarrollo Comunitario, que se encuentra en Caaguazú, Distrito de Yhu, 1 Plan de Negocio aprobado, que se encuentra en Caaguazú, Distrito de Raúl A. Oviedo. Además se aprobaron 7 Planes de Fortalecimientos: 1 Plan se encuentra en Caaguazú, distrito de Raúl A. Oviedo, 1 Plan se encuentra en Caaguazú, distrito de Juan M. Frutos, 1 Plan se encuentra en San Pedro, distrito de Gral. Aquino, 2 Planes se encuentran en Caaguazú, distrito de La Pastora, 1 Plan se encuentra en Caaguazú, distrito de Nueva Londres, 1 Plan se encuentra en Caaguazú, distrito de Carayao.



Proyecto	Restauración y Manejo Sostenible de Recursos Naturales			
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°	664			
Financiamiento	KFW			
Costo del Proyecto	EUR	8.463.250	GS.	49.024.639.459
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
0	49.024.639.459		0%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
13/09/2017	13/02/2022		N/A	


Ubicación Geográfica del Proyecto

Alcance Nacional

Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total	
0%	0%	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021	Porcentaje Ejecutado
18.845.542.000	0	0,00

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

Ejecución Física



Ejecución Presupuestaria



SITUACIÓN ACTUAL

En el tercer cuatrimestre no se registró avance debido a la falta de disponibilidad de los recursos financieros correspondientes a la contrapartida, que conforme al Anexo 2 del Cuadro de Costos Estimados y Financiamientos, del Acuerdo Separado firmado entre el MAG y el KFW, contempla sobre dichos recursos los gastos correspondientes a la operatividad y asistencia técnica del proyecto. Se prevé el inicio de la ejecución, para el primer cuatrimestre del año 2022. En ese sentido se realizó la precalificación para la contratación de la consultoría principal del proyecto, y se cuenta con la No Objeción ,por parte del Organismo Financiador para dicho proceso.



TETÁ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública


Proyecto	Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Cadenas de Valor en la Región Oriental (FASE II)			
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°	708			
Financiamiento	FIDA			
Costo del Proyecto	USD	10.500.000	GS.	82.398.400.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
19.948.507.639	62.449.892.361		24,21%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/10/2018	31/10/2023		N/A	

Ubicación Geográfica del Proyecto

Alcance Nacional

Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total	
1,28%	8,69%	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021	Porcentaje Ejecutado
26.380.989.090	7.610.145.632	28,85%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

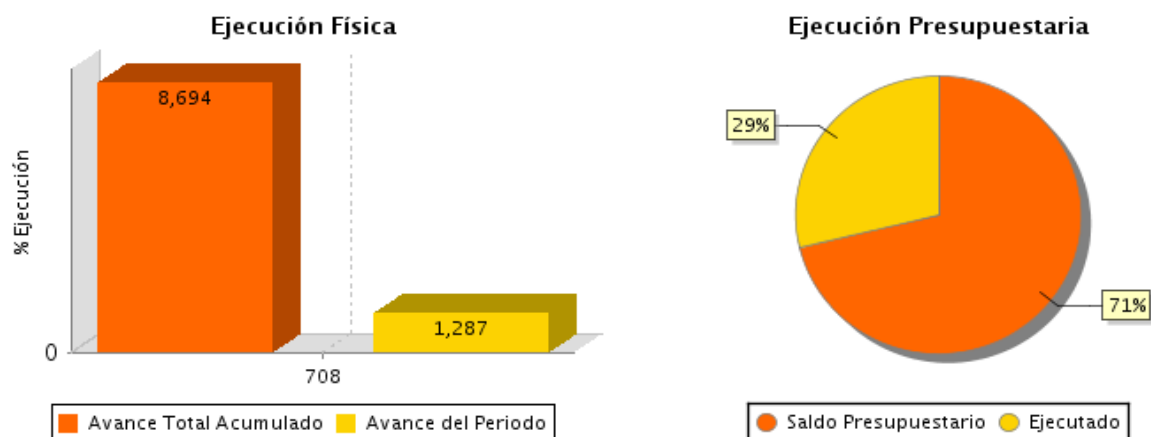

SITUACIÓN ACTUAL

En el tercer cuatrimestre 2021 se ejecutaron 4 Planes de Micro Capitalización Vulnerables. Estos planes están distribuidos en la Región Oriental." 1 Plan se encuentra en Itapúa, distrito de Mayor Otaño, 1 Plan se encuentra en Itapúa, distrito de Gral. Artigas, 1 Plan se encuentra en Concepción, distrito de Concepción, 1 Plan se encuentra en Paraguari, distrito de San Roque Gonzalez. Se realizaron gestiones ante las Organizaciones Rurales, para ajustar los diferentes tipos de documentos que son requeridos por parte de los organismos de control, a fin de que las mismas puedan acceder al financiamiento.




TETÁ VIRU MOHENDAPY
Motenondcha
Ministerio de HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP py
Sistema Nacional de Inversión Pública

Proyecto	Implementación del Sistema de Censo y Encuestas Agropecuarias		
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
Código SNIP N°	714		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	15.000.000	GS. 88.935.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
14.096.221.172	74.838.778.828		15,85%
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
25/05/2019	25/05/2024		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Alcance Nacional			
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
25,11%		38,50%	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021	Porcentaje Ejecutado	
57.900.606.030	9.488.574.499	16,39%	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

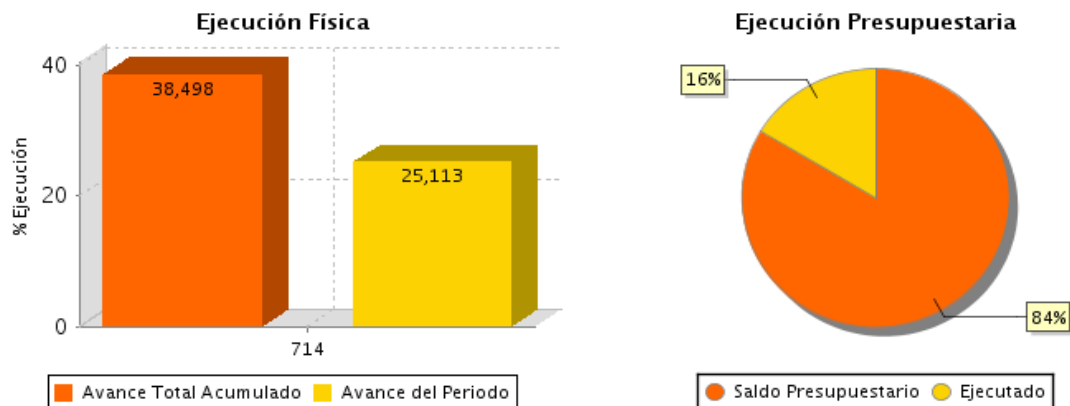

SITUACIÓN ACTUAL


En el tercer cuatrimestre 2021 se actualizó la cartografía digital de los 17 departamentos del país. Se efectuó el diseño y validación del cuestionario censal, diseño y desarrollo del sistema informático para el procesamiento de los datos. Se realizó la difusión de la metodología del operativo censal. Se capacitaron a todos los involucrados en la prueba piloto del censo.

Se realizó el levantamiento censal de la prueba piloto en tres distritos del departamento de Caaguazú. Se capacitó a funcionarios del proyecto en la operación de programas informáticos de procesamiento de datos, transmisión de datos y otros para la producción de estadísticas agropecuarias, acompañado de adecuaciones de las oficinas y provisión de equipos idóneos. Además se realizaron capacitaciones en la interpretación de imágenes satelitales y metodologías de estimaciones. Se realizaron protocolizaciones de convenios con instituciones con experiencia en el tema. Se contrataron consultorías para la realización de estudios temáticos, y para la realización de la auditoría interna del proyecto.



Proyecto	Mejoramiento de la inserción a mercados R. Oriental		
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
Código SNIP N°	904		
Financiamiento	BIRF		
Costo del Proyecto	USD	100.000.000	GS. 635.000.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
195.222.730.655	439.777.269.345	28%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
26/03/2020	30/06/2026	N/A	
Ubicación del Proyecto			
Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Neembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
18,15%	33,85%		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021	Porcentaje Ejecutado	
137.556.606.943	98.952.859.065	71,94%	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

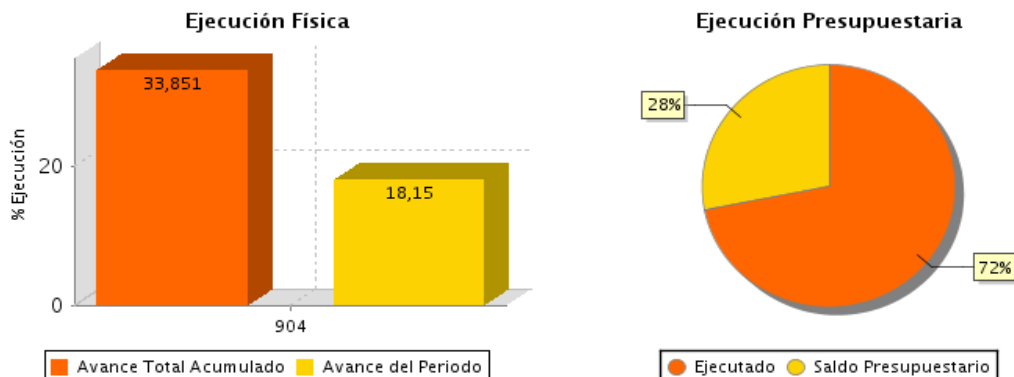

SITUACIÓN ACTUAL

En el tercer cuatrimestre de 2021, fueron identificadas y analizadas por los especialistas en Cadenas de Valor 16 productos: yerba mate, productos hortigranjeros, leche, cebolla, frutilla, tomate, sésamo, caña de azúcar convencional, papa, frutihortícola, miel de abeja, productos agropecuarios (feria), caña de azúcar orgánica, lana de oveja, soja y maíz. Así también, se brindó apoyo a 7 organizaciones de productores para gestiones de apertura de RUC y de cuentas bancarias. Se contrató un especialista en cadena de valor, y se incorporaron 9 técnicos extensionistas, los cuales brindaron asistencia a comunidades indígenas. Se realizaron 21 capacitaciones dirigidas a los productores organizados en los departamentos de: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Alto Paraná. Central. Neembucú, Amambay y Canindeyú. Se adjudicaron 10 llamados a licitaciones, referentes a seguro de vehículos para el proyecto, servicios de difusión, comunicación e impresiones, de mantenimiento y reparación para las oficinas, adquisición de 130 Motocicletas, 40 vehículos, obras de remodelación y adecuación de oficinas del MAG, adquisición de equipos informáticos, mobiliarios de oficinas, y de pasajes aéreos internacionales. Actualmente la Unidad Ejecutora de Proyectos cuenta con un plantel de 59 personas (personal técnico y administrativo), de los cuales 31 son funcionarios contratados y 28 son funcionarios permanentes afectados al proyecto. El Sistema contable y gestión de proyectos, se encuentra en funcionamiento mediante la contratación de una consultoría individual, encargada del diseño y puesta en funcionamiento.
