



INFORME DE MONITOREO FÍSICO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Setiembre – Diciembre 2021

 *Sistema Nacional
de Inversión
Pública*





**TETÁ VIRU
MOHENDAPY**
Motenondeha
Ministerio de
HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP py Sistema Nacional
de Inversión
Pública

Proyecto	SP ABAST.DE AGUA. POT.Y SAN.BAS PEQ.COM.RURAL E INDI(FOCEM)			
OEE	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL			
Código SNIP N°	50			
Financiamiento	FOCEM, LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	20.339.133	GS.	99.356.664.705
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
36.410.757.865	62.945.906.840		36,65%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
16/05/2008	16/05/2013		N/A	
Ubicación geográfica del Proyecto				
Alcance Nacional				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,89%			86,11%	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021		Porcentaje Ejecutado	
5.647.056.605	2.951.391.175		52,26%	
AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO				
<p style="text-align: center;">Ejecución Física</p>			<p style="text-align: center;">Ejecución Presupuestaria</p>	
<p>■ Avance Total Acumulado ■ Avance del Periodo</p>			<p>■ Ejecutado ■ Saldo Presupuestario</p>	
SITUACIÓN ACTUAL				
La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.				



TETĀ VIRU MOHENDAPY
Motenondcha
Ministerio de HACIENDA

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública


Proyecto	SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)		
OEE	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		
Código SNIP N°	151		
Financiamiento	BID , LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	30.000.000	GS. 153.822.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
171.535.965.302	-17.713.965.302	111,51 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
20/02/2013	31/12/2017	26/02/2022	

Ubicación del Proyecto

Alcance nacional

Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total	
16,22%	92,9037 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021	Porcentaje Ejecutado
59.641.443.878	43.702.921.429	73,27 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

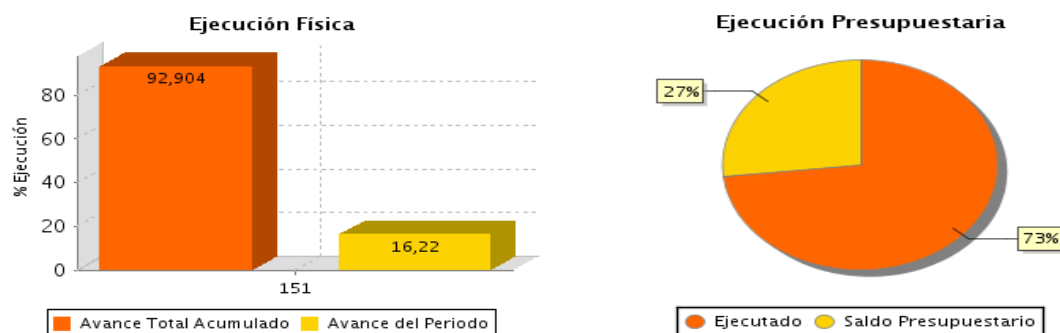

SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informó que los logros más importantes en este periodo fueron: 1. Se completó el equipamiento (equipos médicos y mobiliarios) de las 60 Unidades de Salud Familiar (USF) ubicadas en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Alto Paraná y Caaguazú. 2. Construcción y entrega de equipamientos médicos, mobiliarios y de kits de estimulación temprana para 18 Unidades de Salud Familiar de los Departamentos de Itapúa y Caaguazú. 3. Se entregaron mobiliarios y equipos médicos a 18 USF recién construidas en los Departamentos de Itapúa y Caaguazú. 4. En etapa final de refaccionamiento de la estructura edilicia de dos CEBINFAS (Centro de Bienestar del niño y la familia) ubicados en la Capital. 5. En las últimas semanas de diciembre se inició la entrega de equipos informáticos, electrodomésticos, mobiliarios y kits de estimulación de los 31 CEBINFAS ubicados en diferentes regiones del país. 6. Se entregaron al MSP 4 Servicios de Intervención Temprana (SIT), los mismos fueron construidos en la modalidad contenedores y equipados completamente (equipos médicos, mobiliarios, electrodomésticos, equipos informáticos, equipos de fisioterapia y kits de estimulación) por el proyecto en los hospitales General de San Lorenzo (Centra), General de Santa Rosa de Aguaray (San Pedro), Regional de Concepción y Distrital de San Juan Nepomuceno (Caazapá). Actualmente ya se encuentra en pleno funcionamiento el del Hospital de San Lorenzo. 7. Culminaron capacitaciones en diferentes cursos/talleres para el 2do y 3er nivel de atención en Modelo de Atención Integral del Desarrollo Infantil Temprano (MAIDIT): 46 profesionales de la salud del 2do y 3er nivel fueron capacitados en la Atención a niños con Trastornos del Espectro Autista – TEA y sus familias (modalidad virtual). Se ha logrado la articulación con las autoridades del IPS para la capacitación de sus profesionales de salud para que de manera gradual se logre que los niños menores de 5 años atendidos en los servicios de salud del IPS reciban atención en el marco del MAIDIT, 38 profesionales (pediatras, fisioterapeutas, psicólogos) del área de rehabilitación del Instituto de Previsión Social-IPS recibieron capacitación modalidad presencial en el MAIDIT, el protocolo SIT y el test inventario Battelle, 10 médicos residentes de medicina familiar del Hospital General de San Lorenzo fueron capacitados (modalidad presencial) en Neurodesarrollo, modalidades del MAIDIT y en el tamizaje Battelle para el 3er nivel de atención en MAIDIT; Total: 94 profesionales de la salud (84 para el 2do nivel y 10 para el 3er nivel).



**TETÁ VIRU
MOHENDAPY**
Motenondcha
Ministerio de
HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP py Sistema Nacional
de Inversión
Pública


Proyecto	INVESTIGACIÓN, EDUC. Y BIOTECNOLOGÍA APLICADAS A LA SALUD			
OEE	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL			
Código SNIP N°	153			
Financiamiento	FOCEM, LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	4.528.822	GS.	15.415.634.558
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
11.576.027.748	3.839.606.810		75,09%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
20/12/2011	20/12/2014		N/A	

Ubicación geográfica del Proyecto

Alcance Nacional

Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
7,22%		67,69%	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021	Porcentaje Ejecutado	
10.576.569.750	1.687.718.702	15,96%	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

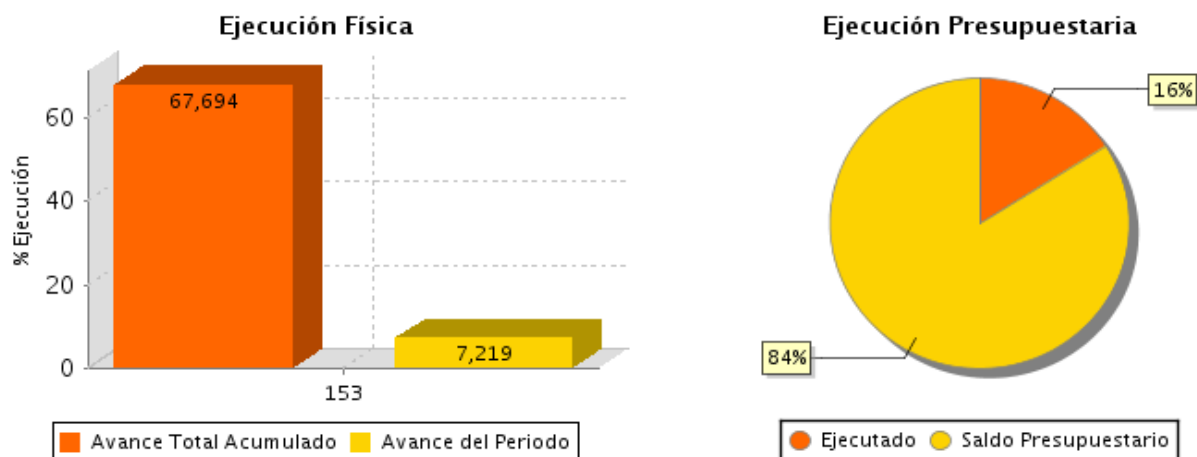

SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.



TETÁ VIRU MOHENDAPY
Motenondcha
Ministerio de
HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP py Sistema Nacional
de Inversión
Pública

Proyecto	CONSTRUCCIÓN SIST.AGUAPOT.Y.SAN.PEQ.CIUD.COM.RURAL.E.INDIG			
OEE	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL			
Código SNIP N°	555			
Financiamiento	BID , GOBIERNO ESPAÑOL			
Costo del Proyecto	USD	60.000.000	GS.	336.000.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
135.271.927.154	200.728.072.846		40,26%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
28/08/2018	28/08/2024		N/A	
Ubicación geográfica del Proyecto				
Alcance Nacional				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0%			19,27%	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021		Porcentaje Ejecutado	
104.090.164.780	91.356.598.267		87,77%	
AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO				
Ejecución Física			Ejecución Presupuestaria	
<p>Bar chart showing physical execution. The y-axis is labeled '% Ejecución' with values 0 and 20. The x-axis is labeled '555'. There are two bars: an orange bar for 'Avance Total Acumulado' with value 19,273 and a yellow bar for 'Avance del Periodo' with value 7,846.</p>			<p>Pie chart showing budgetary execution. The chart is divided into two segments: a large orange segment for 'Ejecutado' (88%) and a smaller yellow segment for 'Saldo Presupuestario' (12%).</p>	
SITUACIÓN ACTUAL				
La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.				



**TETÁ VIRU
MOHENDAPY**
Motenondcha
Ministerio de
HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP *py* Sistema Nacional
de Inversión
Pública


Proyecto	MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUBLICA			
OEE	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL			
Código SNIP N°	773			
Financiamiento	COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, FONACIDE, FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY 4758/12, PBL CAF			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	2.350.000.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
955.674.724.848	1.394.325.275.152		40,67%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
12/05/2017	31/12/2023		N/A	

Ubicación geográfica del Proyecto

Alcance Nacional

Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total	
15,06%	21%	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021	Porcentaje Ejecutado
511.073.083.074	455.442.992.780	89,12%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

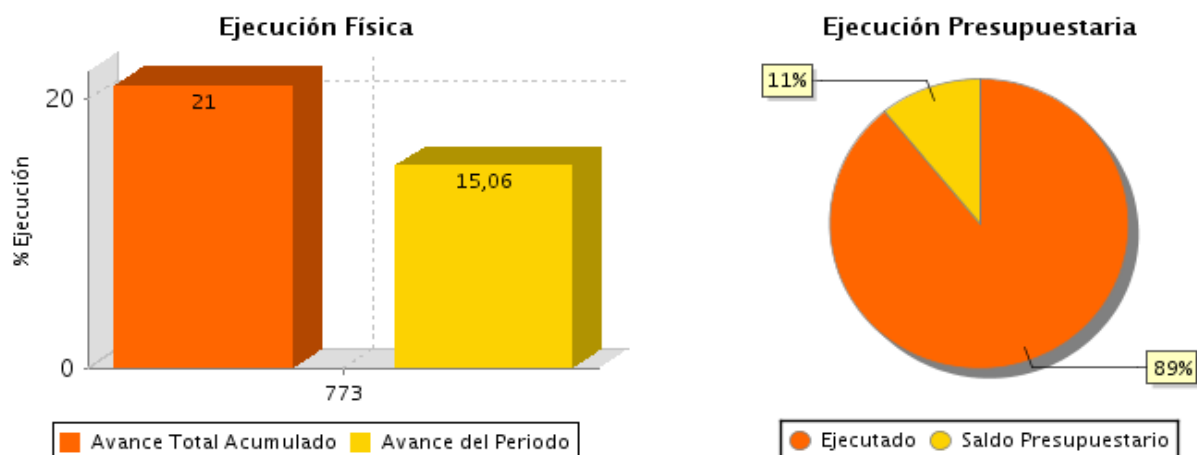

SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.



TETÃ VIRU
MOHENDAPY
Motenondcha
Ministerio de
HACIENDA

TETÃ REKUÃI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP Sistema Nacional
de Inversi3n
P3blica


Proyecto	CONSTRUCCI3N FORTALECIMIENTO DE ATENCI3N PRIMARIA EN SALUD			
OEE	MINISTERIO DE SALUD P3BLICA Y BIENESTAR SOCIAL			
C3digo SNIP N3	805			
Financiamiento	BIRF			
Costo del Proyecto	USD	115.000.000	GS.	709.550.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecuci3n	
3.483.350.584	706.066.649.416		0,49%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Pr3rroga	
26/03/2020	26/03/2026		N/A	

Ubicaci3n geogr3fica del Proyecto

Departamentos de Amambay, Central, Cordillera, Paraguar3

Avance F3sico Reportado del Periodo	Avance F3sico Acumulado Total	
5,41%	8,48%	
PGN Vigente en Gs.	Ejecuci3n en Gs. al 31/12/2021	Porcentaje Ejecutado
546.935.636.977	1.535.293.334	0,28%

AVANCE F3SICO Y PRESUPUESTARIO

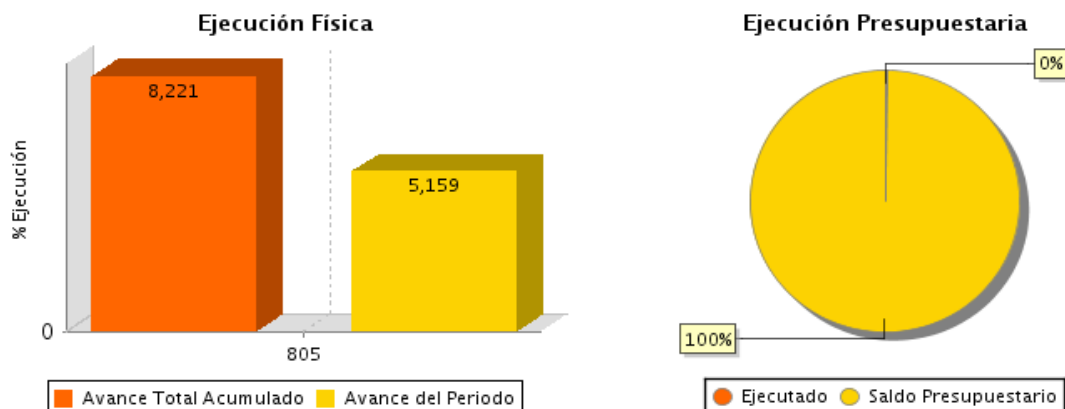

SITUACI3N ACTUAL

Durante el tercer cuatrimestre se pudieron realizar acciones con relaci3n a la obtenci3n de la No Objec3n al PBC por parte del Organismo Financiador, Resoluci3n de autorizaci3n del llamado y constituci3n del comit3 de evaluaci3n para la contrucci3n de 31 Unidades de Salud Familiar.

Se iniciaron campa3as de sensibilizaci3n al personal de salud y consejos locales de salud de los Dptos. Misiones y Pdte. Hayes referente a compra estrat3gica basada en resultados, firm3ndose 9 convenios de participaci3n y de gesti3n (Dpto. Misiones). Asi tambien se realizaron gestiones para contrataci3n de una firma consultora como apoyo t3cnico para la implementaci3n esta actividad.

Se llevaron a cabo la contrataci3n de 13 consultores para la conformaci3n de la Unidad Ejecutora del Proyecto, adquisici3n de mobiliario para la UEP, equipamiento TIC, entre otros.



TETÁ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública


Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL MSPBS			
OEE	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL			
Código SNIP N°	887			
Financiamiento	REPÚBLICA DE CHINA			
Costo del Proyecto	USD	14.992.733	GS.	89.956.399.724
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución		
51.289.595.647	38.666.804.077	57,02%		
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga		
11/08/2020	11/08/2022	N/A		

Ubicación del Proyecto

Alcance Nacional

Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total	
63,68%	98%	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021	Porcentaje Ejecutado
274.881.672.448	47.682.153.580	17,35%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

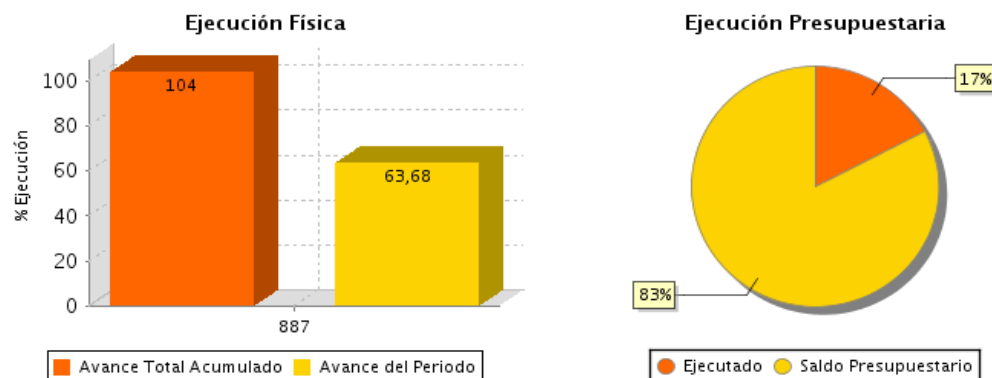

SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informó que en el presente cuatrimestre la obra en el Hospital General Pediátrico (HGP) "Niños de Acosta Nú" tuvo un 26,9% de avance, se realizaron trabajos de revoque exterior de mamposterías, revoque de losas, aislación de losas, colocación de marcos de chapa doblada de aberturas, colocación de estructura metálica para el techo, chapas trapezoidales, cañerías de gases en planta baja. Además, se presentó un convenio modificatorio por varios rubros, motivo por el cual, los trabajos se encuentran paralizados hasta la firma de dicho convenio.

En lo referente a equipamientos, el llamado a licitación del Hospital de Itauguá se encontraba a la espera de la Resolución de Adjudicación, mientras que el Llamado del Hospital del Trauma se encontraba aguardando la entrega del equipamiento por parte de las empresas adjudicadas. Por último, el Llamado para compra de equipamientos del HGP Niños de Acosta Nú, estaba a la espera del dictamen de Evaluación de ofertas, resaltando que no se pudo adjudicar la totalidad del listado ya que muchos ítems quedaron desiertos por no cumplir las especificaciones técnicas.

En cuanto al "Desarrollo del sistema informático de salud" se realizó el Llamado "ADQUISICIÓN DE 145 FIREWALLS DE BORDE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPBS", cuyo contrato fue firmado. Se recibieron 58 equipos, que representan el 40% del total de Firewall adquiridos.
