



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO

## MINISTERIO DE HACIENDA


Enero – Abril 2022





<b>Proyecto</b>	<b>SP PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II</b>			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE HACIENDA			
<b>Código SNIP N°</b>	45			
<b>Financiamiento</b>	BID , LOCAL			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	16.000.000	<b>GS.</b>	108.071.872.456
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
56.738.314.049	51.333.558.407		52,50 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
31/12/2010	30/07/2015		31/12/2022	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional				
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
6 %			95 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
3.069.953.719	321.880.906		10,48 %	

**AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO**

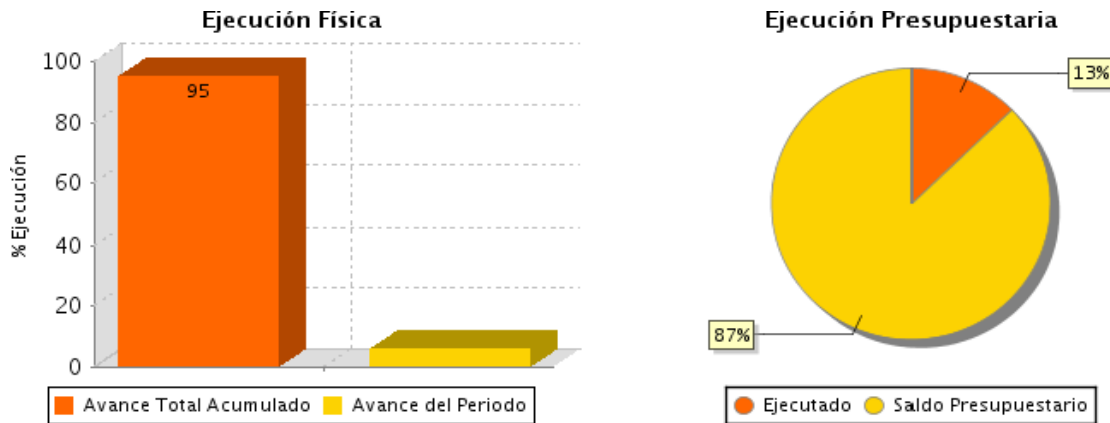


**SITUACIÓN ACTUAL**

En el primer cuatrimestre se ejecutaron dos consultorías y se adquirieron equipos informáticos para la Dirección General de Informática y Comunicaciones, destinados para Fabrica de SOFTWARE para el SIARE. Éstas actividades cuentan con un avance acorde a la planificado en el Plan de Ejecución Plurianual (PEP). Cabe mencionar que el proyecto presenta un avance físico del 95% y se encuentra operando solo un componente de Modernización y expansión del SIAF. Los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo ya fueron utilizados en su totalidad, por loque se encuentra operando con recursos de contrapartida local con el fin de llevar a cabo las últimas actividades y cerrar el proyecto.



<b>Proyecto</b>		<b>CAPACITACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE BECAS AL EXTERIOR</b>	
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE HACIENDA		
<b>Código SNIP N°</b>	445		
<b>Financiamiento</b>	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST., BID		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	73.000.000	<b>GS.</b> 361.688.100.030
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
352.488.381.639	9.199.718.391		97,40 %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
28/04/2015	22/11/2021		30/06/2024
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
0 %		92 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>
11.609.356.599	4.168.579.219		36,00 %

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

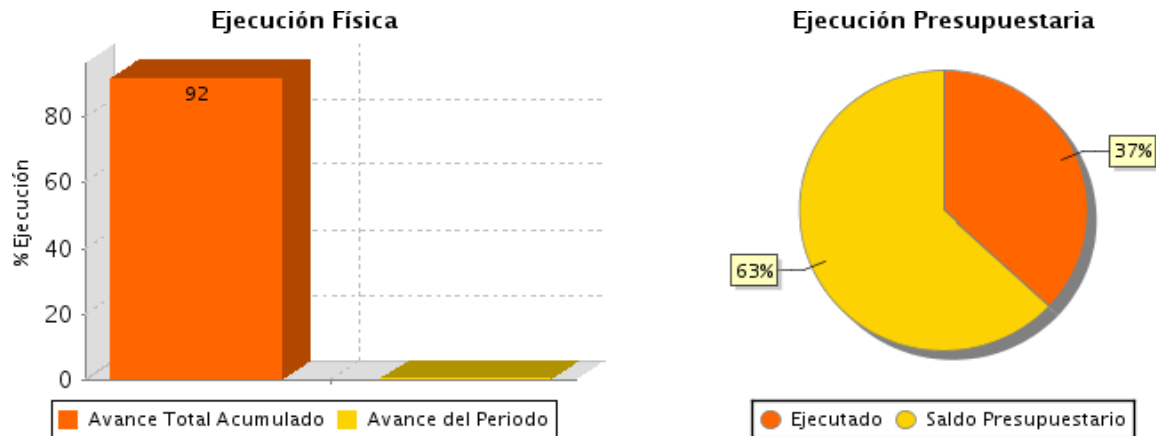


### SITUACIÓN ACTUAL

En este primer cuatrimestre se pagaron los beneficios pendientes a los becarios, contratados, proveedores, como así también se encontraba en proceso el pago a la auditoria externa PWC. Cabe mencionar que todos los pagos corresponden a llamados de convocatorias anteriores y a la fecha no se encuentra en proceso ningún nuevo llamado. Estas actividades se encuentran con un avance acorde a lo planificado en el Plan de Ejecución Plurianual (PEP). Resulta relevante mencionar que el proyecto obtuvo una prórroga hasta el año 2024 por parte del Fondo Fiduciario para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) con el fin de garantizar el seguimiento del último becario con beca en implementación, por lo que el proyecto se encuentra abocado a dicha actividad.



<b>Proyecto</b>	CAPACITACIÓN CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDADES CATASTRALES MUNICIPALES		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE HACIENDA		
<b>Código SNIP N°</b>	780		
<b>Financiamiento</b>	SNC - LEY N° 5513/2015		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	0	<b>GS.</b> 25.010.623.625
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
7.445.382.445	17.565.241.180		29,77 %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
20/07/2018	20/07/2023		N/A
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
7 %		51 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>
3.066.700.000	875.749.956		28,56 %

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

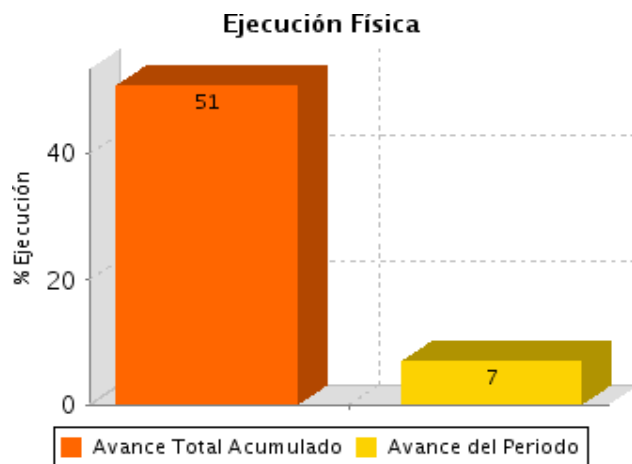


### SITUACIÓN ACTUAL

Al momento del cierre del informe, la Unidad Ejecutora no ha procedido a las correcciones emitidas por esta Dirección.



<b>Proyecto</b>	<b>CAPACITACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE BECAS EN EL EXTERIOR II</b>		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE HACIENDA		
<b>Código SNIP N°</b>	782		
<b>Financiamiento</b>	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	60.000.000	<b>GS.</b> 307.400.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
104.273.039.032	203.126.960.968		33,92 %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
23/11/2017	23/11/2023		N/A
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
11 %		58 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
80.198.991.909	18.548.700.443	23,13 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

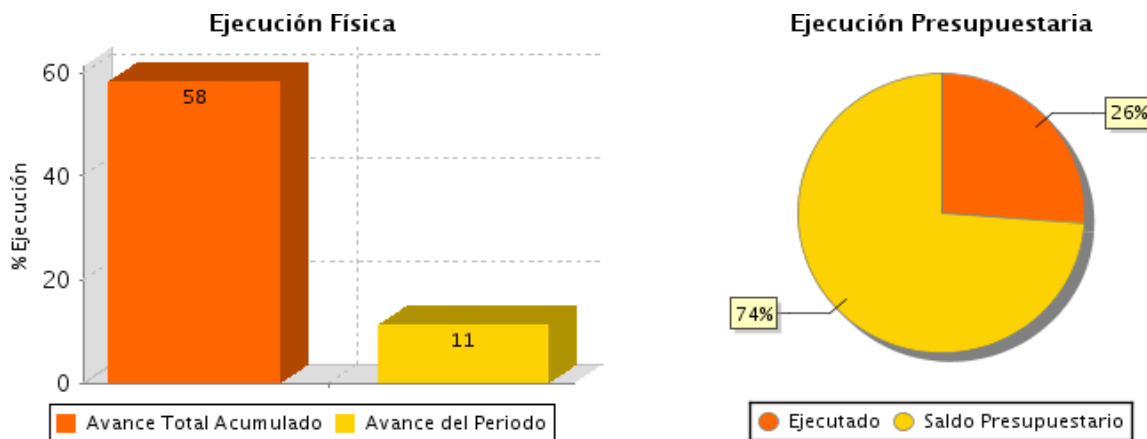

### SITUACIÓN ACTUAL


En este primer cuatrimestre se continuaron con los pagos a becarios de los distintos llamados de convocatorias anteriores de los distintos componentes, como así también al personal contratado de la gestión de becas que cumplen las distintas tareas en el proyecto, pagos a consultores, y proveedores encargados de sistemas del BECAL.

Por otro lado, se encuentra en proceso nuevos llamados de las distintas convocatorias que cerrarán el 08/05/2022. Todas éstas actividades se encuentran con un avance acorde a lo planificado en el Plan de Ejecución Plurianual (PEP).



<b>Proyecto</b>	<b>CAPACITACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE BECAS EN EL EXTERIOR II</b>			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE HACIENDA			
<b>Código SNIP N°</b>	782			
<b>Financiamiento</b>	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	60.000.000	<b>GS.</b>	336.000.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>	<b>Porcentaje de Ejecución</b>		
104.273.039.032	231.726.960.968	31,03 %		
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>	<b>Fecha de Prórroga</b>		
23/11/2017	23/11/2023	N/A		
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional				
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>	<b>Avance Físico Acumulado Total</b>			
11 %	58 %			
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>		
80.198.991.909	18.548.700.443	23,13 %		

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

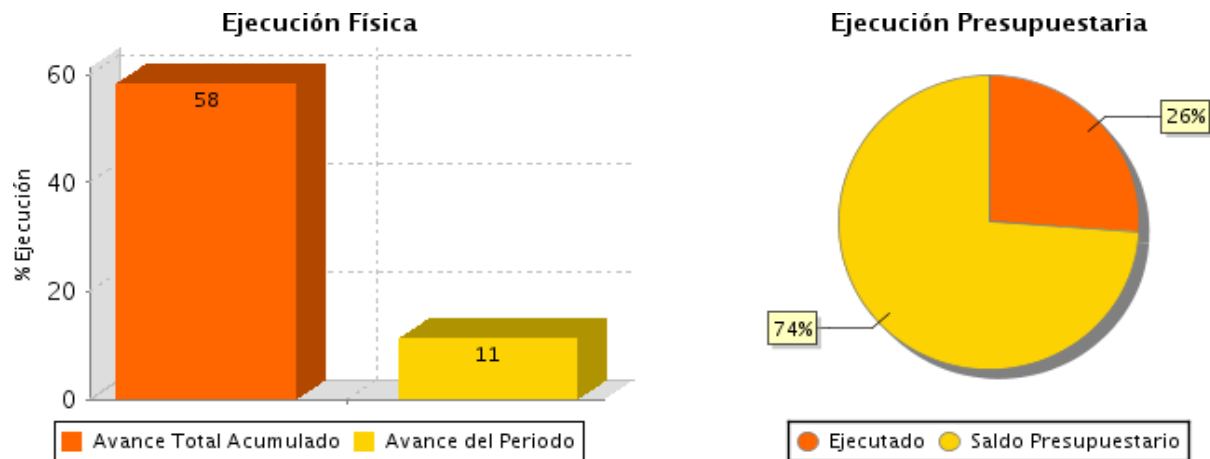

### SITUACIÓN ACTUAL


En este primer cuatrimestre, se continuaron con los pagos a becarios de los distintos llamados de convocatorias anteriores de los distintos componentes, como así también pagos al personal contratado de gestión de becas que cumplen las distintas tareas en el proyecto, pagos a consultores, y proveedores encargados de sistemas del BECAL.

Por otro lado, se encuentra en proceso nuevos llamados de las distintas convocatorias que cerrarán el 08/05/2022.



<b>Proyecto</b>	<b>MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA SSEAF</b>			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE HACIENDA			
<b>Código SNIP N°</b>	799			
<b>Financiamiento</b>	COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	0	<b>GS.</b>	35.000.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
9.953.410.443	25.046.589.557		28,44 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
24/11/2016	24/11/2019		24/11/2023	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional				
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
4 %			36 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
10.000.000.000	807.484.717		8,07 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

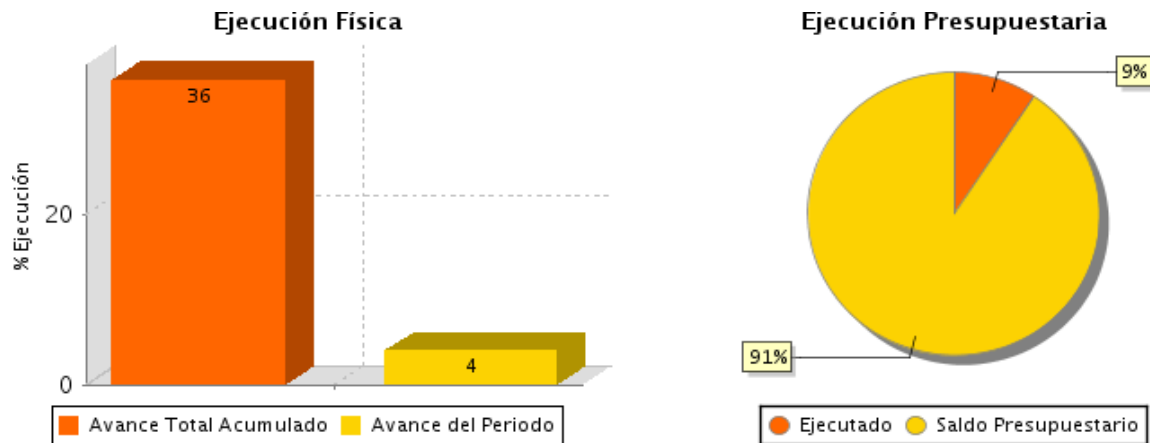


### SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo reportado el proyecto ha iniciado procesos licitatorios de Consultoría del Gasto Público y Presupuesto por Resultado, así también la Adquisición de Equipos de Informática y Comunicaciones. Los requerimientos de financiación solicitados por las Dependencias de la SSEAF, se ha realizado conforme a la disponibilidad presupuestaria y financiera por lo cual se ha dado respuesta satisfactoria a los requerimientos recibidos. Éstas actividades cuentan con un avance acorde a lo planificado en el Plan de Ejecución Plurianual (PEP). Resulta relevante mencionar la naturaleza de esta operación concebida como Ayuda Presupuestaria y que el mismo se encuentra en etapa de cierre.



<b>Proyecto</b>	<b>MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA SSEAF (FASE III)</b>			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE HACIENDA			
<b>Código SNIP N°</b>	954			
<b>Financiamiento</b>	COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	0	<b>GS.</b>	26.000.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
48.080.000	25.951.920.000		0,18 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
01/01/2022	31/12/2024		N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional				
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
0 %			0 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
9.000.000.000	48.080.000		0,53 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

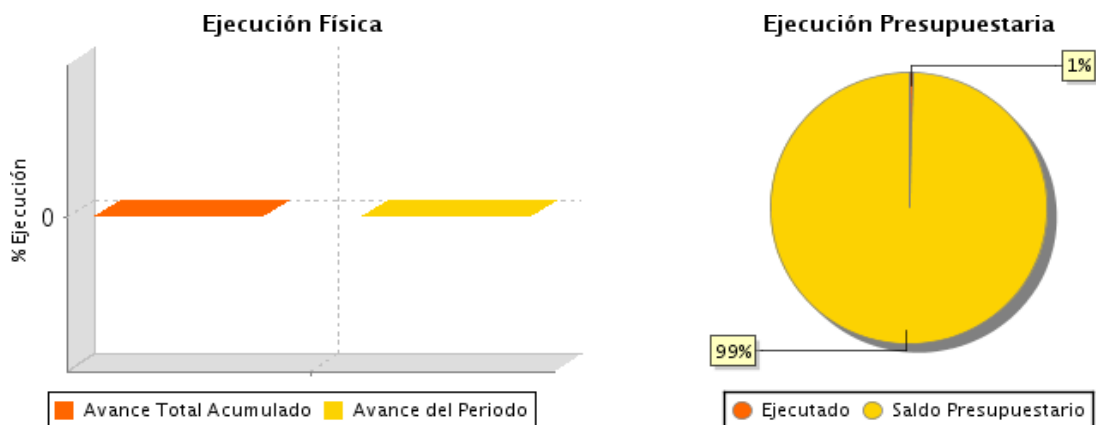

### SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informó que todas las actividades del proyecto iniciarán sus respectivas ejecuciones en el tercer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal. Es importante señalar que el proyecto es nuevo y es una continuidad del Proyecto SNIP 799 cuyo cierre se dará este año, y todas las actividades pasarán a ser financiadas por este proyecto. Resulta relevante mencionar la naturaleza de esta operación concebida como Ayuda Presupuestaria.
