



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mayo - Agosto 2022


 *Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública*





<b>Proyecto</b>		Promoción de Inversión Extranjera en Paraguay			
<b>OEE</b>		MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
<b>Código SNIP N°</b>		217			
<b>Financiamiento</b>		BID			
<b>Costo del Proyecto</b>		<b>USD</b>	10.000.000	<b>GS.</b>	52.421.584.332
<b>Avance Financiero en Gs.</b>		<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
46.445.888.611		5.975.695.721		88,60 %	
<b>Fecha de Inicio</b>		<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
01/11/2014		30/11/2019		30/11/2022	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>					
Nacional		N/A			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>		
0 %			95 %		
<b>PGN Vigente en Gs.</b>		<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
7.735.463.000		3.031.114.535		39,18 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

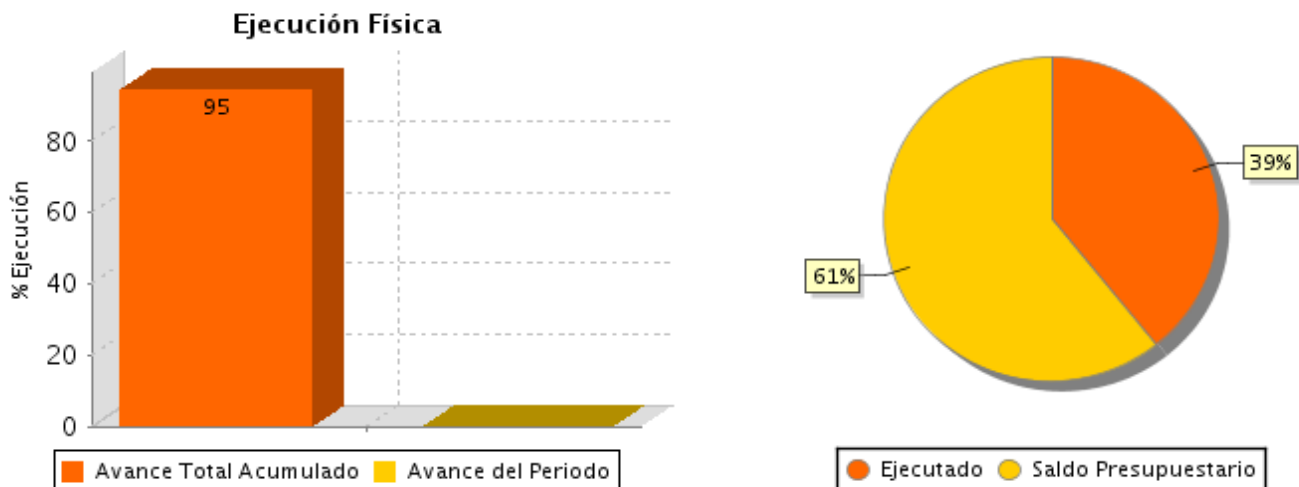


### SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración del presente informe, la UEP no ha respondido a las observaciones emitidas por esta dependencia sobre los avances del Proyecto.



<b>Proyecto</b>	Capacitación DE LA PRODUCT. DE LAS MIPYMES A NIVEL NACIONAL		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		
<b>Código SNIP N°</b>	324		
<b>Financiamiento</b>	BID		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	2.000.000	<b>GS.</b> 13.199.822.483
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
5.933.304.418	7.266.518.065		44,95 %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
18/02/2016	18/02/2021		18/02/2024
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
4 %		89 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
5.393.540.449	639.567.808	11,86 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

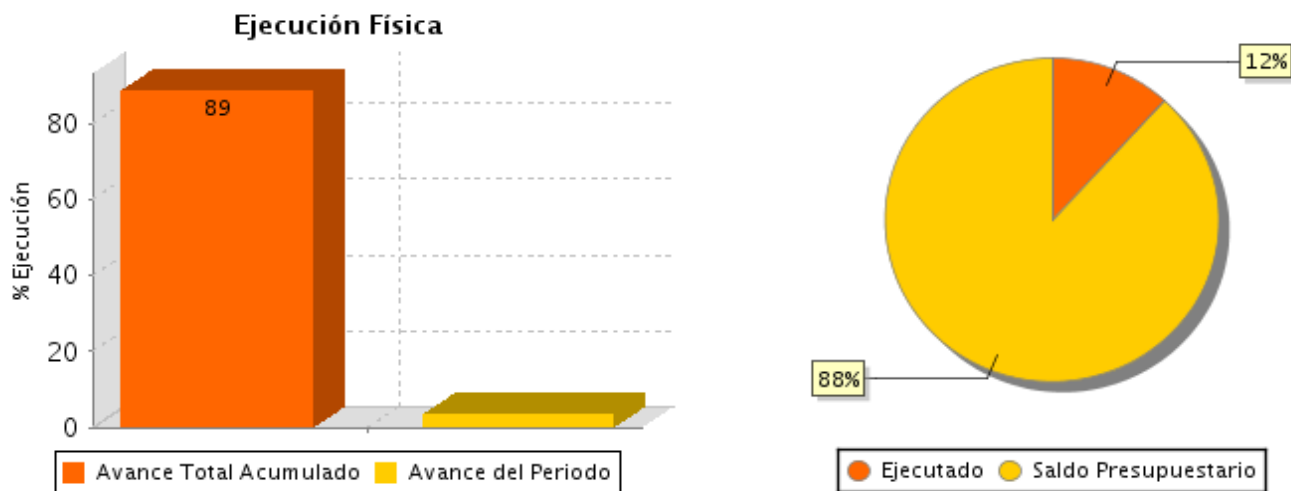

### SITUACIÓN ACTUAL

La entidad reportó que se brindó Asistencia Técnica a 11 mipymes en cuanto a capacitación en gestión y administración financiera y apoyo para la preparación y presentación de sus respectivos planes de negocios para acceder al crédito de entidades financieras que ofrecen productos de préstamos dirigidos a empresas de mipymes.


Se verificó un avance significativo (en etapa de firma de contrato) para la contratación de una firma consultora para la prestación de servicios de asistencia técnica financiera a 200 mipymes en repago de créditos, quienes recibieron créditos bajo la modalidad de FOGAPY en el marco del plan de mitigación de los efectos negativos de la pandemia por covid 19. (2020). Se estima beneficiar al primer grupo de 70 mipymes para el tercer cuatrimestre.

Se encuentra en etapa de apertura de propuesta económica de firmas concursantes para contratación de una consultora para la prestación de servicio de asistencia técnica bajo la modalidad 2, para Mipymes proveedoras de cadena de valor de empresa Ancla.



Proyecto	Mejoramiento y desarrollo empresarial a Empresas Exp. en Py		
OEE	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		
Código SNIP N°	707		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	10.000.000	GS. 68.919.969.211
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
16.240.896.163	52.679.073.048	23,56 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
03/07/2018	03/07/2023	03/07/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
9 %		56 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022	Porcentaje Ejecutado	
10.964.841.390	4.575.123.993	41,73 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

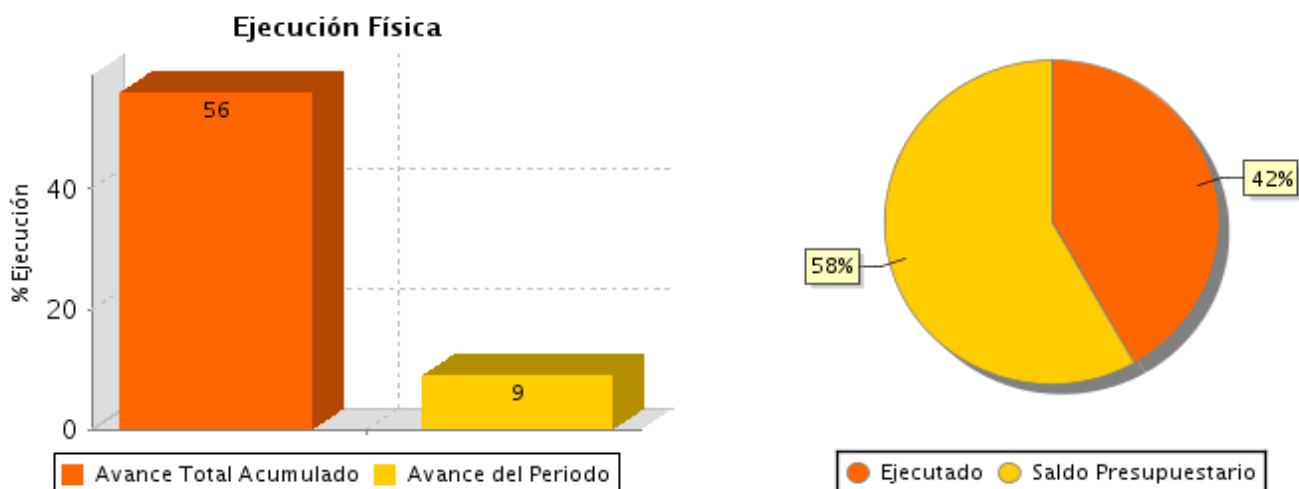

### SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración del presente informe, la UEP no ha respondido a las observaciones emitidas por esta dependencia sobre los avances del Proyecto.
